

Guerrero - Puebla

Eje Cuautla – Tlapa

Ramal Igualapa – Chilixtlahuaca - Alacatlitzala

ACTUALIZADA 29/05/26



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance global

- Programado: 14.83%
- Real: 12.55%
- Semanal: 0.62%
- Financiero: 6.91%

Avance 2025

- Programado: 100.0%
- Real: 100.0%
- Semanal: 0.00%
- Financiero: 100.0%

Avance 2026

- Programado: 20.96%
- Real: 14.99%
- Semanal: 2.19%
- Financiero: 10.43%



Inversión total 2025-2029: 15,329 mdp

- Morelos: 303 mdp
- Puebla: 9,839 mdp
- Guerrero: 5,187 mdp

Meta total 2025-2029: 312 km

- Morelos: 6 km
- Puebla: 178 km
- Guerrero: 129 km



Inversión 2025: 641.2 mdp

- Guerrero: 515.5 mdp
- Puebla: 125.7 mdp

Meta 2025: 33 km

- Guerrero: 30 km
- Puebla: 3 km



Inversión 2026: 3,598 mdp

- Morelos: 302.8 mdp
- Puebla: 2,231.9 mdp
- Guerrero: 1,063 mdp (PEF) (871 mdp modernización y 192 mdp conservación)

Meta 2026: 84 km

- Morelos: 6 km
- Puebla: 46 km
- Guerrero: 33 km

Inicio meta 2026: 17 de febrero 2026



Inversión 2027: 3,300 mdp

- Puebla: 2,200 mdp
- Guerrero: 1,100 mdp

Meta 2027: 64 km

- Puebla: 42 km
- Guerrero: 22 km



Inversión 2028: 3,300 mdp

- Puebla: 2,200 mdp
- Guerrero: 1,100 mdp

Meta 2028: 64 km

- Puebla: 42 km
- Guerrero: 22 km

Inversión 2029: 3,427 mdp


- Puebla: 2,369 mdp
- Guerrero: 1,058 mdp

Meta 2029: 67 km

- Puebla: 45 km
- Guerrero: 22 km

Inversión 2030: 1,063 mdp

- Puebla: 713 mdp
- Guerrero: 350 mdp

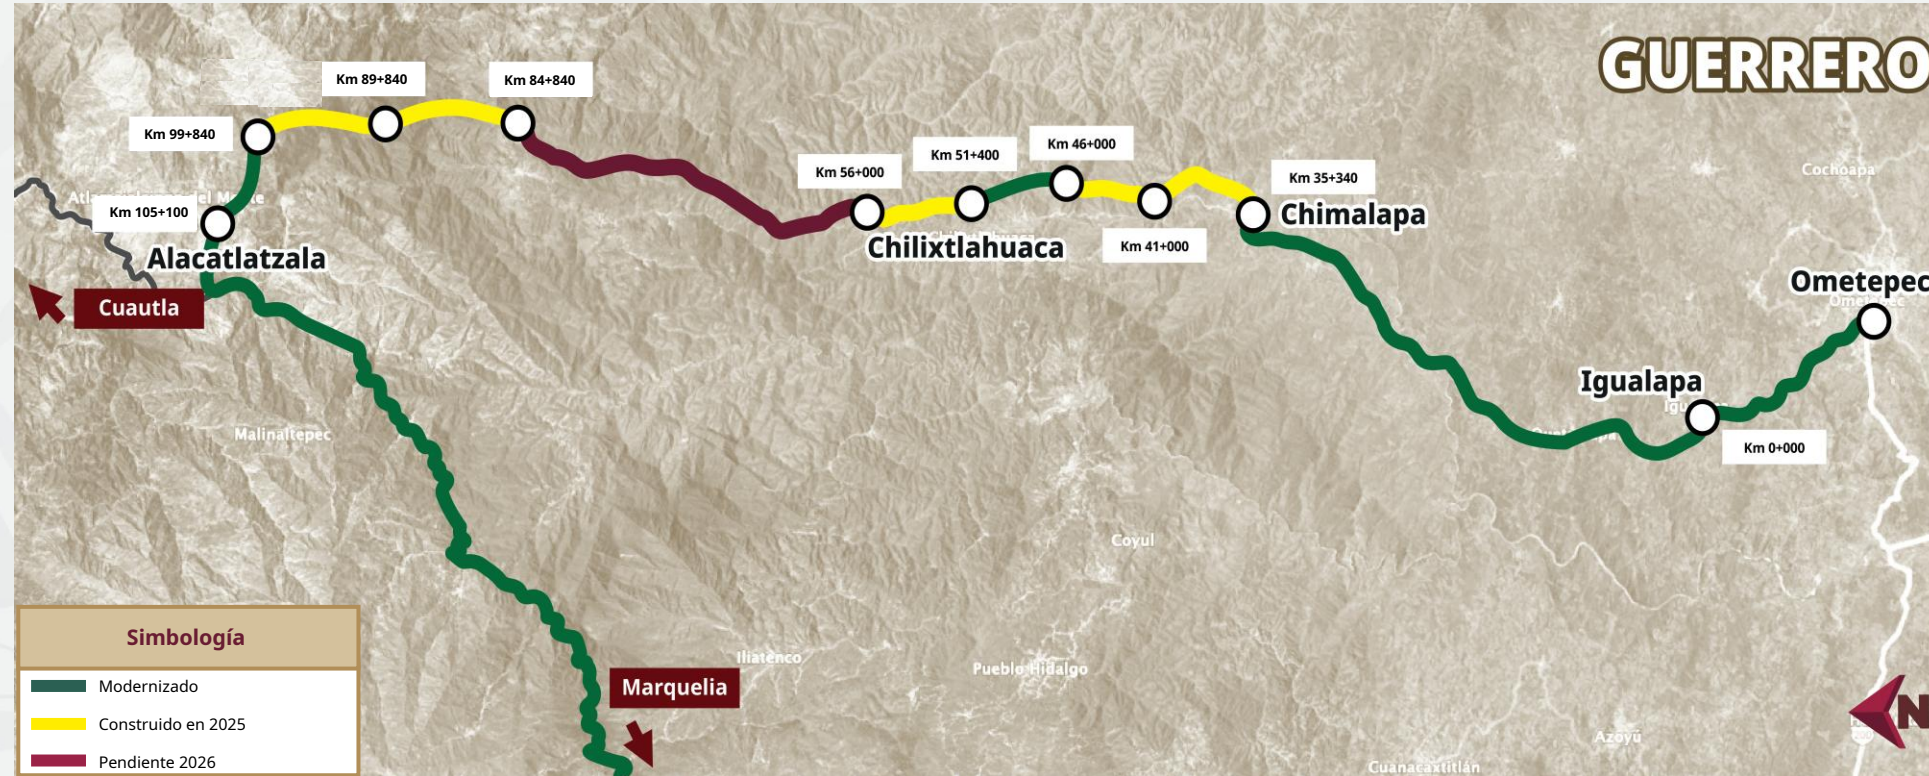

Inicio: 16 de mayo 2025
Término: diciembre 2029

Termino meta 2025: marzo de 2026



40,956 empleos generados



7,750 habitantes beneficiados



1 hora de ahorro en tiempo



Se beneficiará a una población de 7,750 habitantes de los municipios de Igualapa, Cochoapa el Grande, Metlatonoc y Malinaltepec, reduciendo tiempos de traslado.

Guerrero 2026

Eje Cuautla – Tlapa

Ramal Igualapa – Chilixtlahuaca - Alacatlatzala




Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance: Programado, Físico y Financiero

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	22-05-26 al 28-05-26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Del km 56+000 – al km 61+000	5.0	4.68%	95.32%	4.69%	0.65%	
Del km 61+000 – al km 66+000	5.0	14.90%	85.10%	3.78%	1.37%	
Del km 66+000 – al km 71+000	5.0	7.28%	92.72%	3.92%	0.85%	
Del km 71+000 – al km 76+000	5.0	16.10%	83.90%	3.46%	1.08%	
Del km 76+000 – al km 81+000	5.0	4.01%	95.99%	1.52%	2.39%	

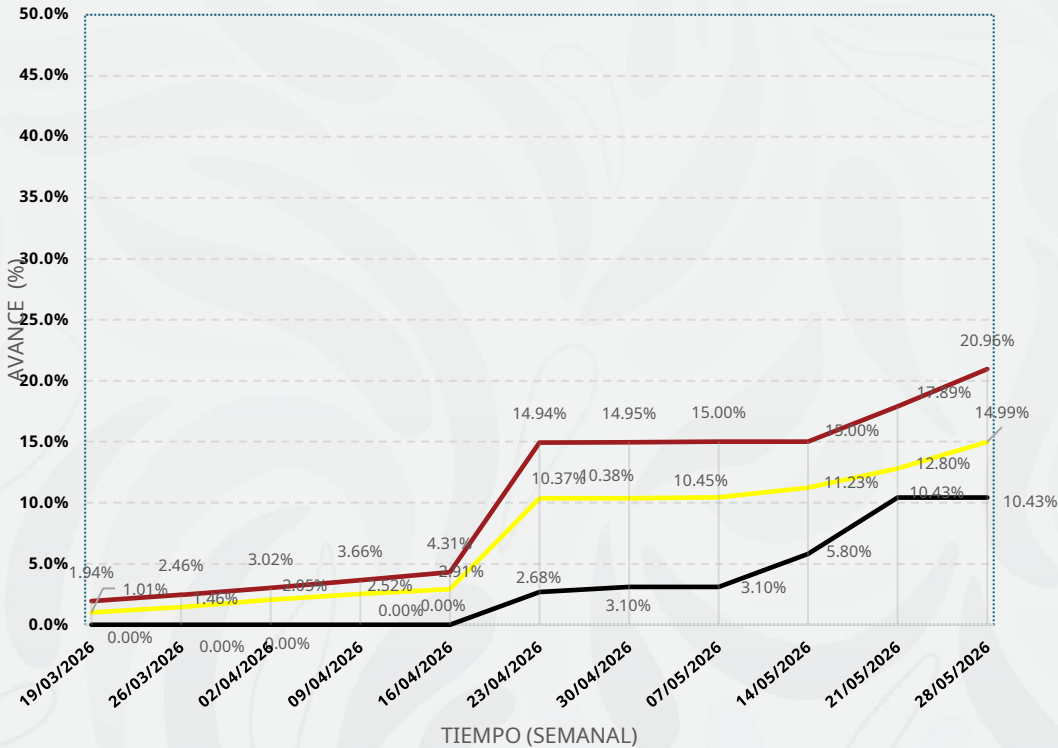

	15 de mayo al 21 de mayo 2026	22 de mayo al 28 de mayo 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	100	100
Maquinaria	43	43
Frentes de trabajo	10	10
