

Toluca- Zihuatanejo

Toluca- Zihuatanejo (Carretera Federal 134)

Tramo Estado de México

Avance global

- Programado: 3.79%
- Real: 3.97%
- Semanal: 0.20%
- Financiero: 3.95%

Avance 2025

- Programado: 99.29%
- Real: 99.21%
- Semanal: 0.61%
- Financiero: 99.21%

Avance 2026**

- Programado: --%
- Real: 7.00%
- Semanal: 0.20%
- Financiero: 5.80%

Inversión total: 28,664 mdp

- Edo. Méx.: 7,488 mdp *
- Guerrero: 21,176 mdp

Meta total: 385 km

- Edo. Méx.: 87 km
- Guerrero: 298 km

Inversión 2025: 945 mdp

- Edo. Méx.: 945 mdp

Meta 2025: 12 km, 1 paso a desnivel, 1 puente y 3 entronques (Edo. Méx.)

Inversión 2026: 2,857 mdp

- Edo. Méx.: 1,457 mdp *
- Guerrero: 1,400 mdp

Meta 2026: 46 km

- Edo. Méx.: 21 km
- Guerrero: 25 km

Inversión 2027: 7,700 mdp

- Edo. Méx.: 1,600 mdp
- Guerrero: 6,100 mdp

Meta 2027: 108 km

- Edo. Méx.: 18 km
- Guerrero: 90 km

Inversión 2028: 7,700 mdp

- Edo. Méx.: 1,600 mdp
- Guerrero: 6,100 mdp

Meta 2028: 108 km

- Edo. Méx.: 18 km
- Guerrero: 90 km

Inversión 2029: 7,724 mdp

- Edo. Méx.: 1,576 mdp
- Guerrero: 6,148 mdp

Meta 2029: 111 km

- Edo. Méx.: 18 km
- Guerrero: 93 km

Inversión 2030: 1,737 mdp

- Edo. Méx.: 309 mdp
- Guerrero: 1,428 mdp

Inicio: 09-Mayo-2025

Término meta-2025: 31-Mayo-2026

Término meta-2026: Diciembre 2026

Término total: Diciembre 2029

* Redondeado ** Los avances corresponden al subtramo comprendido del km 25+000 al km 38+000 (13 km)

Considerando reprogramación con fecha de conclusión al 31-May-2026 el subtramo del km 13+000 al km 25+000

Nota:


- De la inversión 2026, a la presente fecha se tienen autorizados 800 mdp, para la ejecución de los trabajos del km 25+000 al km 38+000 (13 km)
- De la asignación 2026 autorizada se consideran 87.57 mdp para el pago del Séptimo y Octavo Convenio Modificatorio correspondientes del km 13+000 al km 25+000.

ACTUALIZADA 29/05/26



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

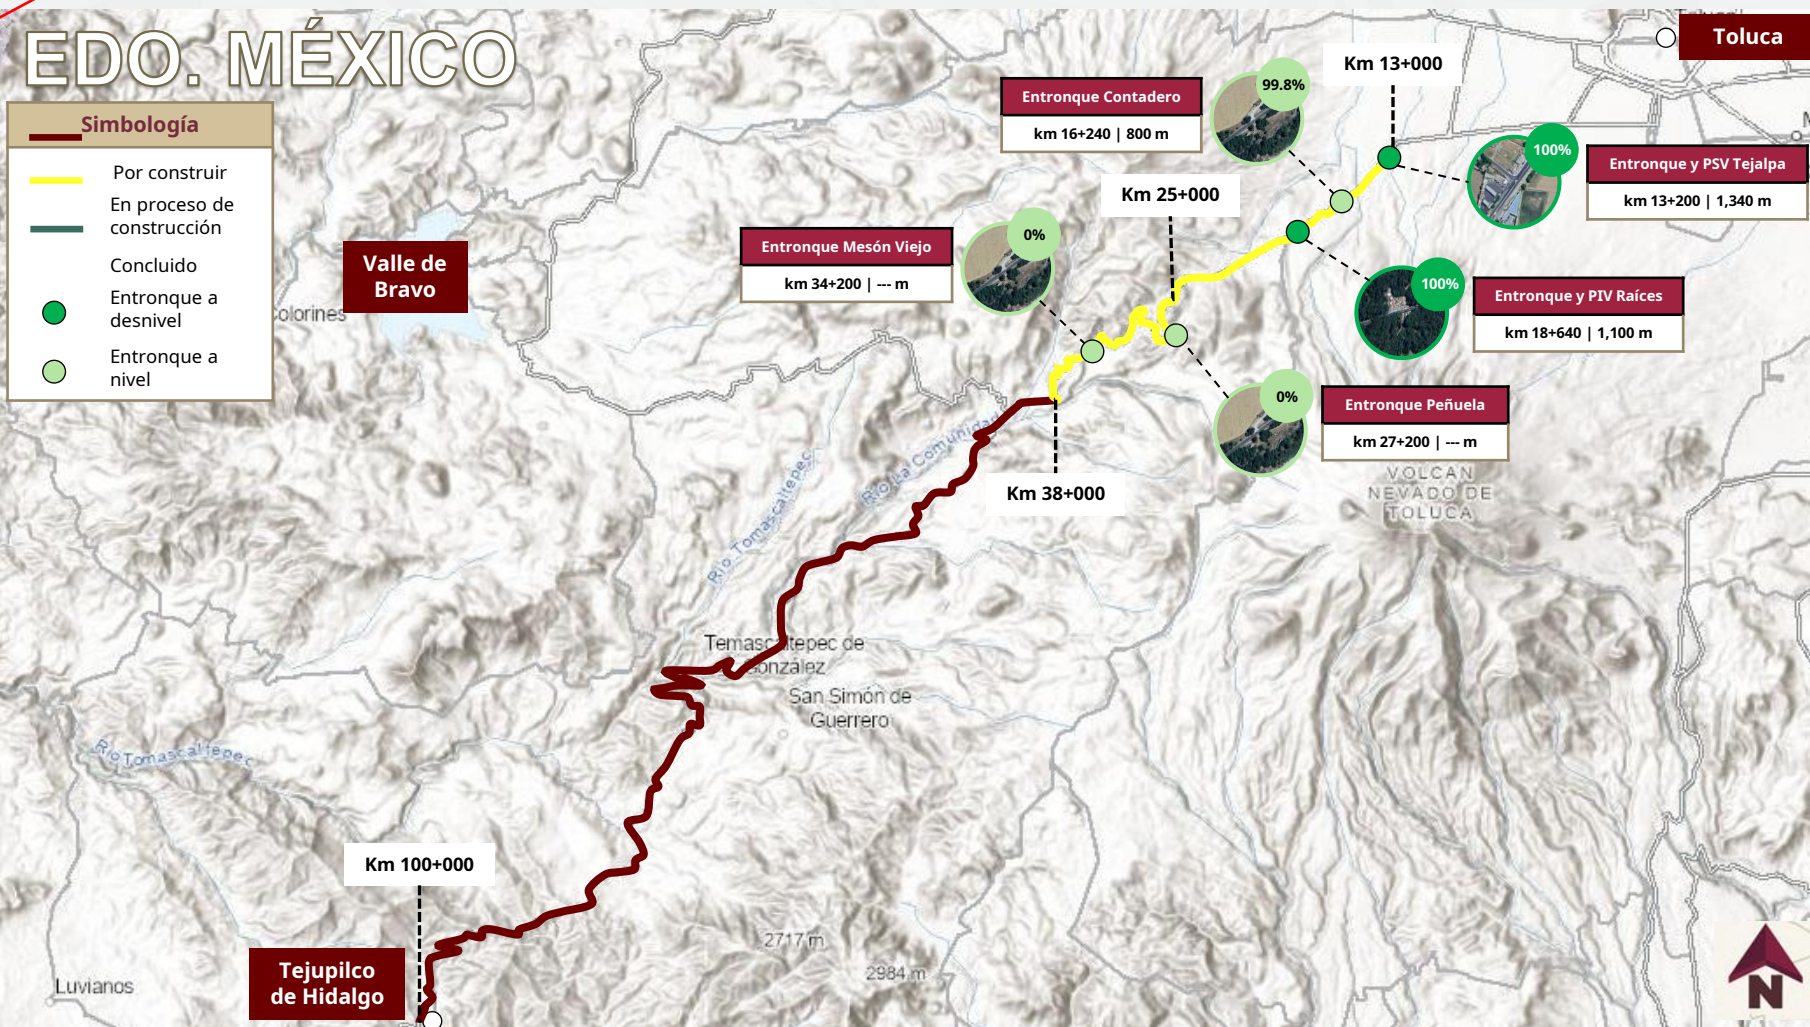

80,907 empleos generados



1 millón 480 mil habitantes beneficiados



2 horas 35 minutos de ahorro en tiempo

Beneficios Mejorar las condiciones de tránsito, reduciendo el riesgo de accidentes, así mismo se reducen los tiempos traslados, garantizando una mejor conectividad que contribuye al desarrollo económico y turístico del Centro - Poniente del país.

Inversiones 2025 - 2030

	2025	2026	PEF	FONADIN	VDG	2027	2028	2029	2030	Total
Toluca - Zihuatanejo	945.2	2,857.4	757.4	0	2,100	7,700	7,700	7,724	1,737	28,663.6
Estado de México	945.2	1,457.4	757.4	-	700	1,600	1,600	1,576	309	7,487.6
Guerrero	-	1,400	-	-	1,400	6,100	6,100	6,148	1,428	21,176

Metas 2025 - 2030

	2025	2026	PEF	FONADIN	VDG	2027	2028	2029	2030	Total
Toluca - Zihuatanejo	12	46	13	-	33	108	108	111	0	385
Estado de México	12	21	13	-	8	18	18	18	0	87
Guerrero	0	25	-	-	25	90	90	93	0	298

Toluca- Cd. Altamirano


Toluca- Zihuatanejo (Carretera Federal 134)

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

Km 13+000 – km 25+000

Elemento	Intervención	Unidad	Ejecutado acumulado	Faltante	22/may/26 al 28/may/26	
					Programado	Ejecutado
Carpeta asfáltica	17,063.24	m³	15,453.81	1,609.43	-	0
Señalamiento Horizontal	52.75	Km	44.97	7.78	-	0
Señalamiento Vertical	699	Pzs	688	11	-	0

Nota: Se consideran solo los trabajos faltantes por concluir

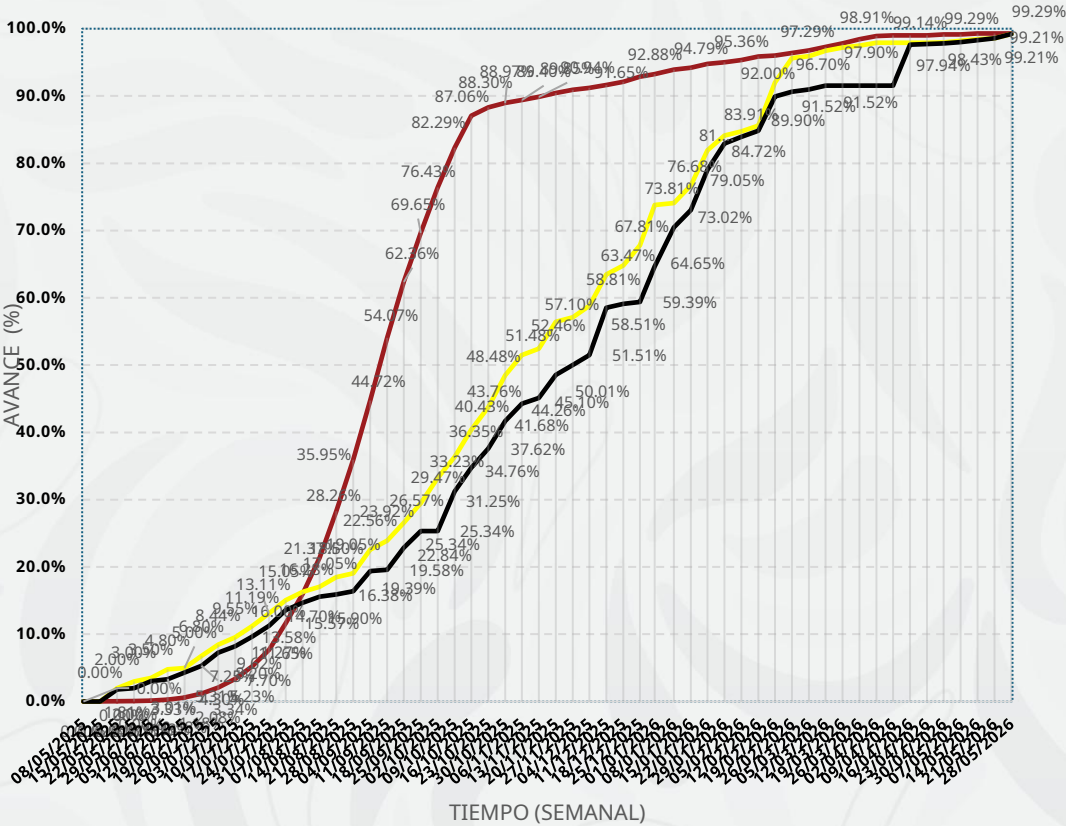

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	Del 15 al 21 de mayo de 2026	Del 22 al 28 de mayo de 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	36	27
Maquinaria	105	24
Frentes de Trabajo	6	6

Toluca- Cd. Altamirano


Toluca- Zihuatanejo (Carretera Federal 134)



Avance Programado - Físico - Financiero (%)

Km 25+000 – km 38+000

Elemento	Intervención	Unidad	Ejecutado acumulado	Faltante	22/may/26 al 28/may/26	
					Programado	Ejecutado
Desmonte	9.41	Ha	1.82	7.59	-	0.28
Despalme y cortes	591,785.92	m3	86,054.89	505,731.03	-	258.41
Corte material tipo "C"	2,120.10	m3	0	2,120.1	-	0
Alcantarillas tubulares	1,407.70	m	58	1,349.7	-	4
Alcantarillas tipo losa	120.60	m	24.48	96.12	-	1.24
Fresado de pavimento	25,274.35	m3	3,900	21,374.35	-	100
Cuerpo Ter. SY. SR.	117,858.50	m3	15,824.48	102,034.02	-	112.24
Base hidráulica	53,877.70	m3	2,536.93	51,340.77	-	115.32
Base asfáltica	31,845.30	m3	1,363.21	30,482.09	-	113.6
Carpeta asfáltica	18,901.60	m3	0	18,901.6	-	0
Horizontal	38,728.60	m	0	38,728.6	-	0
Vertical	1,880.00	Pzs	0	1,880	-	0
Excavación	13,490.90	m3	0	13,490.9	-	0
Habilitado y colocación de acero	153,159.70	kg	0	153,159.7	-	0
Concreto en zapatas y muros	2,832.70	m3	0	2,832.7	-	0
Relleno	10,043.50	m3	0	10,043.5	-	0

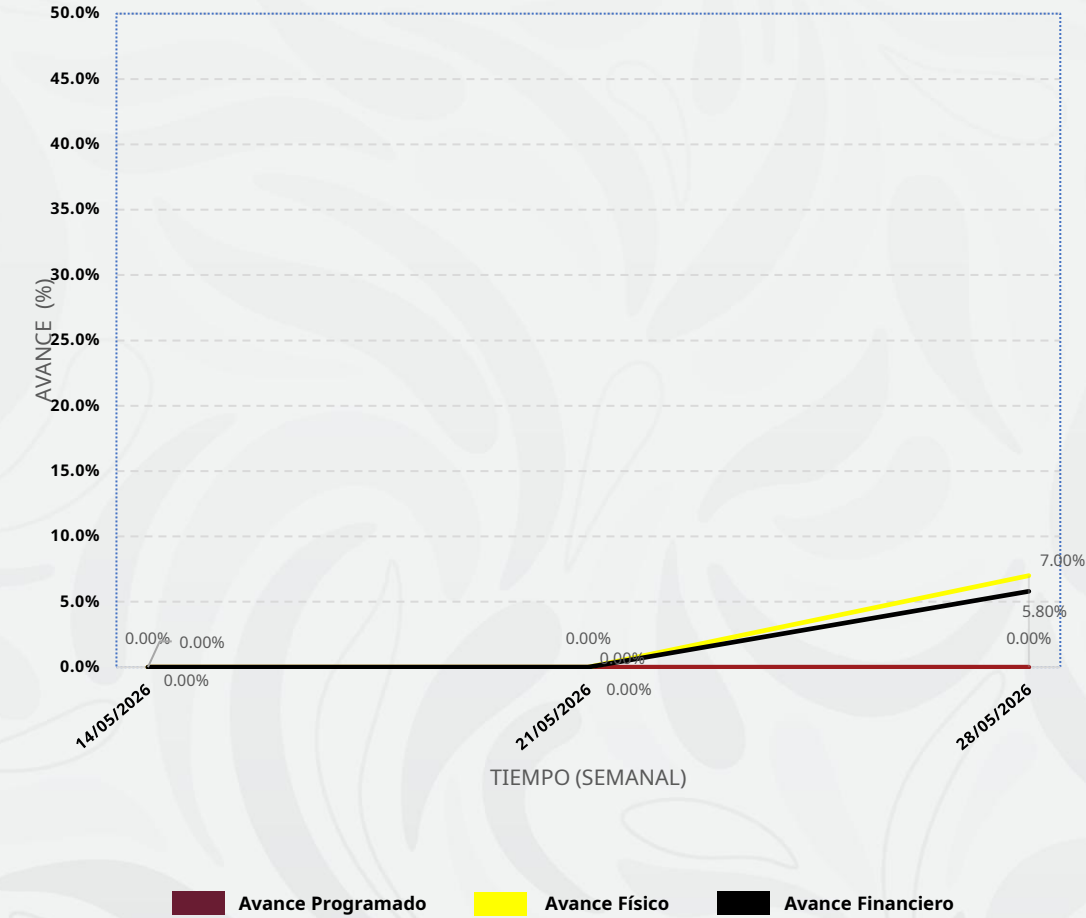

	Del 15 al 21 de mayo de 2026	Del 22 al 28 de mayo de 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	10	114
Maquinaria	36	51
Frentes de Trabajo	8	8
