



San Luis Potosí - Hidalgo

Tamazunchale – Huejutla – Pachuca

Avance global

- Programado: 23.94%
- Real: 23.38%
- Semanal: 0.25%
- Financiero: 21.63%

Avance 2026

- Programado: 15.03%
- Real: 12.98%
- Semanal: 0.90%
- Financiero: 11.64%



Inversión total 2025-2028: 9,024 mdp

- Hidalgo: 5,446.6 mdp
- SLP: 3,577.0 mdp

Meta total 2025-2028: 158 km

Hidalgo:

- 131 km

San Luis Potosí:

- 27 km



Inversión 2025: 1,650 mdp

- Hidalgo: 821.7 mdp
- San Luis Potosí: 827.9 mdp

Meta 2025: 27 km

- Hidalgo: 17 km

- San Luis Potosí: 10 km



Inversión 2026: 2,550.4 mdp

- Hidalgo: 1,651.8 mdp
- San Luis Potosí: 898.6 mdp

Meta 2026: 37 km

- Hidalgo: 30 km

- San Luis Potosí: 7 km



Inicio : 28 de abril 2025

Término: diciembre 2030

Término meta 2025: 28 de febrero de 2026



27,072 empleos generados

Inversión 2026: 2,596.1 MDP
Hidalgo 1,690.8 MDP
Autorizado PEF: 1,132.6 MDP
VDG: 558.2 MDP
San Luis Potosí 905.31 MDP
Autorizado PEF: 595.21 MDP
VDG: 310.1 MDP

TDPA: 17,318 Veh/hr




+395 mil habitantes beneficiados en los municipios de Huejutla de Reyes, Jaltocán, Lolotla, Metztitlán, Molango de Escamilla, San Felipe Orizatlán, Tlanchinol, Xochicoatlán y Zacualtipán de Ángeles en Hidalgo y Tamazunchale, en San Luis Potosí.



65 min de ahorro en tiempo

Beneficios: Conecta de manera eficiente y segura el centro del país con la Sierra Hidalguense y la Huasteca Potosina.

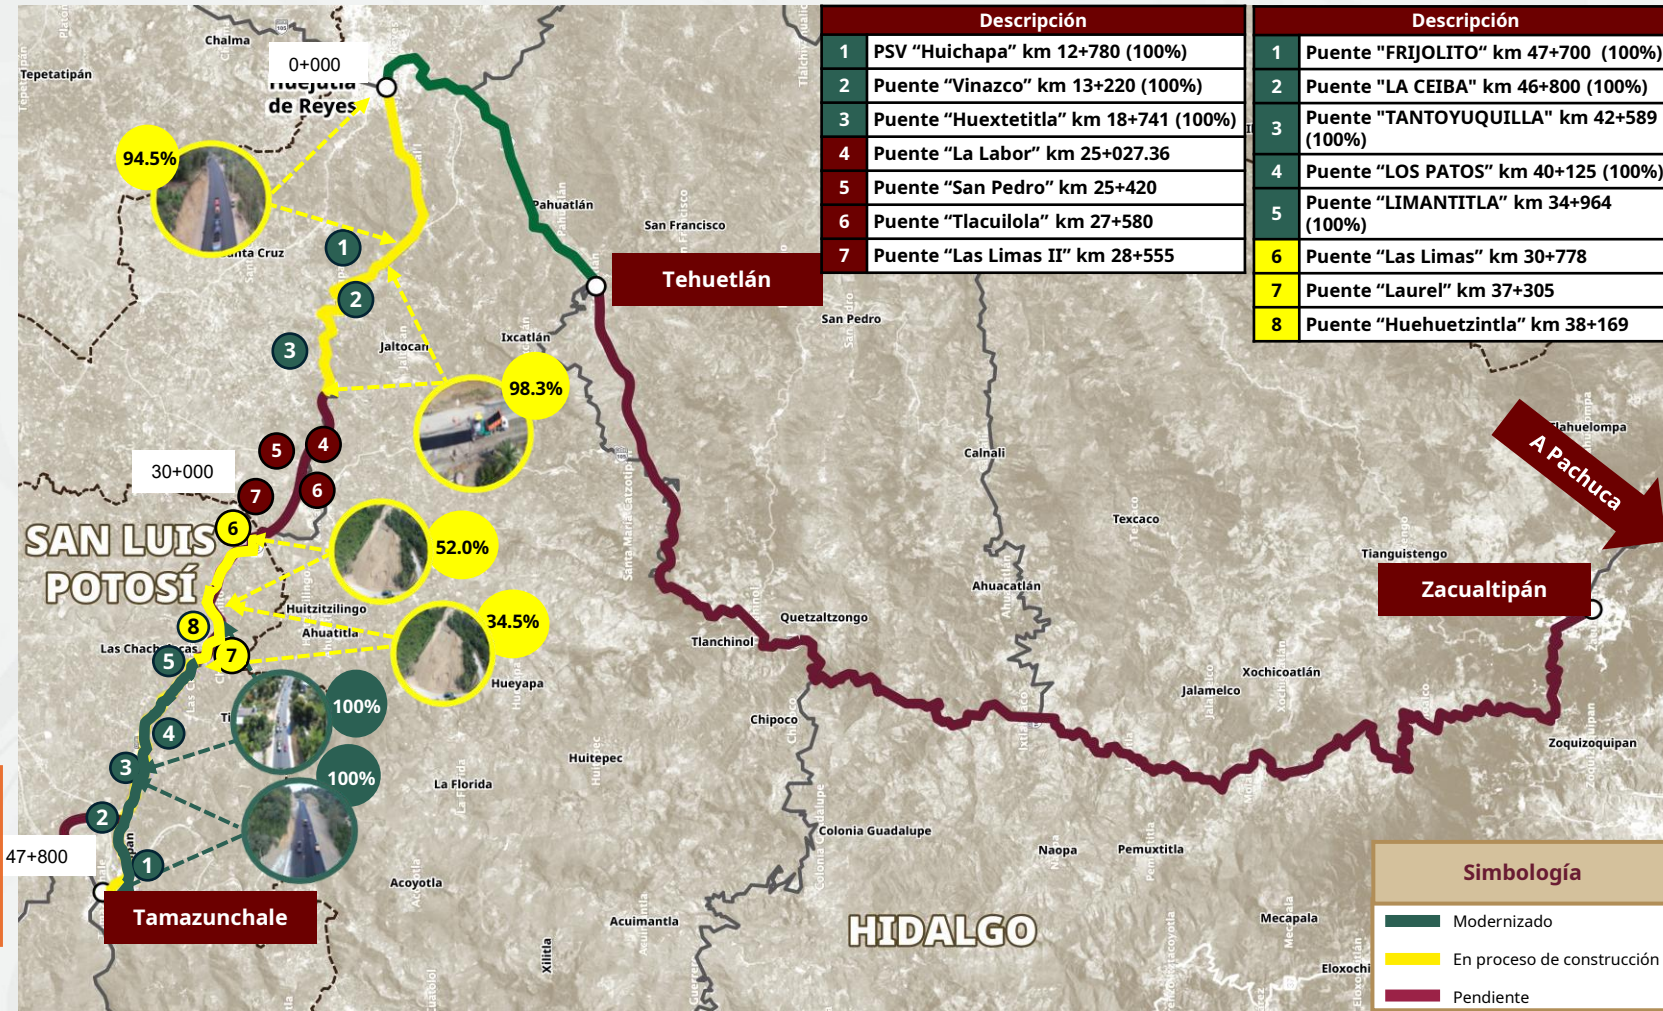



San Luis Potosí - Hidalgo


Tamazunchale - Huejutla

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 26/06/2026 al 02/07/2026		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
TERRACERÍAS								
Despalme	m³	24,896.0	15,864.0	63.72%	9,032.0	2,271.5	0.0	En proceso
Cortes	m³	376,161.0	150,022.0	39.88%	226,139.0	26,868.6	17,400.0	En proceso
Terraplenes 90%	m³	85,691.0	1,600.0	1.87%	84,091.0	5,712.7	0.0	En proceso
Pedraplen	m³	27,537.0	18,982.0	68.93%	8,555.0	2,503.4	0.0	En proceso
Subyacente	m³	39,813.0	17,380.0	43.65%	22,433.0	2,488.3	1,200.0	En proceso
Subrasante	m³	18,354.0	6,828.0	37.20%	11,526.0	1,079.0	700.0	En proceso
OBRAS DE DRENAJE								
Obras de drenaje	pza.	7	4	57.14%	3.0	0.5	0.5	En proceso
PAVIMENTOS								
Base hidráulica	m³	8,798.0	3,990.0	45.35%	4,808.0	628.4	350.0	En proceso
Base asfáltica	m³	5,083.0	1,526.0	30.02%	3,557.0	564.8	0.0	En proceso
Carpetas asfáltica	m³	3,307.0	0.0	0.00%	3,307.0	0.0	0.0	En proceso
Puentes	pza.	1.0	0.1	10.00%	0.9	0.4	0.0	Puente "Las Limas" km 30+778 8 pilotes colados
SEÑALAMIENTO								
Obra complementaria	km	3.6	0.0	0.00%	3.60	0.0	0.0	Por iniciar
Señalamiento definitivo	km	3.6	0.0	0.00%	3.60	0.0	0.0	Por iniciar

km 35+160 al km 38+820

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 26/06/2026 al 02/07/2026		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
TERRACERÍAS								
Ime	m³	34,330.0	6,032.0	17.57%	28,298.0	2,288.7	0.0	En proceso
.	m³	203,755.0	87,350.0	42.87%	116,405.0	11,845.8	4,228.0	En proceso
lenes 90%	m³	78,664.0	20,492.8	26.05%	58,171.2	4,878.5	0.0	En proceso
plen	m³	33,734.0	26,301.5	77.97%	7,432.5	2,558.8	1,113.0	En proceso
cente	m³	23,233.0	11,306.4	48.67%	11,926.6	2,323.0	1,139.5	En proceso
sante	m³	16,228.0	5,603.9	34.53%	10,624.1	901.6	1,149.6	En proceso
S DE DRENAJE								
de drenaje Tubería	pza.	12	6.5	54.17%	5.5	0.6	0.5	En proceso
IENTOS								
idráulica	m³	7,895.0	3,335.3	42.25%	4,559.7	464.4	464.2	En proceso
sfáltica	m³	4,561.0	385.2	8.45%	4,175.8	325.8	0.0	En proceso
a: asfáltica	m³	3,327.0	0.0	0.00%	3,327.0	0.0	0.0	En proceso
es	pza.	2.0	0.2	10.00%	1.8	0.0	0.1	Por iniciar
AMIENTO								
: complementaria	km	3.6	0.0	0.00%	3.60	0.0	0.0	Por iniciar
imiento definitivo	km	3.6	0.0	0.00%	3.60	0.0	0.0	Por iniciar

Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Tamazunchale - Huejutla

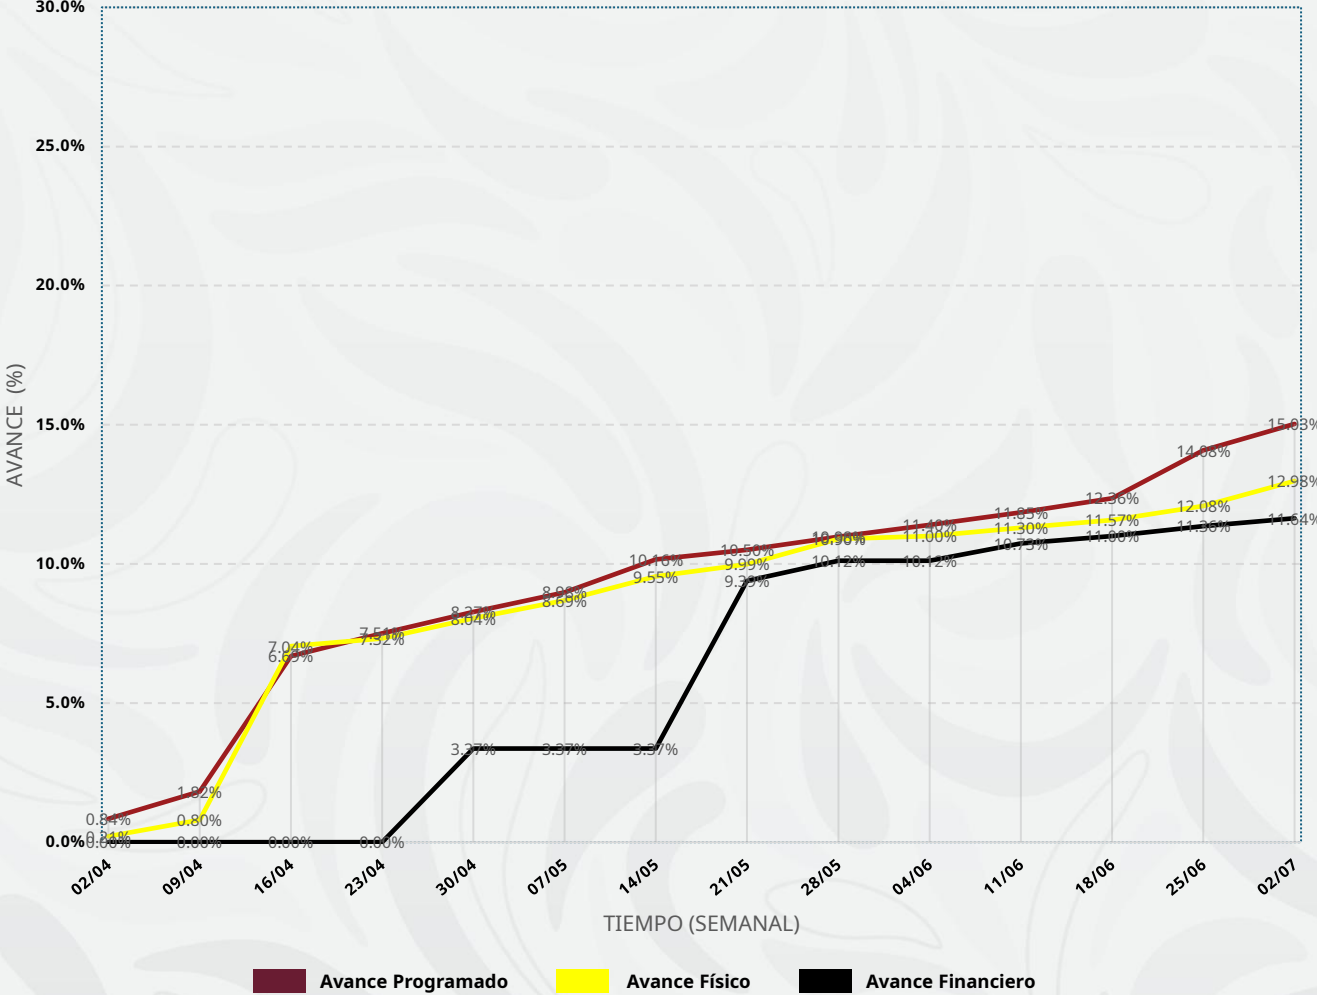

	19 de junio al 25 de junio	26 de junio al 02 de julio
Fuerza de Trabajo (personas)	244	244
Maquinaria	133	132
Frentes	21	21



San Luis Potosí - Hidalgo

Tamazunchale – Huejutla – Pachuca

km 0+000 al km 10+000

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	25/06/26 al 02/07/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Desmante (Ha)	20.0	20.0	-	-	-	Concluido
Despalme (m3)	21,500.0	21,500.0	-	-	-	Concluido
Cortes (m3)	183,255.0	183,255.0	-	-	-	Concluido
Terraplén (m3)	42,250.0	42,250.0	-	-	-	Concluido
Subyacente (m3)	93,012.0	93,012.0	-	-	-	Concluido
Subrasante (m3)	36,638.0	36,638.0	-	-	-	Concluido
Excavación estructuras y O.D. (m3)	14,264.6	14,264.6	-	-	-	Concluido
Demolición de concreto hidráulico (m3)	3,727.5	3,727.5	-	-	-	Concluido
Base hidráulica (m3)	30,000.0	30,000.0	-	-	-	Concluido
Base asfáltica (m3)	16,760.0	16,690.0	70.0	0.0	0.0	
Carpeta asfáltica (m3)	10,692.0	9,040.0	1,652.0	0.0	998.0	
Puentes peatonales (pza)	2.0	0.8	1.2	0.0	0.01	Reducción meta por conflicto social
Señalamiento (m)	43,334.0	0.0	43,334.0	0.0	0.0	

km 10+000 al km 20+000

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	25/06/26 al 02/07/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Desmante (Ha)	36.0	36.0	-	-	-	Concluido
Despalme (m3)	31,500.0	31,500.0	-	-	-	Concluido
Cortes (m3)	347,581.0	347,581.0	-	-	-	Concluido
Terraplén (m3)	251,735.0	251,735.0	-	-	-	Concluido
Subyacente (m3)	77,344.0	77,344.0	-	-	-	Concluido
Subrasante (m3)	32,248.0	32,248.0	-	-	-	Concluido
Excavación estructuras y O.D. (m3)	133,739.6	133,739.6	-	-	-	Concluido
Base hidráulica (m3)	30,000.0	30,000.0	-	-	-	Concluido
Base asfáltica (m3)	16,760.0	16,760.0	-	-	60.0	Concluido
Carpeta asfáltica (m3)	10,692.0	1,810.0	8,882.0	0.0	800.0	
Señalamiento (m)	43,334.0	2,000.0	41,334.0	0.0	0.0	



Avances físicos (San Luis Potosí)



Avances físicos (Hidalgo)

Inversiones y Metas 2025 - 2030

	2025		2026		PEF		VDG		2027		2028		2029		2030		Total	
	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta
Pachuca-Huejutla-Tamazunchale	1,649.5	27	2,550.4	37	1,682.1	21	868.3	16	3,008.1	52	1,645.1	42	86.1	0	84.5	0	9,023.68	158
Hidalgo	821.7	17	1651.8	30	1093.6	-	558.2	-	1,612.6	48	1,206.3	36	77.5	-	76.8	-	5,446.6	131
San Luis Potosi	827.9	10	898.6	7	588.5	-	310.1	-	1,395.5	4	438.8	6	8.5	-	7.8	-	3,577.0	27
