

Salina Cruz-Zihuatanejo (MEX-200)

Tramo Guerrero

Avance global	• Programado: 8.61%	• Semanal: 0.11%	Avance 2025	• Programado: 100.0%	• Semanal: 0.19%	Avance 2026	• Programado: 18.61%	• Semanal: 1.01%
	• Real: 7.31%	• Financiero: 6.68%		• Real: 98.21%	• Financiero: 100.0%		• Real: 8.03%	• Financiero: 1.29%



**Inversión total 2025-2030:** 24,722 mdp

- Guerrero: 6,641 mdp
- Oaxaca: 18,081 mdp

Meta total 2025-2030: 423 km *

- Guerrero: 103 km
- Oaxaca: 319 km

**Inversión 2026:** 2,757 mdp

- Oaxaca: 2,757 mdp

Meta 2026: 37 km

**Inicio :** 1 de abril de 2025
Termino: 31 de diciembre 2029
Término meta 2025: 30 de mayo de 2026

**74,166** empleos generados

**1,947,399** habitantes beneficiados


Beneficios: Reducción en tiempos de traslados de la Costa Chica de Gro. hacia Puerto Escondido Oax., reduciendo costos operativos e impulsando el turismo local y nacional de los municipios de Acapulco, San Marcos, Florencio Villareal, Cuajinicuilapa, Pinotepa Nacional, Villa de Tututepec, San Pedro Mixtepec, Pochutla y Huatulco.

Oaxaca/Guerrero

Salina Cruz-Zihuatanejo (MEX-200)

Elemento	Meta	Ejecutado Acumulable	Faltante	24-04-26 al 30-04-26	
				Programado	Ejecutado
Troncal	*13.58 km	*13.35 km	*0.23 km	0.0%	0.0%
8 puentes	8 pts	95.81% de 8 pts	4.19% de 8 pts	0.0%	0.1%
OBSERVACIONES					
Oaxaca Tramo 1 (0 frentes de trabajo) Concluido. Tramo 2 (0 frentes de trabajo) Sin actividad Tramo 3 (0 frentes de trabajo) Concluido Guerrero Puente Las Vigas km 81+200: Concluido. Puente Agua Hedionda Km 106+760: Concluido. Puente Copala Km 116+000: Concluido. Puente Marquelia I km 135+500: Concluido. Puente Nexpa km 85+300: Trabajos de pintura y Limpieza de Caudal. Puente Talapilla km 171+857: Concluido Puente Rio Quetzala Km 173+711: Montaje de trabes claro 4-5 y 5-6, armado y cimbrado de diafragmas en los siguientes claros, colocación de losacero en losas, armado y cimbrado de losas. Puente Santa Catarina km 183+740: Descimbrado guarnición. Base hidráulica. Conos de derrame					

Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Salina Cruz - Zihuatanejo

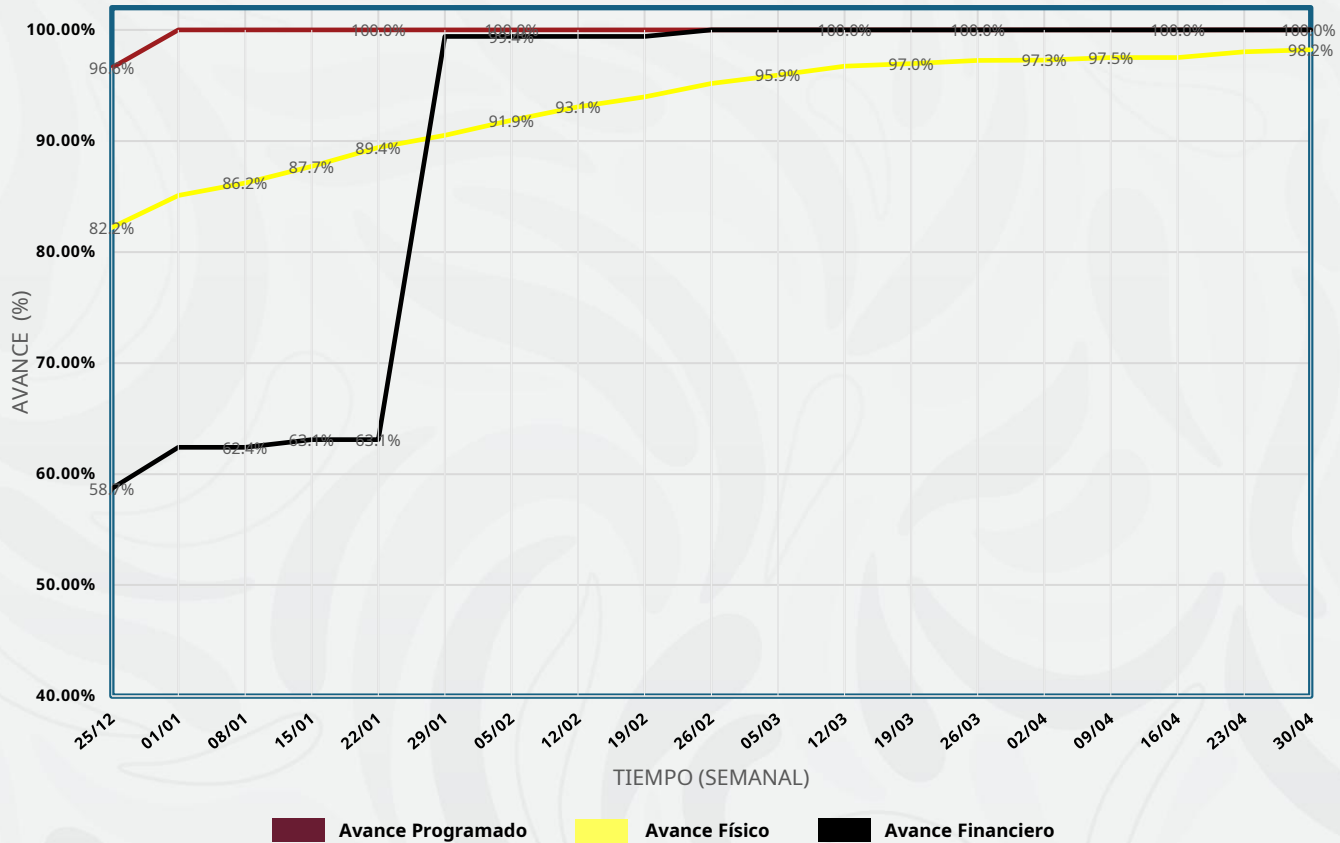

	17 de abril al 23 de abril 2026	24 de abril al 30 de abril 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	70	70
Maquinaria	59	54
Frentes	9	9

* 13.58 km se realizó un convenio en reducción de volúmenes del tramo I
