

Tabasco-Campeche

Macuspana-Escárcega (Carretera Federal 186)

Tramo Tabasco

Avance global

- Programado: 6.96%
- Real: 6.97%
- Semanal: 0.02%
- Financiero: 6.97%

Avance 2026

- Programado: 16.20%
- Real: 16.20%
- Semanal: 15.00%
- Financiero: 16.20%

Inversión total 2025-2029: 21,047 mdp

- **Tabasco:** 8,335 mdp
- **Campeche:** 11,483 mdp
- **Chiapas:** 1,229 mdp

Meta total 2025-2029: | 249 km |
Ampliación a 22 m (A4)
Tabasco • 92 km | Chiapas • 14 km | Campeche • 143 km

Inversión 2025: 1,429 MDP

- **Tabasco:** 1,145 mdp
- **Campeche:** 284 mdp

Meta 2025:

- **Tabasco:** 12 km y 2 puentes
- **Campeche:** 4 km y 2 entronques

Inversión 2026: 3,749 MDP

- **Tabasco:** 3,109 mdp
- **Campeche:** 640 mdp

Meta 2026:

- **Tabasco:** 26 km, 1 PSV y 2 puentes
- **Campeche:** 6 km

Inicio: 16 de marzo de 2025
Término: Diciembre 2029
Término meta 2025: 28 de febrero de 2026



63,141 empleos generados

760 mil habitantes beneficiados

40 minutos de ahorro en tiempo

Beneficios Incrementaría la capacidad de la vía, mejora el nivel de servicio, reduce los costos de operación vehicular y los tiempos de recorrido de los usuarios, así como el riesgo de accidentes.

Tabasco-Campeche


Macuspana-Escárcega (Carretera Federal 186)

Tramo Tabasco

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Elemento	Unidad	Intervención total	Ejecutado	Faltante	08/05/2026 al 14/05/2026	
			acumulado		Programado	Ejecutado
Despalme	m³	115,589.04	111,227.31	4,361.73	11,453.30	875.00
Escalones de Liga	m³	20,122.39	18,705.82	1,416.57	2,137.10	150.00
Cortes	m³	114,909.49	77,309.38	37,600.11	14,903.35	1,290.00
Pedraplén	m³	151,364.26	128,417.24	22,947.02	13,128.09	1,215.50
Geotextil	m²	159,125.66	97,587.93	61,537.73	10,279.43	620.54
Geomalla	m²	173,510.17	108,320.54	65,189.63	7,404.66	759.88
Terraplén	m³	334,276.23	194,573.02	139,703.21	6,447.77	11,347.83
Subyacente	m³	132,720.47	94,469.56	38,250.91	1,169.03	12,945.62
Subrasante	m³	67,539.93	34,902.07	32,637.86	227.30	7,102.24
Base Hidráulica	m³	96,985.11	11,823.56	85,161.55	486.80	2,728.89
Obras de drenaje	pza	95.00	40.00	55.00	17.00	3.50
Cabecal	pza	13.00	4.00	9.00	0.90	1.00
Trabes Aashto IV de 1.35 m x 30.60 m (fabricación)	pza	94.00	56.00	38.00	3.50	12.00
Escamas de concreto en muros	pza	3,172.00	991.00	2,181.00	0.00	281.00
Dala de desplante	m	1,308.83	250.00	1,058.83	0.00	250.00

NOTA:
Se ajustan los volúmenes correspondientes a los elementos de puentes, debido a la actualización del proyecto puente “El Pechocho”.
Motivo: Cambio de configuración estructural (de 1 a 3 claros).
El nuevo proyecto estará aprobado por el Area de proyectos de la DGC y el CSICT Tabasco.

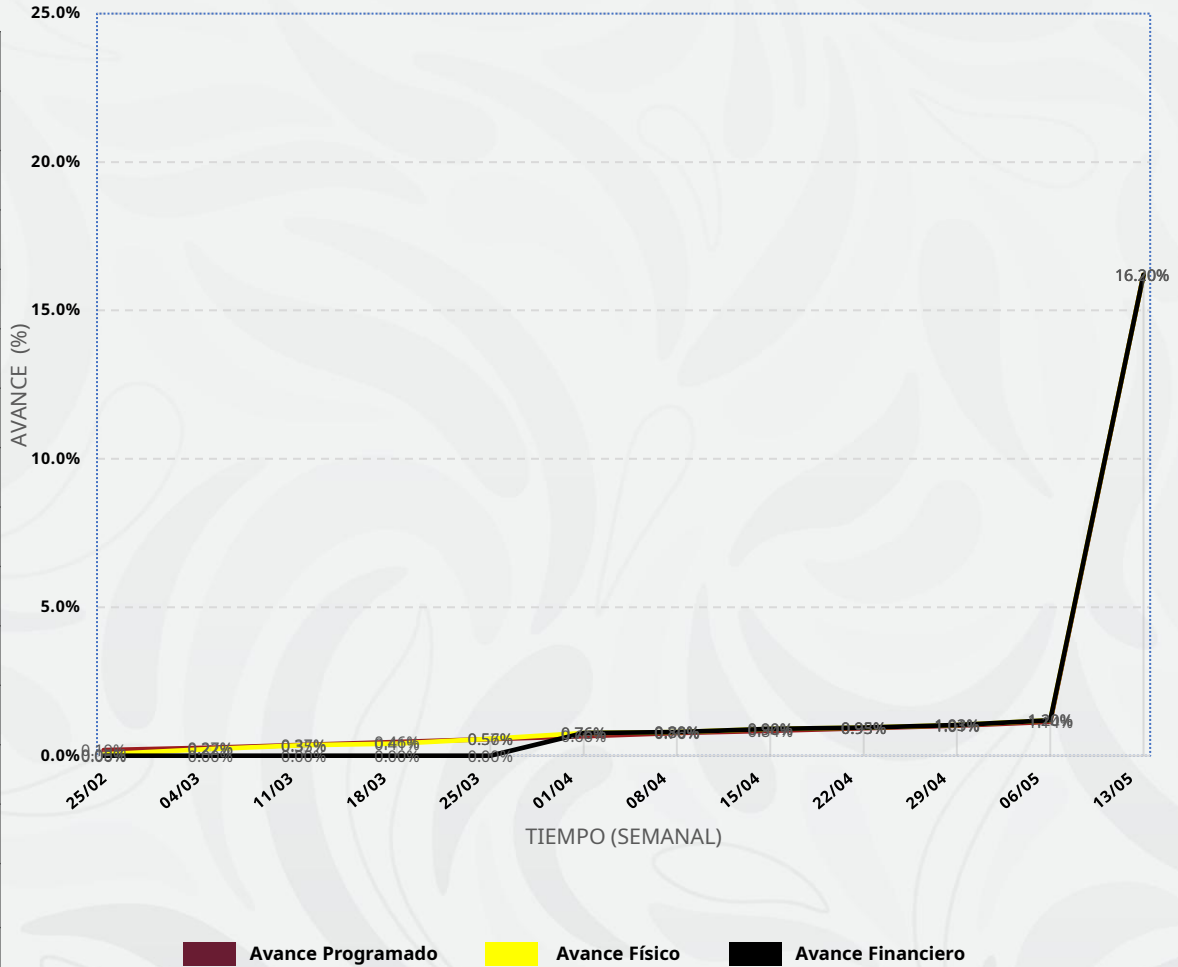

	01 de mayo al 07 de mayo	08 de mayo al 14 de mayo
Fuerza de Trabajo (personas)	492	489
Maquinaria	156	152
Frentes de trabajo	37	36
