

Tabasco-Campeche

Macuspana-Escárcega (Carretera Federal 186)

Tramo Tabasco

ACTUALIZADA 26/05/2026



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance global

- Programado: 7.02%
- Real: 7.01%
- Semanal: 0.04%
- Financiero: 7.01%

Avance 2026

- Programado: 9.0%
- Real: 9.0%
- Semanal: 0.05%
- Financiero: 16.25%



Inversión total 2025-2029: 21,065 mdp

Tabasco: 4,618mdp | Campeche: 11,520 mdp | Chiapas: 4,927 mdp

Meta total 2025-2029: 249 km

Tabasco • 44 km | Campeche • 143 km | Chiapas: 62 km



Inversión 2025: 1,429 MDP

Tabasco: 1,145 mdp | Campeche: 284 mdp

Meta 2025:

Tabasco: 12 km y 2 puentes | Campeche: 4 km y 2 entronques



Inversión total 2026: 5,256 MDP

Tabasco: 3,126 mdp | Campeche: 1,721 mdp | Chiapas: 410 mdp

Meta total 2026: 54 km

Tabasco: 28.5 km | Campeche: 20 km | Chiapas: 5.5 km

Inversión PEF 2026: 3,493 MDP

Tabasco: 2,939 mdp | Campeche: 554 mdp

Meta PEF 2026: 32 km

Tabasco: 26 km | Campeche: 6 km

Inversión VDG 2026: 1,763 MDP

Tabasco: 186 mdp | Campeche: 1,167 mdp | Chiapas: 410 mdp

Meta PEF 2026: 22 km

Tabasco: 2.5 km | Campeche: 14 km | Chiapas: 5.5 km



Inicio: 16 de marzo de 2025

Término: Diciembre 2029

Término meta 2025: 28 de febrero de 2026



63,141 empleos generados



760 mil habitantes beneficiados



40 minutos de ahorro en tiempo

Beneficios Incrementaría la capacidad de la vía, mejora el nivel de servicio, reduce los costos de operación vehicular y los tiempos de recorrido de los usuarios, así como el riesgo de accidentes.


Tabasco-Campeche

Macuspana-Escárcega (Carretera Federal 186)

Tramo Tabasco

Elemento	Unidad	Intervención total	Ejecutado	Faltante	15/05/2026 al 21/05/2026	
			acumulado		Programado	Ejecutado
Despalme	m³	156,881.12	117,454.49	39,426.63	7,298.26	6,227.18
Escalones de Liga	m³	48,756.93	18,928.77	29,828.16	1,875.45	222.95
Cortes	m³	238,248.52	80,929.74	157,318.78	7,299.66	3,620.36
Pedraplén	m³	279,780.62	130,503.89	149,276.73	9,510.95	2,086.65
Geotextil	m²	286,529.66	99,418.46	187,111.20	10,311.97	1,830.53
Geomalla	m²	297,141.98	110,290.41	186,851.57	10,656.41	1,969.87
Terraplén	m³	603,509.02	202,258.88	401,250.14	24,987.40	7,685.86
Subyacente	m³	296,158.05	103,878.30	192,279.75	10,700.89	9,408.74
Subrasante	m³	136,171.87	40,080.59	96,091.28	3,938.43	5,178.52
Base Hidráulica	m³	186,735.67	16,893.84	169,841.83	4,363.74	5,070.28
Obras de drenaje	pza	125.00	41.50	83.50	4.50	1.50
Cabezal	pza	15.00	5.00	10.00	0.82	1.00
Trabes Aashto IV de 1.35 m x 0.60 m x 0.50 m (transporte y montaje)	pza	108.00	42.00	66.00	9.48	28.00
Escamas de concreto en muros	pza	3,172.00	1,082.00	2,090.00	407.49	91.00
Dala de desplante	m	1,308.83	480.00	828.83	142.85	230.00

NOTA:
El incremento y ajuste en volúmenes se debe a que se emitieron 3 fallos más de obra para el estado de Tabasco.

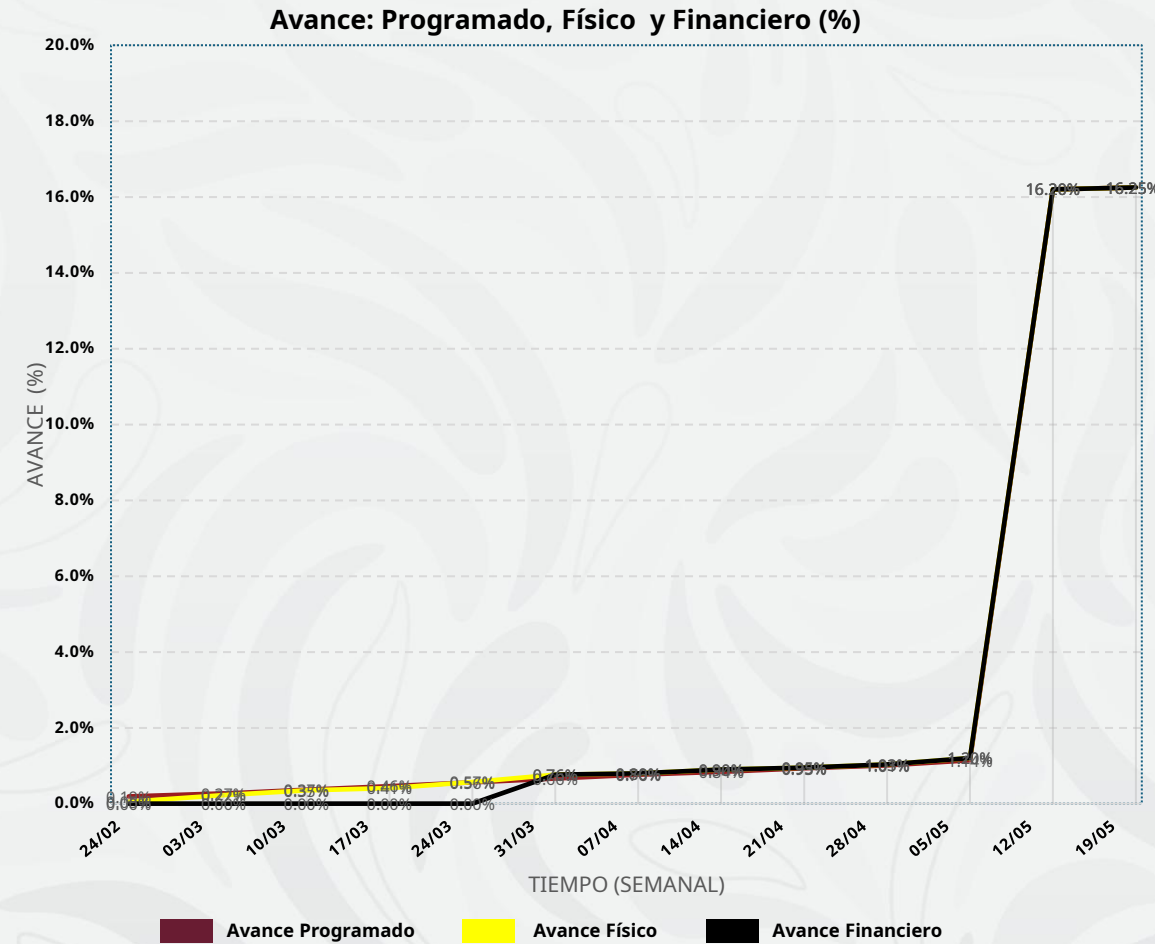

	08 de mayo al 14 de mayo	15 de mayo al 21 de mayo
Fuerza de Trabajo (personas)	489	524
Maquinaria	152	179
Frentes de trabajo	36	42
