



Sonora/Chihuahua

Camino Límite Estados Chihuahua/Sonora-Pancho Villa-E.C. (Janos-Monte Verde)

1.- Constructora URBATRAC, S.A. de C.V.

Meta: Km 0+000-km 11+000, incluye entronque km 0+000
Inversión: 324.6 MDP C/IVA

2.- ESMA Instalaciones, S.A. de C.V.

Meta: Km 11+000-km 18+093 km
Inversión: 306.2 MDP C/IVA

3.- INNOVACIONES INTELIGENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN,S.A DE C.V Y CMCO,S.A DE C.V

F. Km 6+900 Puente I, 122.0 m
G. Km 14+700 Puente II, 61.5 m

4.- CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PROYECTOS INTERESTATALES,S.A DE C.V

Por modernizar a nivel de pavimento a 7.0 m
Meta: Km 18+093 – km 29+093

5.- La CIMA Terraceros, S.A. de C.V. y Estructuras y Excavaciones JM, S.A. de C.V.

Meta: Km 29+093-KM 47+233
Inversión: 193.9 MDP C/IVA

6.- MERP Edificaciones y Terracerías, S.A. de C.V.

Meta: Km 47+233-Km 59+823 y Km 66+422-Km 66+829, incluye Boulevard y entronque a nivel.
Inversión: 179.4 MDP C/IVA


7.- Asfaltos y Triturados EL PUJAL, S.A. de C.V.

En proceso de construcción de 5 puentes:

A. Km 22+758 El Papalote, 30.0 m
B. Km 25+758 Los Pilares, 40.0 m
C. Km 33+832 Las Profesoras, 40.0 m
D. Km 36+682 La Enramada, 30.0 m
E. Km 38+362 La Pila, 120.0 m
Inversión: 122.5 MDP C/IVA

Avance físico • Programado: 96.0%
• Real: 97.5%

• Semanal: 1.0%
• Financiero: 81.0%

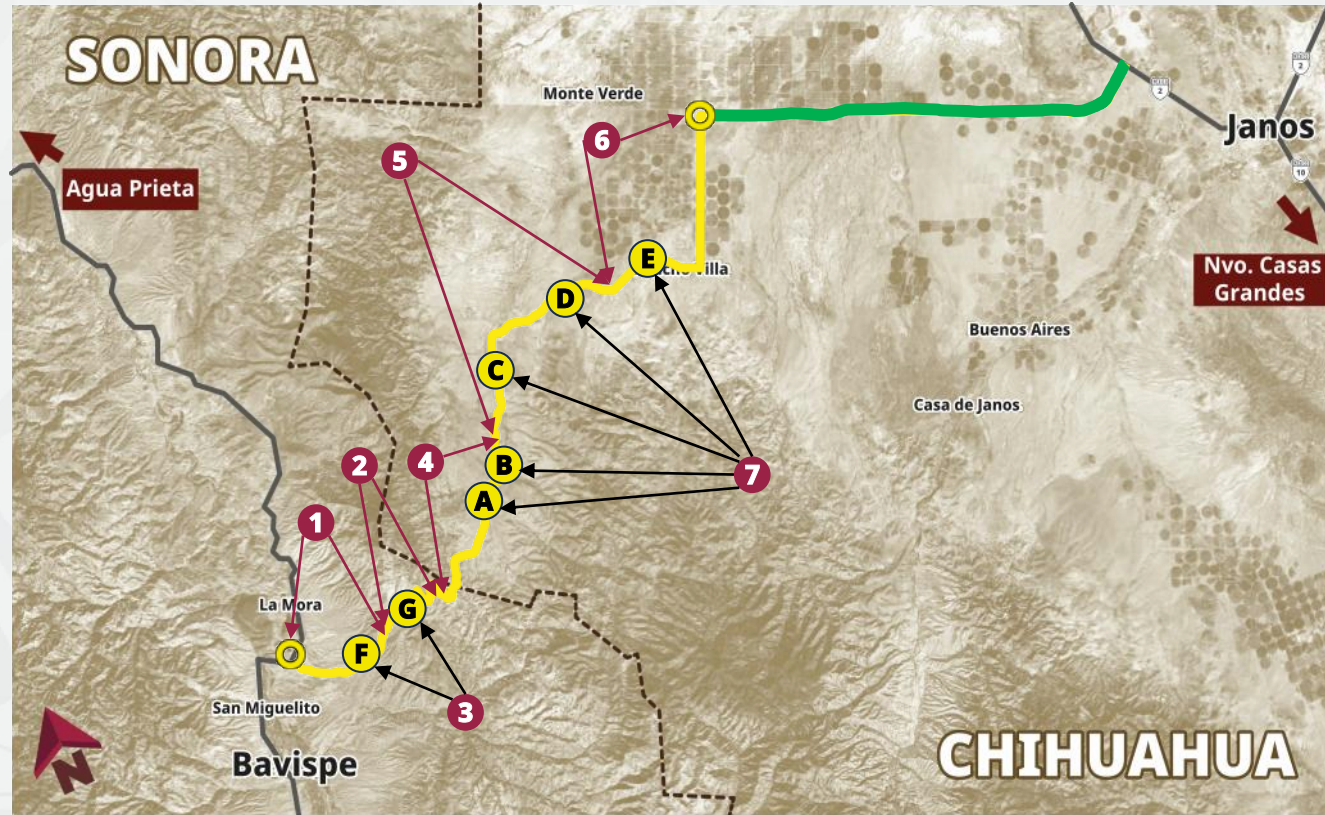

Inversión total: 1,710 mdp
Sonora: 769 mdp
Chihuahua: 941 mdp



Meta total: 67 km y 7 puentes
• 6.6 km modernizados C, Chihuahua (se requiere trabajos complementarios)



Inversión 2026: 60 mdp



Inicio: marzo, 2025
Término: 30 Enero de 2026



5,130 empleos generados



4,145 habitantes beneficiados



90 minutos de ahorro en tiempo

S1.- CLAMI INGENIEROS, S.C

Tramo: del km 0+000 al km 11+000, puente Sonora I en el km 6+900
Inversión: 6.1 MDP C/IVA

S2.- NEDOX, S.A DE C.V

Tramo: del km 11+000 al km 18+093, puente Sonora II en el km 14+700
Inversión: 6.8 MDP C/IVA

S3.- JIDASA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V

Tramo: tramo del km 18+093 al km 29+093, 5 puentes Chihuahua
Inversión: 7.5 MDP C/IVA

S4.- GSM SUPERVISIÓN, PROYECTO E IMPACTO AMBIENTAL, S.A DE C.V

Tramo: tramo del km 29+093 al km 59+822, del km 66+422 al km 66+828
Inversión: 7.5 MDP C/IVA

S5.- GRUPO SELOME, S.A. DE C.V

Tramo: Manifestación de Impacto Ambiental y de Cambio de Uso de Suelo Forestal, Chihuahua
Inversión: 6.7 MDP C/IVA

S6.- PROVEEDORA DE INGENIERIA, INSTALACION E INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V

Tramo: implementación y ejecución de medidas de mitigación de la Manifestación de Impacto Ambiental, Sonora
Inversión: 14.0 MDP C/IVA

S7.- GRUPO CORPOIIA, S.A. DE C.V.


Tramo: implementación y ejecución de medidas de mitigación de la Manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad regional, Sonora
Inversión: 10.5 MDP C/IVA

Sonora/Chihuahua

E.C. (Agua Prieta-Bavispe)-Pancho Villa-E.C.
(Janos-Monte Verde)



Elemento44.9	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	16-01-26 al 22-01-26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Ampliación: Tramo Sonora	18	86.5%	13.5%	1.0%	0.8%	
Ampliación: Tramo Chihuahua	42	89.82%	10.18%	0%	1.04%	• Aumentar turnos en las jornadas
Construcción Puentes (Chihuahua)	5	68.17%	31.83%	0%	4.40%	• Incrementar cuadrillas de trabajo y equipo para colado
Construcción Puentes (Sonora)	2	75.0%	25.0%	0%	2.8%	

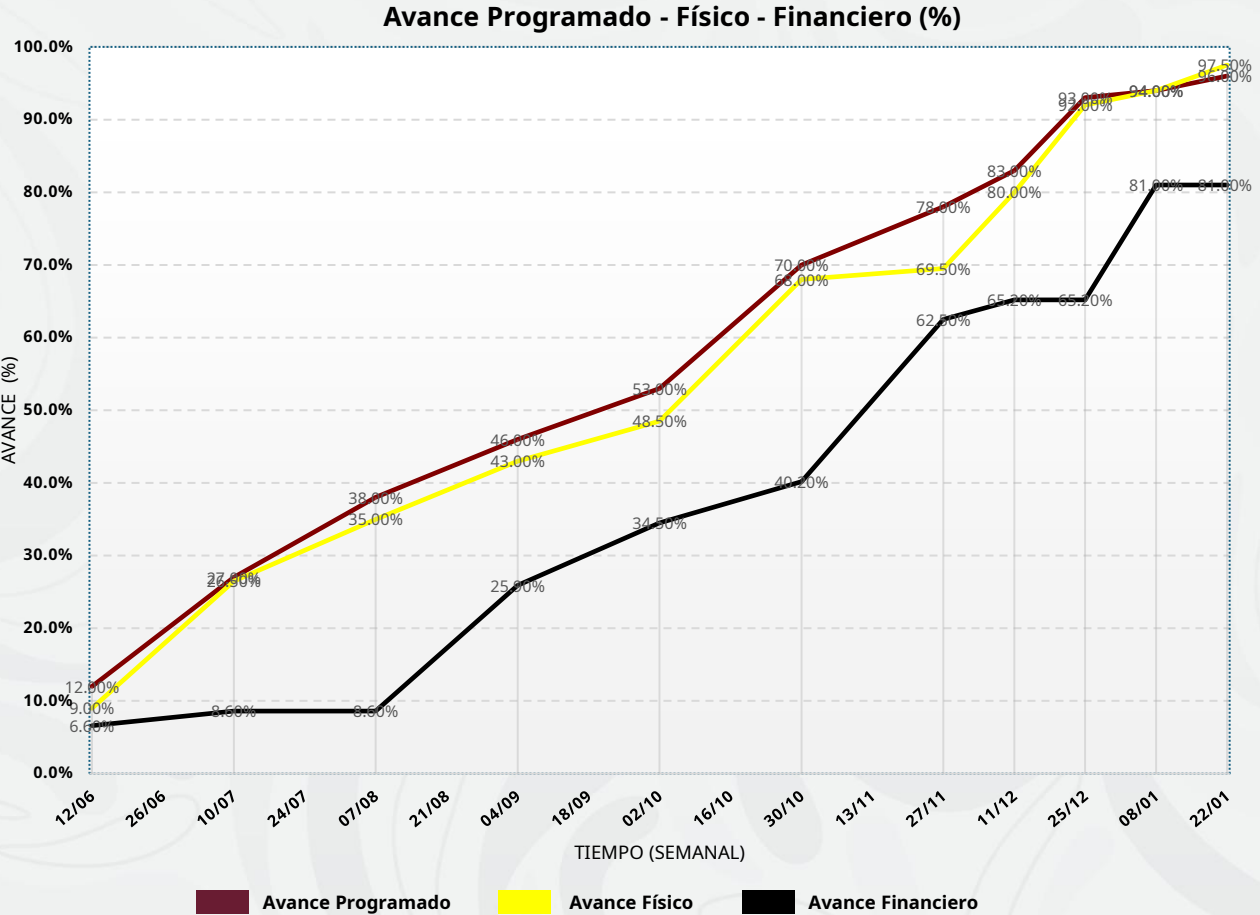

	09 de enero al 15 de enero 2026	09 de enero al 15 de enero 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	835	835
Maquinaria	445	443
Frentes de trabajo	84	84
