

# Tabasco-Campeche

## Macuspana-Escárcega (Carretera Federal 186)

### Tramo Tabasco



**Comunicaciones**

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

**Avance global**

- Programado: 12.00%
- Semanal: 0.02%
- Real: 11.92%
- Financiero: 9.86%

**Avance 2025**

- Programado: 100.00%
- Semanal: 0.21%
- Real: 99.35%
- Financiero: 99.35%

**\* Inversión y meta reportada en visita de obra:**

- 21,047 mdp
- 249 km, 40 estructuras 26 puentes peatonales

**1.- ALZ Construcciones, S.A. de C.V.**

**Meta:** 4 km (48+000 al 52+000),  
1 Puente y 1 PIPR.  
**Inversión:** \$394,246,356.46 C/IVA

**2.- COCONAL, S.A.P.I. de C.V.**

**Meta:** 4 km (52+000 al 56+000),  
Carriles lateral de PSV y 2 Retornos  
**Inversión:** \$322,147,452.68 C/IVA

**3.- Grupo Comercial y Constructora  
Agua Blanca, S.A. de C.V. y  
Construcciones MARCKASA, S.A. de  
C.V.**

**Meta:** 4 km (56+000 al 60+000),  
1 Puente, 1 Retorno y 2 PIPRs.  
**Inversión:** \$368,799,319.86 MDP C/IVA

**4. COCONAL, S.A.P.I. DE C.V.**

**Meta:** 4 km (km 293+960 al km 294+550),  
2 Entr. a nivel km 293+960 y km 294+550  
**Inversión:** \$274,865,519.08 C/IVA

**Supervisiones**

**S1. CANAN, Ingeniería, Consultoría Y  
Medio Ambiente, S.A. de C.V.**

**Meta:** Supervisión de los Trabajos de  
Modernización y Ampliación  
**Inversión:** \$9,144,863.79 C/IVA

**Simbología**

- En proceso de construcción 2025
- Modernizado
- Programado 2026, 2027, 2028



**S2. Grupo COEZAC, S.A. de C.V.**

**Meta:** Supervisión de los Trabajos de  
Modernización y Ampliación  
**Inversión:** \$8,829,809.45 C/IVA

**S3. VIAGENESIS Consultoría e  
Ingeniería, S.A. de C.V.**

**Meta:** Supervisión de los Trabajos de  
Modernización y Ampliación  
**Inversión:** \$9,306,875.53 C/IVA

**S4. VIAGENESIS Consultoría e  
Ingeniería, S.A. de C.V.**

**Meta:** Supervisión de los Trabajos de  
Modernización y Ampliación  
**Inversión:** \$9,306,875.53 C/IVA



**Inversión total 2025-2028:** 11,607 mdp

- **Tabasco:** 3,659 mdp
- **Campeche:** 2,257 mdp
- **Chiapas:** 5,691 mdp

**Inversión 2025:** 1,410 MDP /16 km

- **Tabasco:** 1,060 mdp | 12 km, 1  
entronque y 2 puentes
- **Campeche:** 350 mdp | 4 km, y 2  
entronques



**Meta total 2025-2028:** | 134 km |  
**Ampliación a 22 m (A4)**

Tabasco • 43 km | Chiapas • 66 km |  
Campeche • 25 km



**Inicio:** 16 de marzo de 2025

**Término:** Diciembre 2028

**Término meta 2025:** 31 Diciembre  
2025



**34,821** empleos generados



**760 mil** habitantes beneficiados



**40 minutos** de ahorro en tiempo

**301 km longitud total**  
**170 km Ampliados (A2 y A4)**

# Tabasco-Campeche

## Macuspana-Escárcega (Carretera Federal 186)

### Tramo Tabasco




# Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Km 48+000 – km 60+000 y km 293+000 al 297+000

Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Macuspana - Escárcega

Elemento	Intervención	Unidad	Ejecutado	Faltante	02/01/2026 al 08/01/2026	
			acumulado		Programado	Ejecutado
Desmonte	22.16	ha	22.16	0.00	0.50	0.37
Despalme	52,429.31	m³	52,429.31	0.00	1,500.00	1,296.00
Cortes	293,324.73	m³	293,324.73	0.00	3,126.00	2,585.59
Pedraplén	118,371.92	m³	118,371.92	0.00	1,428.00	834.84
Riego de sello	265,193.53	m²	223,563.57	41,629.96	66,297.13	13,200.00
Obras complementarias	24.00	km	22.75	1.25	3.50	0.12
Señalamiento	26.40	km	6.60	19.80	4.10	1.20

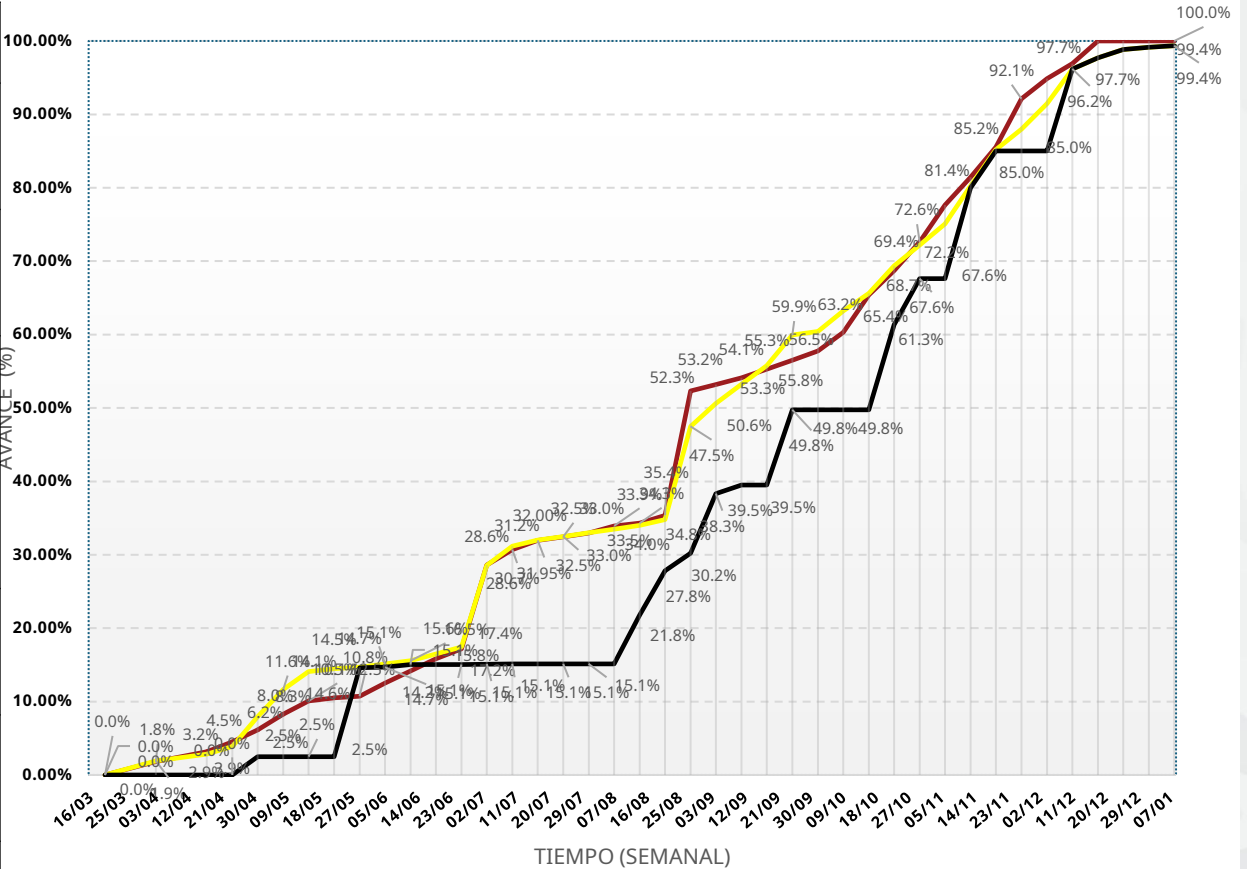

	26 de diciembre al 01 de enero	01 de enero al 08 de enero
Fuerza de Trabajo (personas)	399	376
Maquinaria	136	133
Frentes de trabajo	24	18
