

Tabasco-Campeche

Macuspana-Escárcega (Carretera Federal 186)

Tramo Tabasco

*** Inversión y meta reportada en visita de obra:**

- 21,047 mdp
- 249 km, 40 estructuras 26 puentes peatonales

Avance global

- Programado: 11.63%
- Real: 11.54%

- Semanal: 0.57%
- Financiero: 8.91%

Avance 2025

- Programado: 96.91%
- Real: 96.19%

- Semanal: 4.74%
- Financiero: 96.19%

- 1.- ALZ Construcciones, S.A. de C.V.

Meta:

4 km (48+000 al 52+000),
1 Puente y 1 PIPR.

Inversión:

\$394,246,356.46 C/IVA
- 2.- COCONAL, S.A.P.I. de C.V.

Meta:

4 km (52+000 al 56+000),
Carriles lateral de PSV y 2 Retornos

Inversión:

\$322,147,452.68 C/IVA
- 3.- Grupo Comercial y Constructora
Agua Blanca, S.A. de C.V. y
Construcciones MARCKASA, S.A. de C.V.

Meta:

4 km (56+000 al 60+000),
1 Puente, 1 Retorno y 2 PIPRs.

Inversión:

\$368,799,319.86 MDP C/IVA
4. COCONAL, S.A.P.I. DE C.V.

Meta:

4 km (km 293+960 al km 294+550),
2 Entr. a nivel km 293+960 y km 294+550

Inversión:

\$274,865,519.08 C/IVA

Supervisiones

- S1. CANAN, Ingeniería, Consultoría Y Medio Ambiente, S.A. de C.V.

Meta:

Supervisión de los Trabajos de Modernización y Ampliación

Inversión:

\$9,144,863.79 C/IVA
- S2. Grupo COEZAC, S.A. de C.V.

Meta:

Supervisión de los Trabajos de Modernización y Ampliación

Inversión:

\$8,829,809.45 C/IVA
- S3. VIAGENESIS Consultoría e Ingeniería, S.A. de C.V.

Meta:

Supervisión de los Trabajos de Modernización y Ampliación

Inversión:

\$9,306,875.53 C/IVA
- S4. VIAGENESIS Consultoría e Ingeniería, S.A. de C.V.

Meta:

Supervisión de los Trabajos de Modernización y Ampliación

Inversión:

\$9,306,875.53 C/IVA



- Icono de dinero

Inversión total 2025-2028:

11,607 mdp
- Tabasco: 3,659 mdp
 - Campeche: 2,257 mdp
 - Chiapas: 5,691 mdp
- Inversión 2025:

1,410 MDP /16 km
- Tabasco: 1,060 mdp | 12 km, 1 entronque y 2 puentes
 - Campeche: 350 mdp | 4 km, y 2 entronques
- Icono de edificio

Meta total 2025-2028:

| 134 km | Ampliación a 22 m (A4)
- Tabasco • 43 km | Chiapas • 66 km | Campeche • 25 km
- Icono de calendario

Inicio:

16 de marzo de 2025
- Término:

Diciembre 2028
- Término meta 2025:

31 Diciembre 2025
- Icono de grupo de personas

34,821 empleos generados
- Icono de grupo de personas

760 mil habitantes beneficiados
- Icono de reloj

40 minutos de ahorro en tiempo
- 301 km longitud total

170 km Ampliados (A2 y A4)


Tabasco-Campeche

Macuspana-Escárcega (Carretera Federal 186)

Tramo Tabasco

Km 48+000 – km 60+000 y km 293+000 al 297+000

Elemento	Intervención	Unidad	Ejecutado	Faltante	04/12/25 al 11/12/2025	
			acumulado		Programado	Ejecutado
Corte de Pavimentos	22,808.00	m³	22,808.00	0.00	0.00	384.93
Terraplén	328,912.88	m³	315,621.70	13,291.18	5,185.20	676.24
Subrasante	111,198.40	m³	109,298.66	1,899.74	5,550.40	120.00
Base Hidráulica	123,271.69	m³	112,462.93	10,808.76	8,690.81	2,105.10
Base Asfáltica	53,105.32	m³	48,085.10	5,020.22	4,279.80	1,819.07
Carpeta Asfáltica	40,454.83	m³	35,153.61	5,301.22	2,832.71	11,783.09
Riego de sello	265,193.53	m²	22,000.00	243,193.53	66,297.13	22,000.00
Obras complementarias	24.00	km	20.70	3.30	3.50	3.90
Barrera central	9.16	km	7.74	1.42	0.20	1.72
Guarnición	255.40	m	255.40	0.00	65.00	18.35
Parapetos	255.40	m	255.40	0.00	64.50	25.70

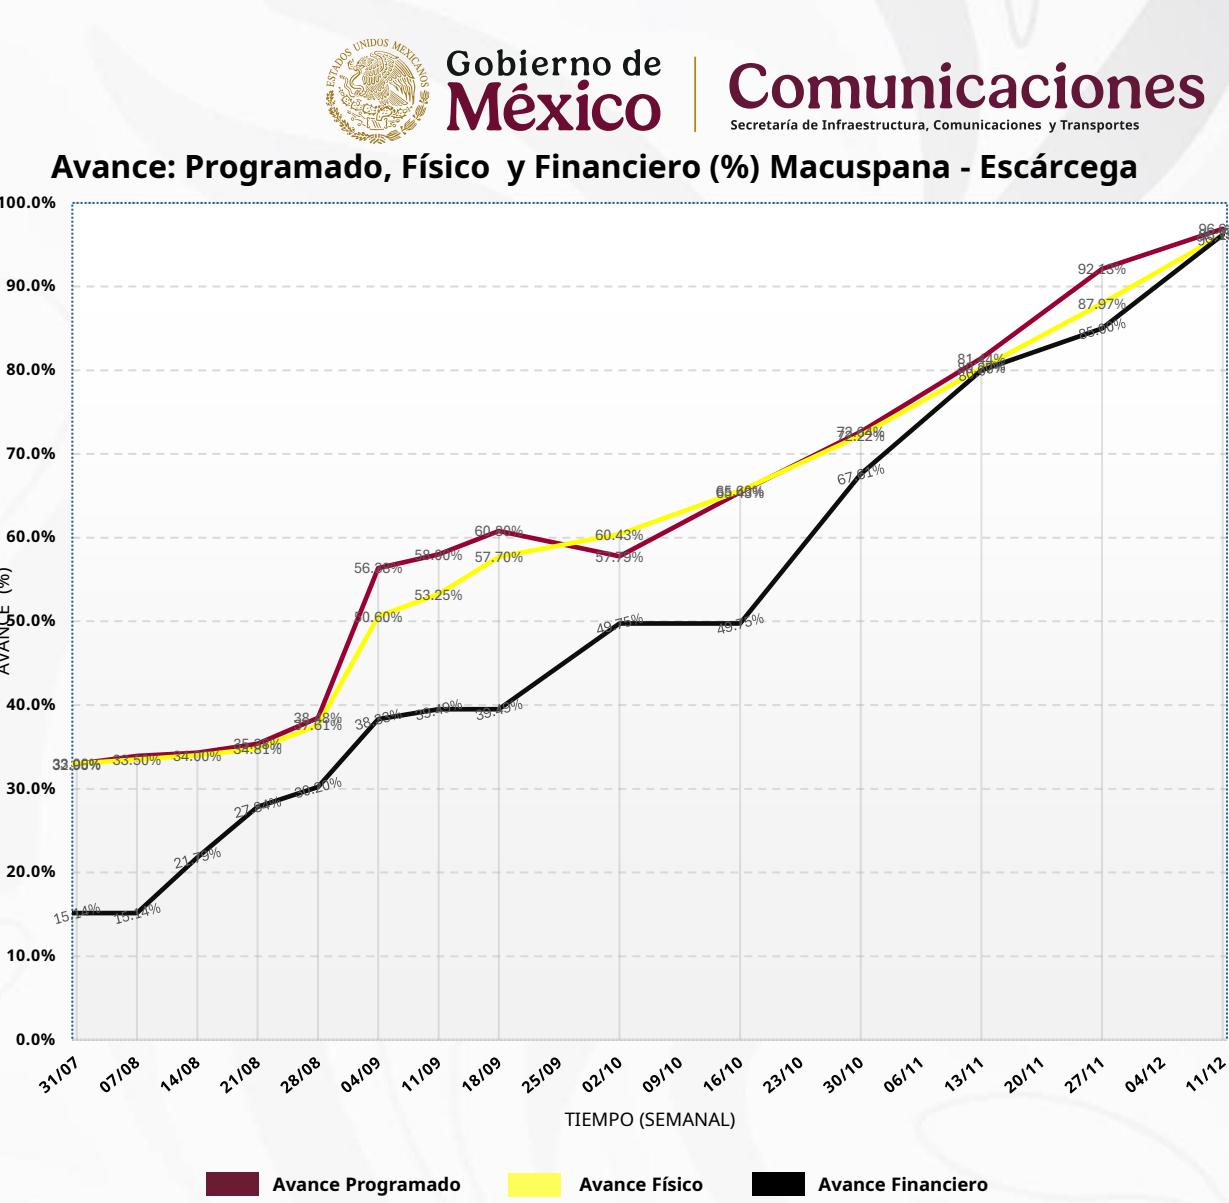

	28 de noviembre al 04 de diciembre	05 de diciembre al 11 de diciembre
Fuerza de Trabajo (personas)	545	516
Maquinaria	170	162
Frentes de trabajo	42	34
