



Tabasco-Campeche

Macuspana-Escárcega (Carretera Federal 186)

Tramo Tabasco

Derivado de los incrementos en montos y metas, los avances globales bajan.

Avance global

- Programado: 6.80%
- Real: 6.77%
- Semanal: 0.00%
- Financiero: 6.77%

Avance 2025

- Programado: 100.00%
- Real: 99.56%
- Semanal: 0.14%
- Financiero: 99.56%

1.- ALZ Construcciones, S.A. de C.V.

Meta: 4 km (48+000 al 52+000),
1 Puente y 1 PIPR.
Inversión: \$394,246,356.46 C/IVA

2.- COCONAL, S.A.P.I. de C.V.

Meta: 4 km (52+000 al 56+000),
Carriles lateral de PSV y 2 Retornos
Inversión: \$322,147,452.68 C/IVA

3.- Grupo Comercial y Constructora Agua Blanca, S.A. de C.V. y Construcciones MARCKASA, S.A. de C.V.

Meta: 4 km (56+000 al 60+000),
1 Puente, 1 Retorno y 2 PIPRs.
Inversión: \$368,799,319.86 MDP C/IVA

4. COCONAL, S.A.P.I. DE C.V.

Meta: 4 km (km 293+960 al km 294+550),
2 Entr. a nivel km 293+960 y km 294+550
Inversión: \$274,865,519.08 C/IVA

Supervisiones

S1. CANAN, Ingeniería, Consultoría Y Medio Ambiente, S.A. de C.V.

Meta: Supervisión de los Trabajos de Modernización y Ampliación
Inversión: \$9,144,863.79 C/IVA

S2. Grupo COEZAC, S.A. de C.V.

Meta: Supervisión de los Trabajos de Modernización y Ampliación
Inversión: \$8,829,809.45 C/IVA

S3. VIAGENESIS Consultoría e Ingeniería, S.A. de C.V.

Meta: Supervisión de los Trabajos de Modernización y Ampliación
Inversión: \$9,306,875.53 C/IVA

S4. VIAGENESIS Consultoría e Ingeniería, S.A. de C.V.

Meta: Supervisión de los Trabajos de Modernización y Ampliación
Inversión: \$9,306,875.53 C/IVA



Inversión total 2025-2028: 21,047 mdp

- Tabasco: 8,333 mdp
- Campeche: 11,484 mdp
- Chiapas: 1,229 mdp



Meta total 2025-2028: | 249 km |
Ampliación a 22 m (A4)
Tabasco • 92 km | Chiapas • 14 km |
Campeche • 143 km



Inversión 2026: 3,749 MDP
• Tabasco: 3,749 mdp



Meta 2026: 40 km



Inicio: 16 de marzo de 2025
Término: Diciembre 2028
Término meta 2025: 31 Diciembre 2025



63,141 empleos generados



760 mil habitantes beneficiados



40 minutos de ahorro en tiempo

**297 km longitud total
48 km Ampliados (A4)**



Tabasco-Campeche


Macuspana-Escárcega (Carretera Federal 186)

Tramo Tabasco

Km 48+000 - km 60+000 y km 293+000 al 297+000

Elemento	Intervención	Unidad	Ejecutado	Faltante	16/01/2026 al 22/01/2026	
			acumulado		Programado	Ejecutado
Subrasante	111,198.40	m³	109,411.06	1,787.34	5,550.40	73.40
Base Hidráulica	123,271.69	m³	123,071.49	200.20	8,690.81	79.00
Base Asfáltica	53,105.32	m³	50,843.02	2,262.30	4,279.80	708.00
Riego de sello	265,193.53	m²	234,483.57	30,709.96	66,297.13	6,600.00
Obras complementarias	24.00	km	23.37	0.63	3.50	0.21
Señalamiento	26.40	km	11.00	15.40	4.10	3.00

Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Macuspana - Escárcega

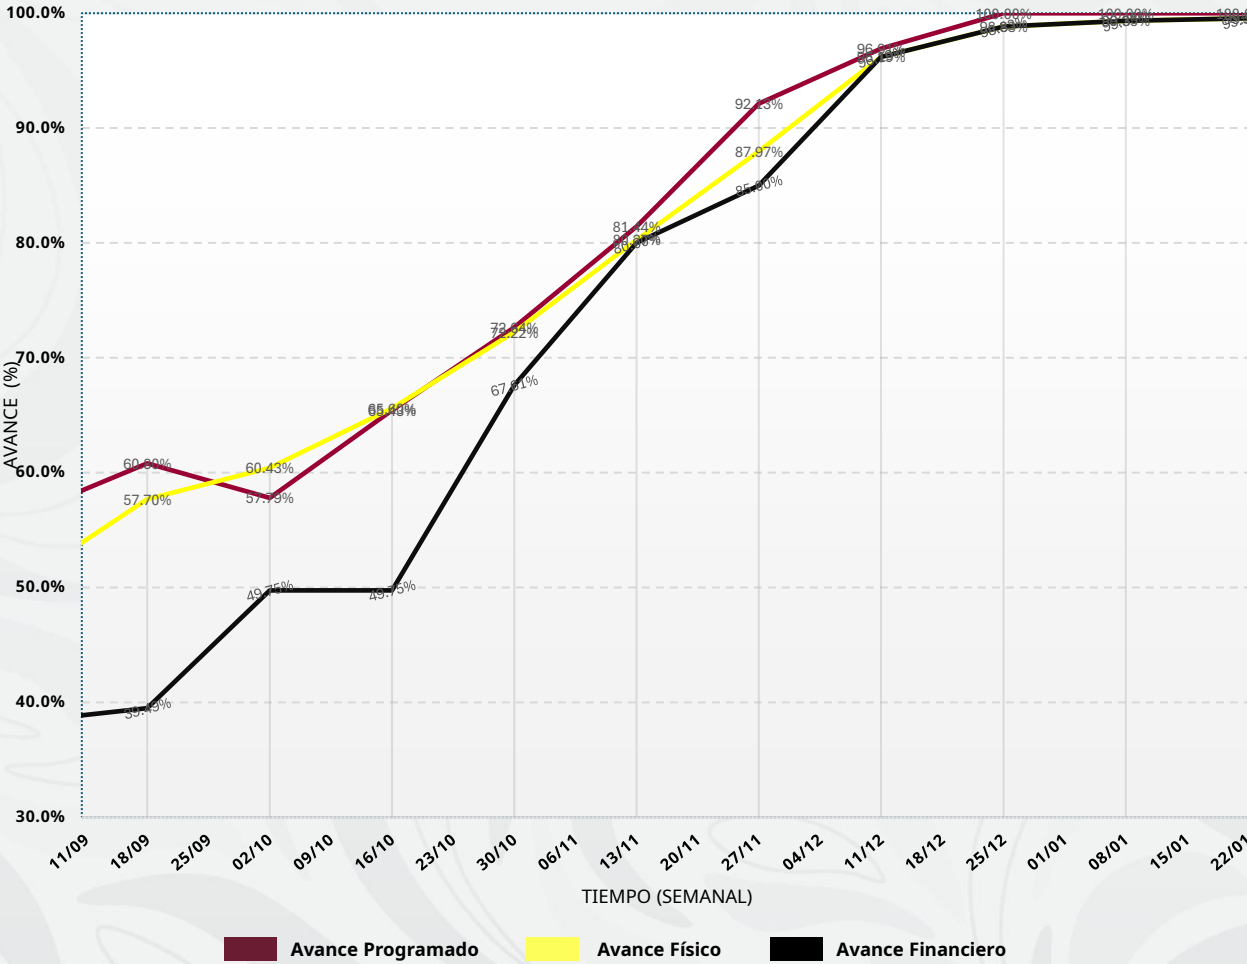

	09 de enero al 15 de enero	16 de enero al 22 de enero
Fuerza de Trabajo (personas)	373	347
Maquinaria	130	113
Frentes de trabajo	23	19
