

Tabasco-Campeche

Macuspana-Escárcega (Carretera Federal 186)

Tramo Tabasco

*** Inversión y meta reportada en visita de obra:**

- 21,047 mdp
- 249 km, 40 estructuras 26 puentes peatonales

Avance global

- Programado: 12.00%
- Real: 11.90%

- Semanal: 0.04%
- Financiero: 9.86%

Avance 2025

- Programado: 100.00%
- Real: 99.14%

- Semanal: 0.31%
- Financiero: 99.14%

- 1.- ALZ Construcciones, S.A. de C.V.

Meta:

4 km (48+000 al 52+000),
1 Puente y 1 PIPR.

Inversión:

\$394,246,356.46 C/IVA
- 2.- COCONAL, S.A.P.I. de C.V.

Meta:

4 km (52+000 al 56+000),
Carriles lateral de PSV y 2 Retornos

Inversión:

\$322,147,452.68 C/IVA
- 3.- Grupo Comercial y Constructora
Agua Blanca, S.A. de C.V. y
Construcciones MARCKASA, S.A. de C.V.

Meta:

4 km (56+000 al 60+000),
1 Puente, 1 Retorno y 2 PIPRs.

Inversión:

\$368,799,319.86 MDP C/IVA
4. COCONAL, S.A.P.I. DE C.V.

Meta:

4 km (km 293+960 al km 294+550),
2 Entr. a nivel km 293+960 y km 294+550

Inversión:

\$274,865,519.08 C/IVA

Supervisiones

- S1. CANAN, Ingeniería, Consultoría Y Medio Ambiente, S.A. de C.V.

Meta:

Supervisión de los Trabajos de Modernización y Ampliación

Inversión:

\$9,144,863.79 C/IVA
- S2. Grupo COEZAC, S.A. de C.V.

Meta:

Supervisión de los Trabajos de Modernización y Ampliación

Inversión:

\$8,829,809.45 C/IVA
- S3. VIAGENESIS Consultoría e Ingeniería, S.A. de C.V.

Meta:

Supervisión de los Trabajos de Modernización y Ampliación

Inversión:

\$9,306,875.53 C/IVA
- S4. VIAGENESIS Consultoría e Ingeniería, S.A. de C.V.

Meta:

Supervisión de los Trabajos de Modernización y Ampliación

Inversión:

\$9,306,875.53 C/IVA



- 

Inversión total 2025-2028:

11,607 mdp

 - Tabasco: 3,659 mdp
 - Campeche: 2,257 mdp
 - Chiapas: 5,691 mdp

Inversión 2025:

1,410 MDP /16 km

 - Tabasco: 1,060 mdp | 12 km, 1 entronque y 2 puentes
 - Campeche: 350 mdp | 4 km, y 2 entronques
- 

Meta total 2025-2028:

| 134 km | Ampliación a 22 m (A4)

Tabasco • 43 km | Chiapas • 66 km | Campeche • 25 km
- 

Inicio:

16 de marzo de 2025

Término:

Diciembre 2028

Término meta 2025:

31 Diciembre 2025
- 

34,821 empleos generados
- 

760 mil habitantes beneficiados
- 

40 minutos de ahorro en tiempo
- 301 km longitud total

170 km Ampliados (A2 y A4)

Tabasco-Campeche

Macuspana-Escárcega (Carretera Federal 186)

Tramo Tabasco

Km 48+000 – km 60+000 y km 293+000 al 297+000

Elemento	Intervención	Unidad	Ejecutado	Faltante	26/12/2025 al 01/01/2026	
			acumulado		Programado	Ejecutado
Riego de sello	265,193.53	m²	210,363.57	54,829.96	66,297.13	2,200.00
Obras complementarias	24.00	km	22.63	1.37	3.50	0.52
Señalamiento	26.40	km	5.40	21.00	4.10	2.20




2025
Año de
La Mujer
Indígena



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Macuspana - Escárcega

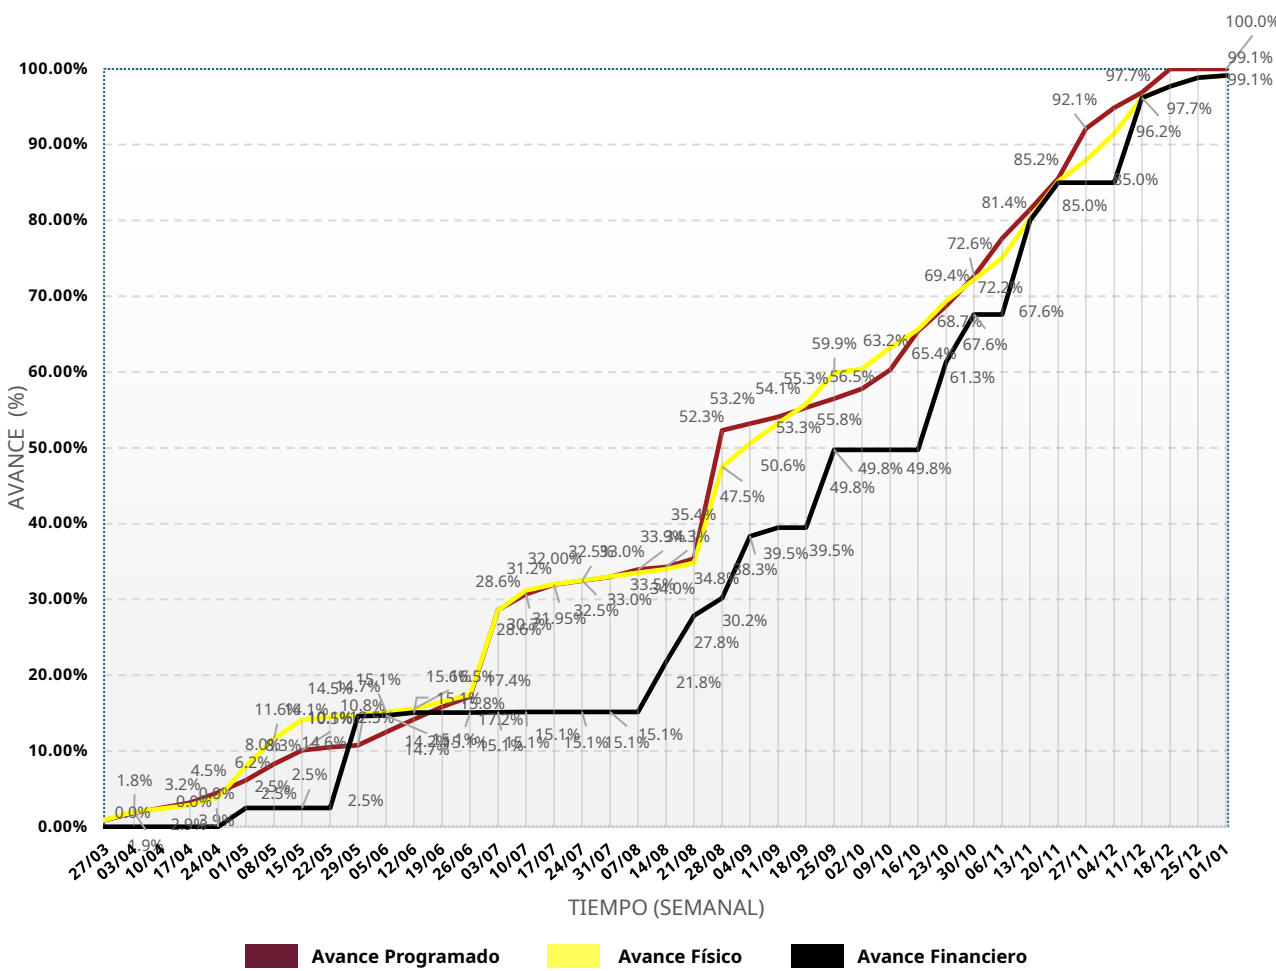

	19 de diciembre al 25 de diciembre	26 de diciembre al 01 de enero
Fuerza de Trabajo (personas)	472	399
Maquinaria	157	136
Frentes de trabajo	31	24
