



Guerrero - Puebla

Eje Cuautla – Tlapa

Ramal Igualapa – Chilixtlahuaca - Alacatlitzala

Avance global	• Programado: 12.41% • Real: 11.17%	Avance 2025	• Programado: 100.0% • Real: 100.0%	Avance 2026	• Programado: 15.00% • Real: 10.45%	• Semanal: 1.48% • Financiero: 5.26%	• Semanal: 0.00% • Financiero: 100.0%	• Semanal: 0.07% • Financiero: 3.10%
----------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	---	--	---

Inversión total 2025-2029: 13,652 mdp

- Morelos: 688 mdp
- Puebla: 7,525 mdp
- Guerrero: 5,440 mdp

Meta total 2025-2029: 393 km

- Morelos: 26 km
- Puebla: 159 km
- Guerrero: 208 km

Inversión 2025: 641.2 mdp

- Guerrero: 515.5 mdp
- Puebla: 125.7 mdp

Meta 2025: 33 km

- Guerrero: 30 km
- Puebla: 3 km

Inversión 2026: 3,148 mdp

- Guerrero: 750 mdp
- Puebla: 2,398 mdp

Meta 2026: 112 km

- Guerrero: 63 km
- Puebla: 49 km

Inicio meta 2026: 17 de febrero de 2026


Inicio: 16 de mayo 2025

Término: diciembre 2029

Termino meta 2025: marzo de 2026

40,956 empleos generados

7,750 habitantes beneficiados

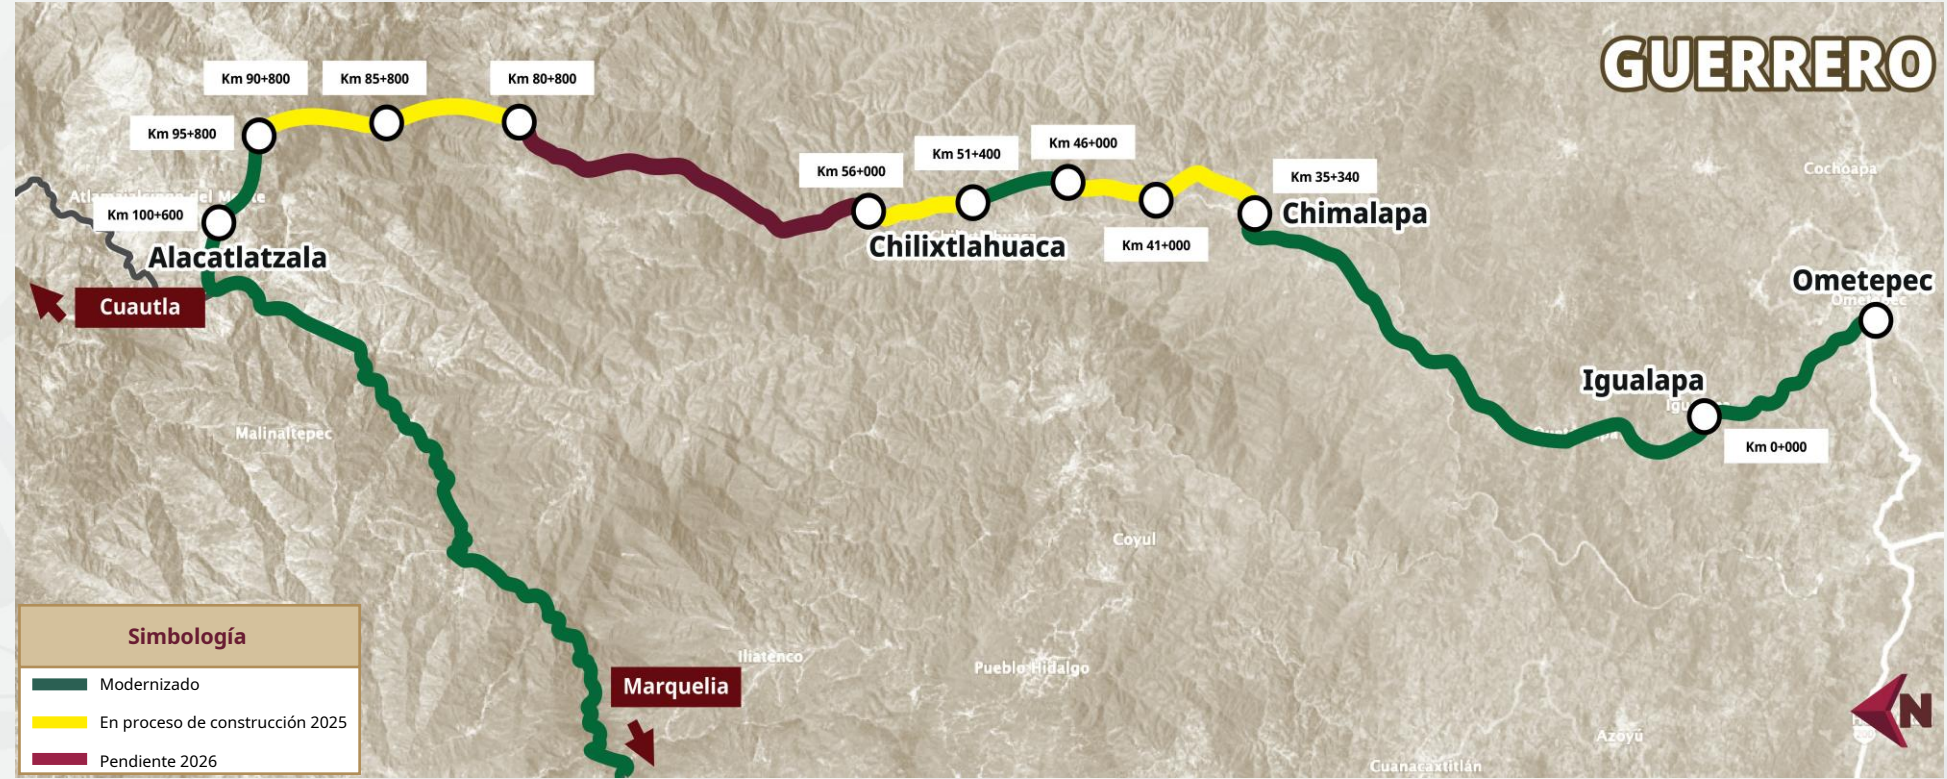

1 hora de ahorro en tiempo


Se beneficiará a una población de 7,750 habitantes de los municipios de Igualapa, Cochoapa el Grande, Metlatonoc y Malinaltepec, reduciendo tiempos de traslado.

Guerrero 2026

Eje Cuautla – Tlapa

Ramal Igualapa – Chilixtlahuaca - Alacatlatzala

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	01-05-26 al 07-05-26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Del km 56+000 – al km 61+000	5.0	1.98%	98.02%	0.70%	0.11%	
Del km 61+000 – al km 66+000	5.0	5.59%	94.41%	0.90%	0.24%	
Del km 66+000 – al km 71+000	5.0	0.33%	99.67%	1.0%	0.10%	
Del km 71+000 – al km 76+000	5.0	2.45%	97.55%	1.0%	0.45%	
Del km 76+000 – al km 81+000	5.0	0.55%	99.45%	1.1%	0.50%	

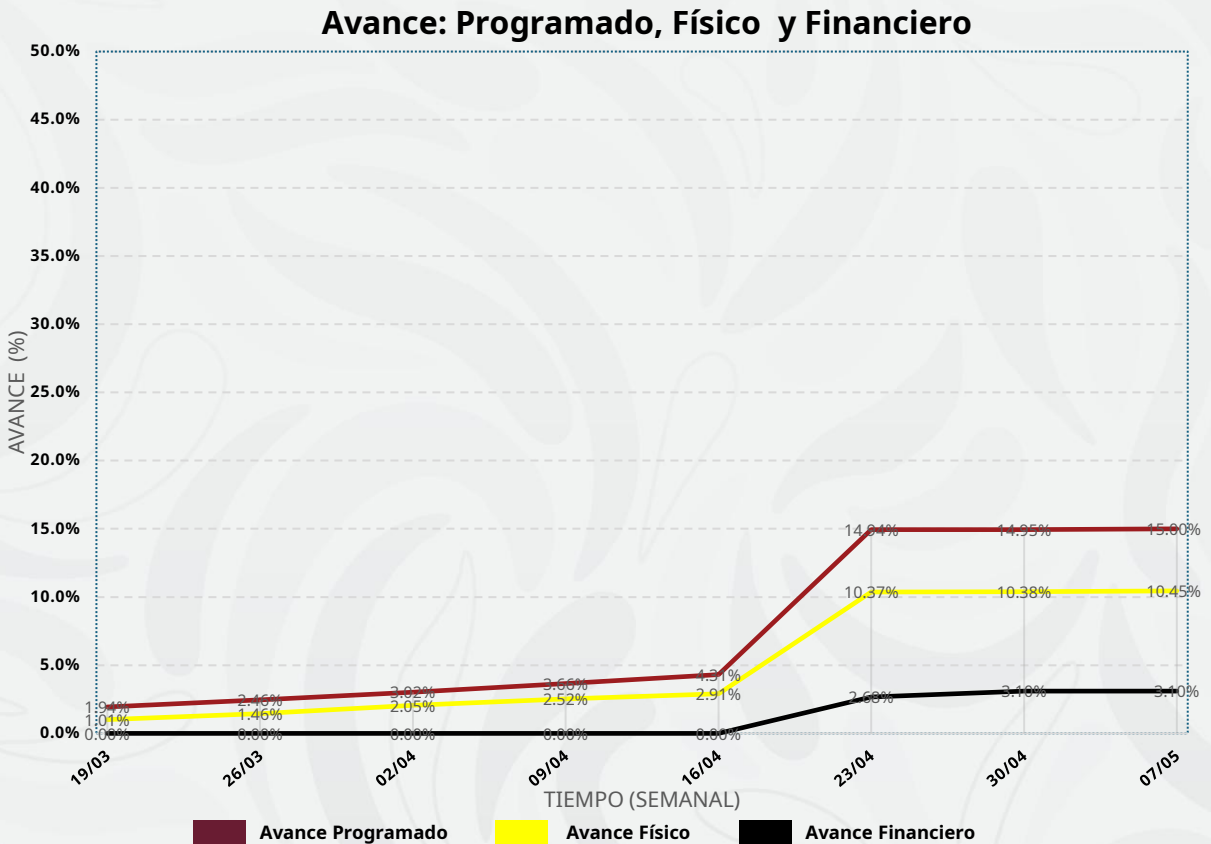

	Avance Programado	Avance Físico	Avance Financiero
	24 de abril al 30 de abril 2026		01 de mayo al 07 de mayo 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	95		95
Maquinaria	35		35
Frentes de trabajo	10		10
