



Toluca- Zihuatanejo

Toluca- Zihuatanejo (Carretera Federal 134)

Tramo Estado de México

Avance global

- Programado: 3.61%
- Real: 3.94%
- Semanal: 0.15%
- Financiero: 3.87%

Avance 2025

- Programado: 100%
- Real: 99.70%
- Semanal: 0.00%
- Financiero: 99.61%

Avance 2026**

- Programado: --%
- Real: 13.63%
- Semanal: 5.83%
- Financiero: 11.34%

Inversión total: 28,664 mdp

- Edo. Méx.: 7,488 mdp *
- Guerrero: 21,176 mdp

Meta total: 385 km

- Edo. Méx.: 87 km
- Guerrero: 298 km

Inversión 2025: 945 mdp *

- Edo. Méx.: 945 mdp *

Meta 2025: 12 km, 1 paso a desnivel, 1 puente y 3 entronques (Edo. Méx.)

Inversión 2026: 2,858 mdp *

- Edo. Méx.: 1,458 mdp *
- Guerrero: 1,400 mdp

Meta 2026: 46 km


- Edo. Méx.: 21 km
- Guerrero: 25 km

Inicio: 09-Mayo-2025
Término meta-2025: 31-Mayo-2026
Término meta-2026: Diciembre 2026
Término total: Diciembre 2030

Nota:

- De la inversión 2026, a la presente fecha se tienen autorizados 800 mdp, para la ejecución de los trabajos del km 25+000 al km 38+000 (13 km)
- De la asignación 2026 autorizada se consideran 87.57 mdp para el pago del Séptimo y Octavo Convenio Modificatorio correspondientes del km 13+000 al km 25+000.

* Redondeado ** Los avances corresponden al subtramo comprendido del km 25+000 al km 38+000 (13 km) Edo. Méx.

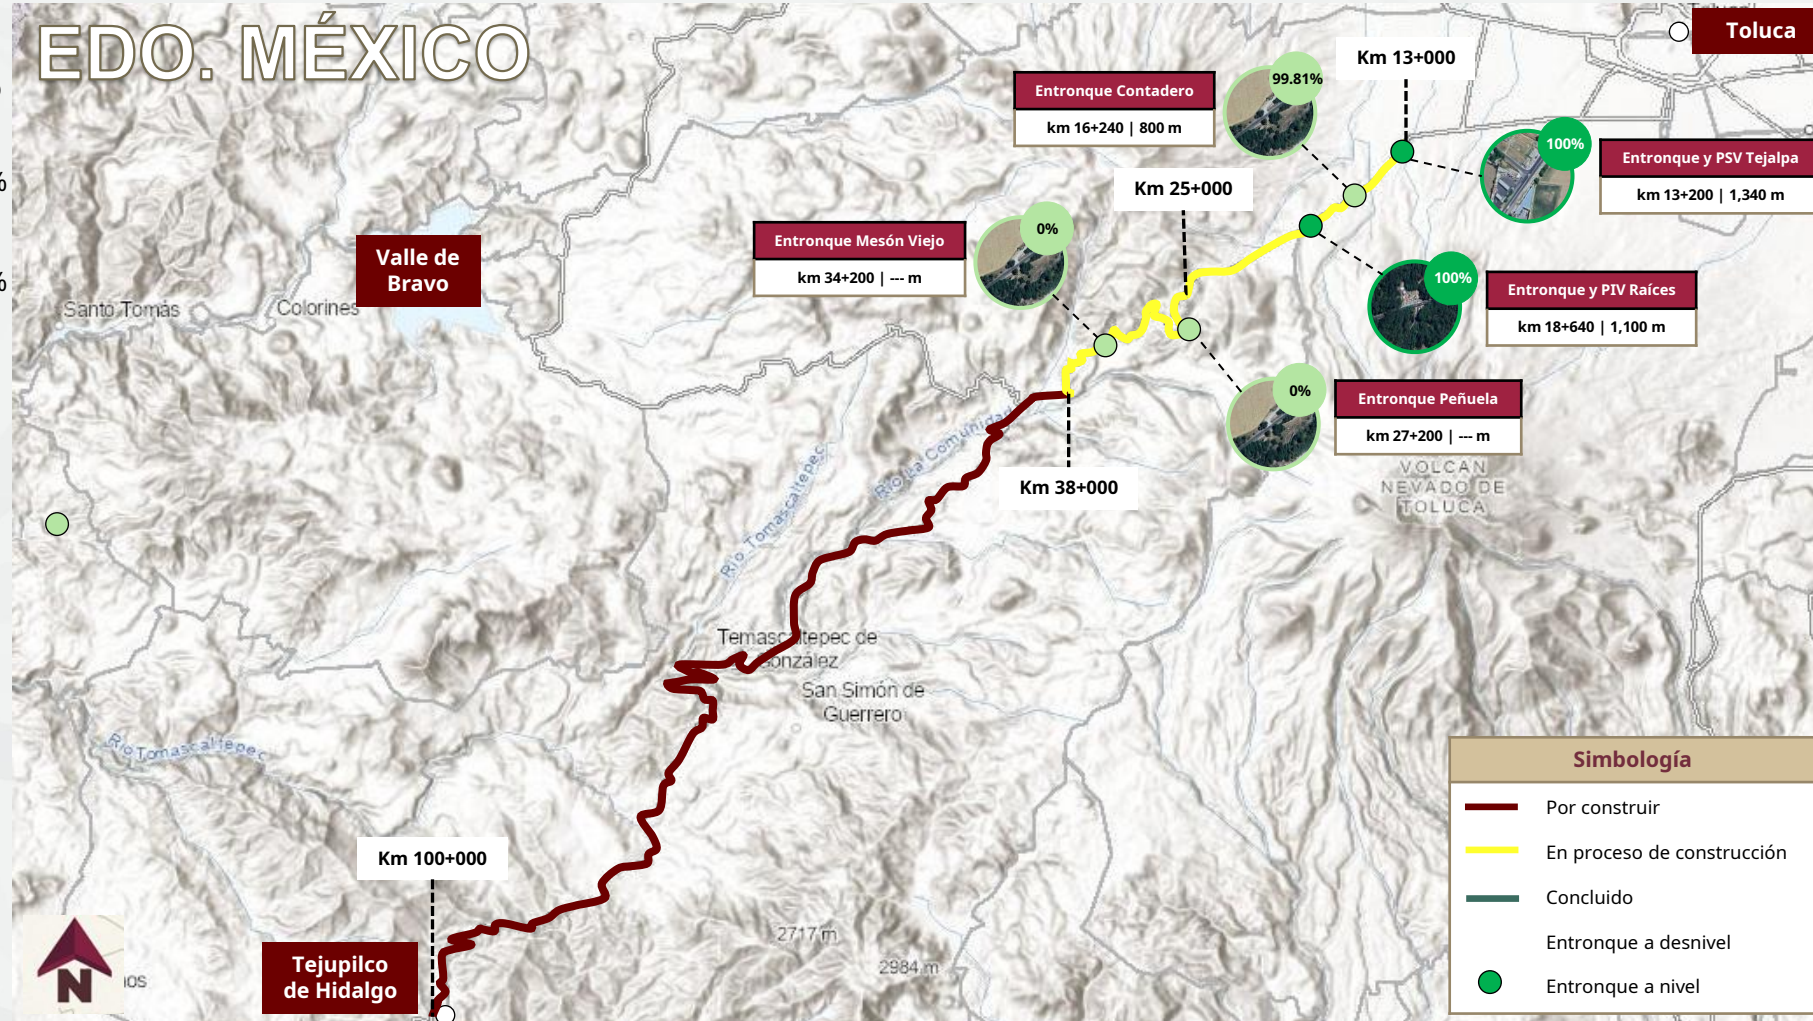

85,992 empleos generados



1 millón 480 mil habitantes beneficiados



2 horas 35 minutos de ahorro en tiempo

Beneficios Mejorar las condiciones de tránsito, reduciendo el riesgo de accidentes, así mismo se reducen los tiempos traslados, garantizando una mejor conectividad que contribuye al desarrollo económico y turístico del Centro - Poniente del país.


Toluca- Cd. Altamirano

Toluca- Zihuatanejo (Carretera Federal 134)

Km 13+000 – km 25+000

Elemento	Intervención Unidad		Ejecutado acumulado	Faltante	05/jun/26 al 11/jun/26	
					Programado	Ejecutado
Carpeta asfáltica	17,063.24	m³	15,453.81	1,609.43	-	0
Señalamiento Horizontal	52.75	Km	44.97	7.78	-	0
Señalamiento Vertical	699	Pzs	694	5	-	0

Nota: Se consideran solo los trabajos faltantes por concluir

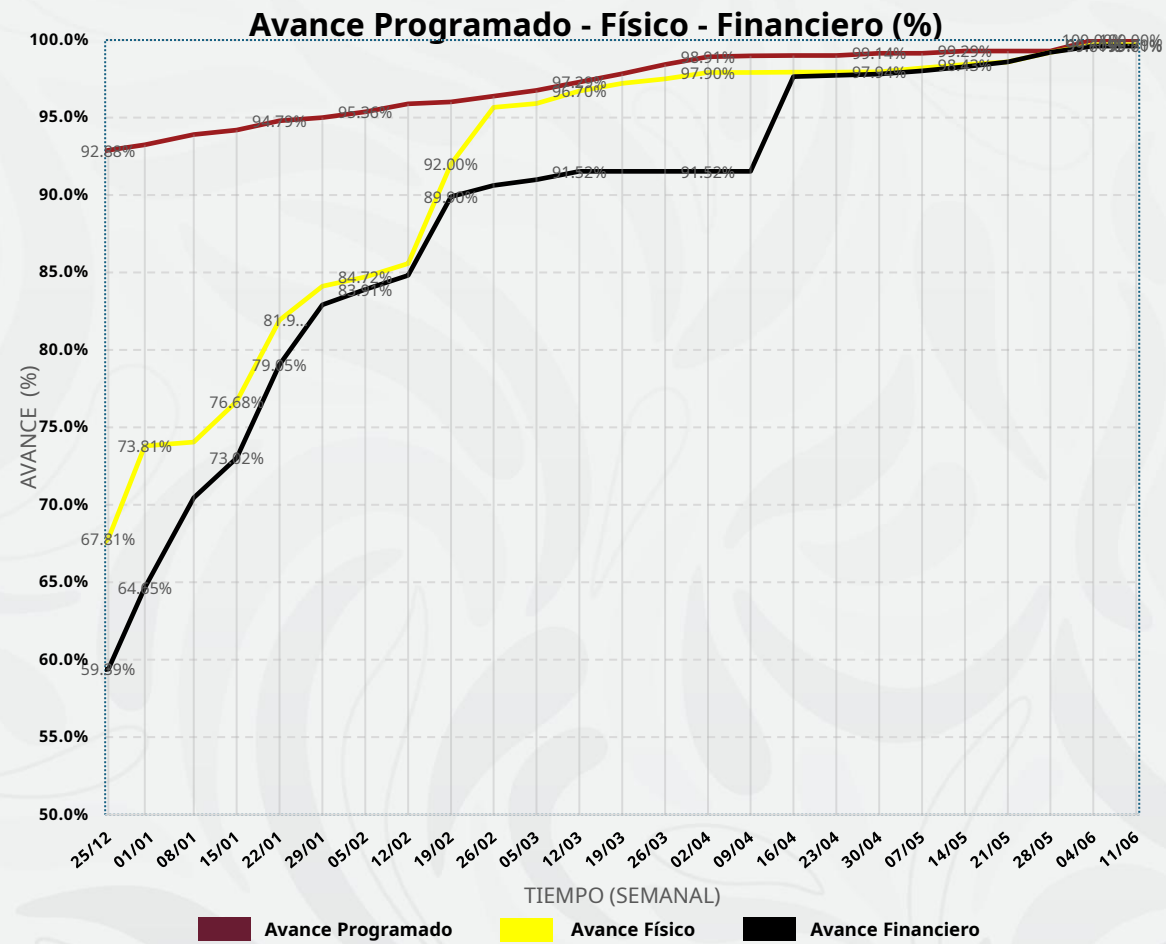

	Del 29 de mayo al 04 de junio de 2026	Del 05 al 11 de junio de 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	15	10
Maquinaria	4	2
Frentes de Trabajo	4	2

Toluca- Zihuatanejo

Toluca- Zihuatanejo (Carretera Federal 134)
Tramo Estado de México



Inversiones y metas 2025 - 2030

	2025		2026		PEF		FONADIN		VDG		2027		2028		2029		2030		Total	
	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta
Toluca - Zihuatanejo	945.2	12	2,857.4	46	757.4	13.0	0	0	2,100	33	7,700	108	7,700	108	7,724	111	1,737	0	28,663.6	385
Estado de México	945.2	12	1,457.4	21	757.4	13	-	-	700	8	1,600	18	1,600	18	1,576	18	309	-	7,487.6	87
Guerrero	-	-	1,400	25	-	-	-	-	1,400	25	6,100	90	6,100	90	6,148	93	1,428	-	21,176	298
