

Morelos – Puebla - Guerrero

Eje Cuautla – Tlapa

Cuautla – Tlapa y Ramal: Igualapa – Chilixtlahuaca - Alacatlitzala

ACTUALIZADA 22/06/2026



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance global	• Programado: 13.96%	• Semanal: 0.28%	Avance 2025	• Programado: 100.0%	• Semanal: 0.00%	Avance 2026	• Programado: 16.53%	• Semanal: 1.62%
	• Real: 12.73%	• Financiero: 3.43%		• Real: 100.0%	• Financiero: 100.0%		• Real: 9.30%	• Financiero: 7.45%



Totales

Inversión total 2025-2029: 21,936 mdp

- Morelos: 469.5 mdp
- Puebla: 14,188.3 mdp
- Guerrero: 7,278.3 mdp

Meta total 2025-2029: 311.8 km

- Morelos: 5.6 km
- Puebla: 177.1 km
- Guerrero: 129.1 km



2025

Inversión 2025: 641.2 mdp

- Guerrero: 515.5 mdp
- Puebla: 125.7 mdp

Meta 2025: 33.3 km

- Guerrero: 30.3 km
- Puebla: 3.0 km



2026

Inversión PEF 2026: 2,685.5 mdp

- Guerrero: 870.8 mdp
- Puebla: 1,814.7 mdp

Meta PEF 2026: 65.9 km

- Guerrero: 28.84 km
- Puebla: 37.1 km


Inversión VDG 2026: 1,414.1 mdp

- Morelos: 114.5 mdp
- Puebla: 1,001.9 mdp
- Guerrero: 297.7 mdp

Meta VDG 2026: 17.5 km

- Morelos: 1.4 km
- Puebla: 12.3 km
- Guerrero: 3.9 km

Inicio meta 2026: 17 de febrero 2026

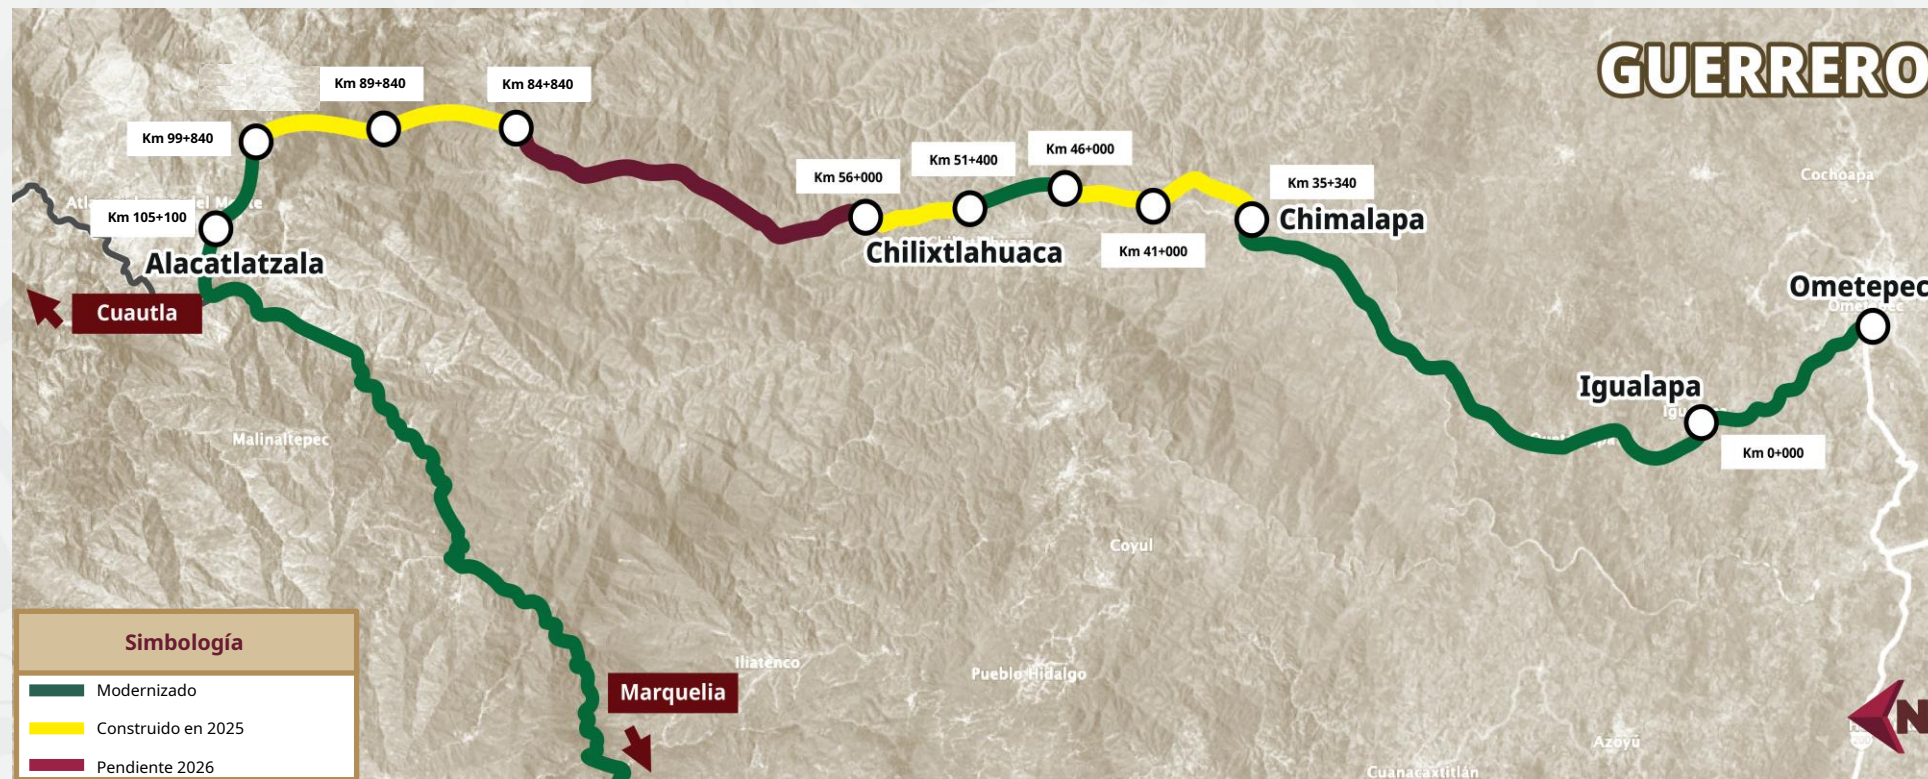

Inicio: 16 de mayo 2025
Término: diciembre 2029
Termino meta 2025: marzo de 2026



40,956 empleos generados



7,750 habitantes beneficiados



1 hora de ahorro en tiempo



Se beneficiará a una población de 7,750 habitantes de los municipios de Igualapa, Cochoapa el Grande, Metlatonoc y Malinaltepec, reduciendo tiempos de traslado.

Inversiones y metas 2025 - 2030

	2025		2026		PEF		VDG		2027		2028		2029		2030		Total	
	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta
Cuautla - Tlapa	641	33	4,100	83	2,685	66	1,414	18	5,117	64	5,117	64	5,314	67	1,648	0	21,936	312
Morelos	0	0	114	1	0	0	114	1	355	4	0	0	0	0	0	0	470	6
Puebla	126	3	2,817	49	1,815	37	1,002	12	3,056	38	3,411	42	3,673	45	1,106	0	14,188	177
Guerrero	516	30	1,168	33	871	29	298	4	1,706	22	1,706	22	1,640	21	543	0	7,278	129

Morelos – Puebla - Guerrero

Eje Cuautla – Tlapa

Cuautla – Tlapa y Ramal: Igualapa – Chilixtlahuaca - Alacatlitzala




Gobierno de
México

ACTUALIZADA 22/06/2026

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	12-06-26 al 18-06-26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Del km 56+000 – al km 61+000	5.0	15.43%	84.57%	4.69%	0.56%	
Del km 61+000 – al km 66+000	5.0	20.30%	79.70%	3.78%	2.0%	
Del km 66+000 – al km 71+000	5.0	16.63%	83.37%	3.92%	3.85%	
Del km 71+000 – al km 76+000	5.0	23.05%	76.95%	3.46%	3.19%	
Del km 76+000 – al km 81+000	5.0	6.44%	93.56%	1.52%	1.11%	
Del km 81+000 al km 84+840	3.87	5.78%	94.22%	1.58	5.61%	

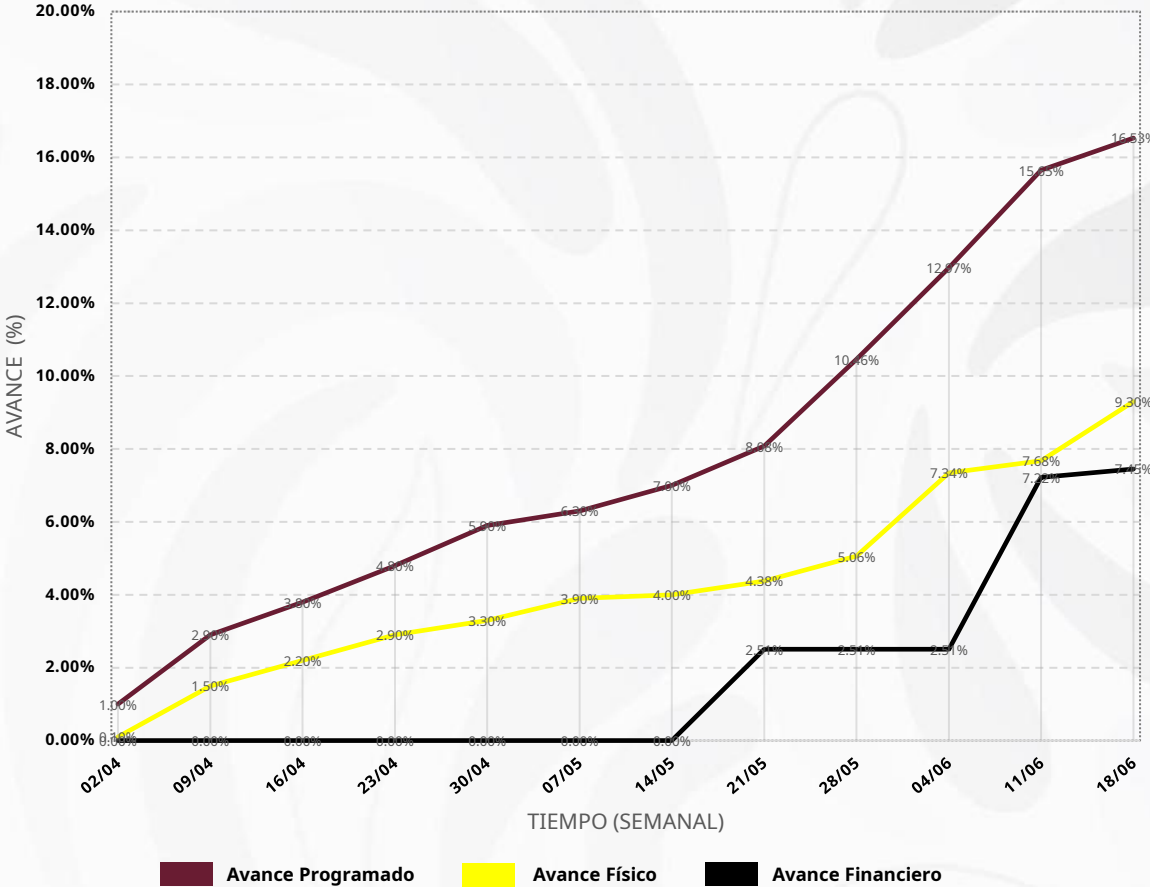

	05 de mayo al 11 de junio 2026	12 de mayo al 18 de junio 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	197	251
Maquinaria	57	65
Frentes de trabajo	20	20
