



San Luis Potosí - Hidalgo

Tamazunchale - Huejutla - Pachuca

Avance global

- Programado: 22.75%
- Real: 21.96%
- Semanal: 0.53%
- Financiero: 21.39%

Avance 2025

- Programado: 100%
- Real: 100%
- Semanal: 0.0%
- Financiero: 100%

Avance 2026

- Programado: 12.36%
- Real: 11.57%
- Semanal: 0.27%
- Financiero: 11.0%



Inversión total 2025-2028: 9,024 mdp

- Hidalgo: 5,446.6 mdp
- SLP: 3,577.0 mdp

Meta total 2025-2028: 158 km

Hidalgo:

- 131 km

San Luis Potosí:

- 27 km



Inversión 2025: 1,650 mdp

- Hidalgo: 821.7 mdp
- San Luis Potosí: 827.9 mdp

Meta 2025: 27 km

- Hidalgo: 17 km
- San Luis Potosí: 10 km



Inversión 2026: 2,550.4 mdp

- Hidalgo: 1,651.8 mdp
- San Luis Potosí: 898.6 mdp

Meta 2026: 37 km

- Hidalgo: 30 km
- San Luis Potosí: 7 km




Inicio : 28 de abril 2025

Término: diciembre 2030

Término meta 2025: 28 de febrero de 2026



20,022 empleos generados

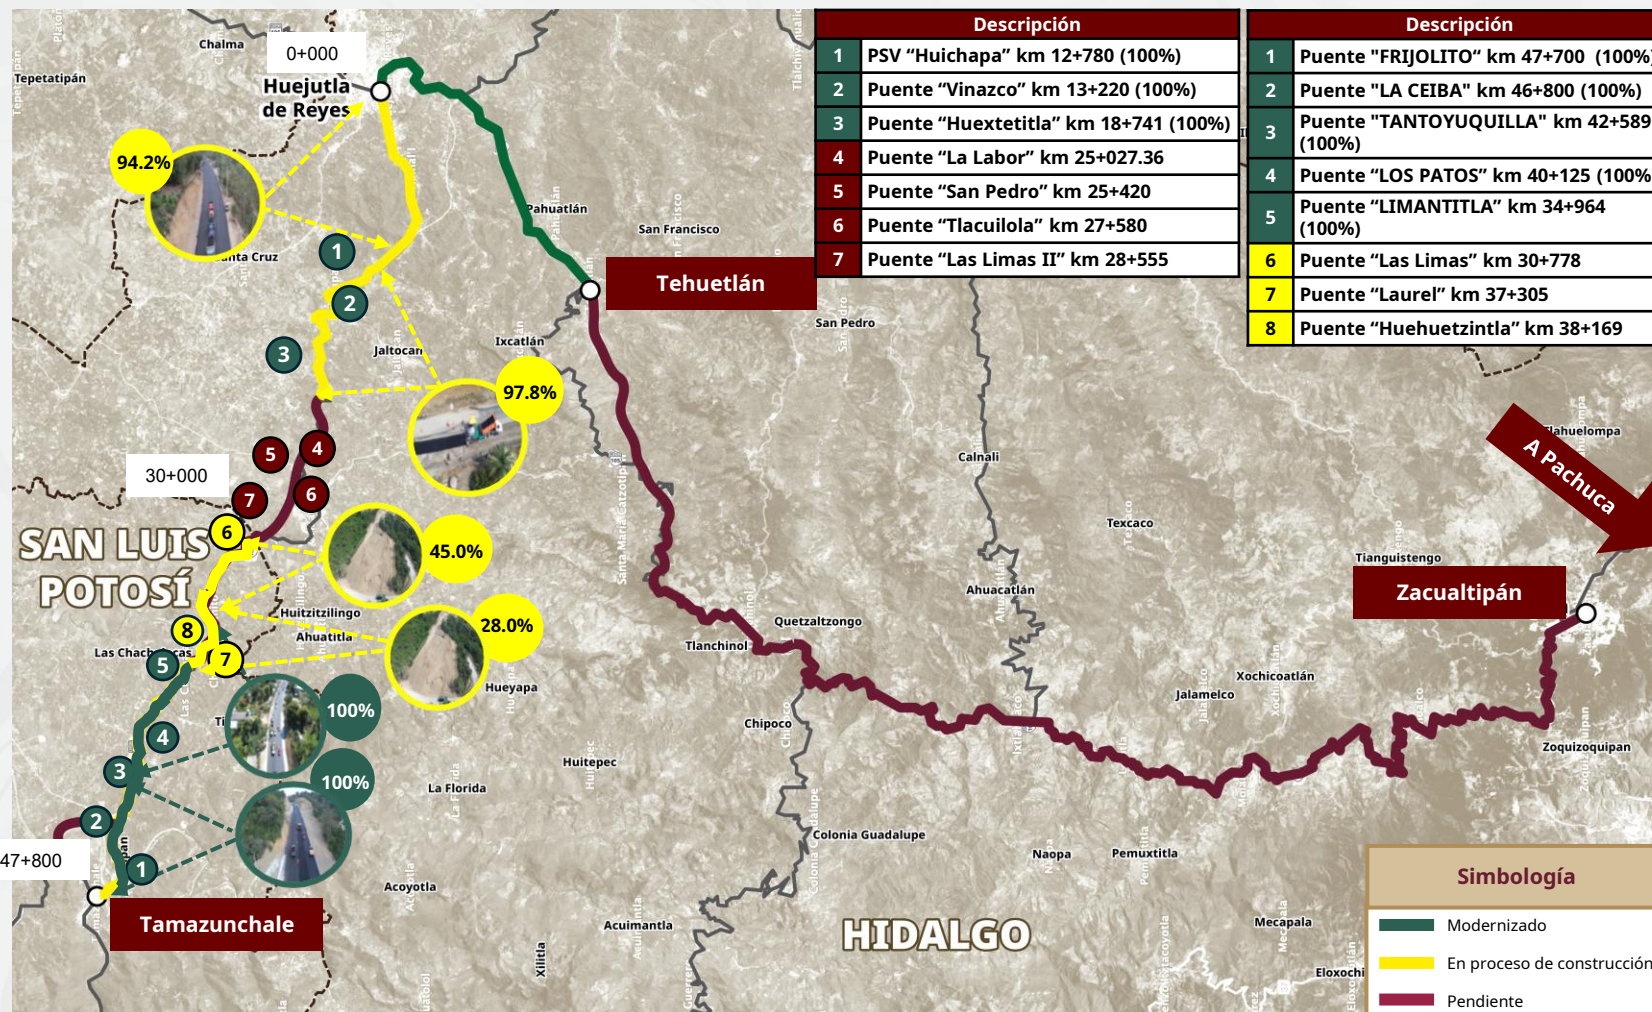

TDPA: 17,318 Veh/hr



+395 mil habitantes beneficiados en los municipios de Huejutla de Reyes, Jaltocán, Lolotla, Metztitlán, Molango de Escamilla, San Felipe Orizatlán, Tlanchinol, Xochicoatlán y Zacualtipán de Ángeles en Hidalgo y Tamazunchale, en San Luis Potosí.



65 min de ahorro en tiempo

Beneficios: Conecta de manera eficiente y segura el centro del país con la Sierra Hidalguense y la Huasteca Potosina.

San Luis Potosí - Hidalgo

Tamazunchale – Huejutla

ACTUALIZADA 22/06/2026



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes


Km 30+500 al Km 34+140

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 12/06/2026 al 18/06/2026		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
TERRACERÍAS								
Despalme	m³	24,896.0	15,864.0	63.72%	9,032.0	2,271.5	0.0	En proceso
Cortes	m³	376,161.0	126,822.0	33.71%	249,339.0	28,868.0	2,502.0	En proceso
Terraplenes 90%	m³	85,691.0	1,000.0	1.17%	84,691.0	5,712.7	0.0	En proceso
Pedraplen	m³	27,537.0	15,982.0	58.04%	11,555.0	2,503.4	0.0	En proceso
Subyacente	m³	39,813.0	15,680.0	39.38%	24,133.0	2,488.3	0.0	En proceso
Subrasante	m³	18,354.0	5,628.0	30.66%	12,726.0	1,079.0	0.0	En proceso
OBRAS DE DRENAJE								
Obras de drenaje	pza.	7	3.5	50.00%	3.5	0.5	0.0	En proceso
PAVIMENTOS								
Base hidráulica	m³	8,798.0	3,640.0	41.37%	5,158.0	628.4	0.0	En proceso
Base asfáltica	m³	5,083.0	1,526.0	30.02%	3,557.0	564.8	0.0	En proceso
Carpeta asfáltica	m³	3,307.0	0.0	0.00%	3,307.0	0.0	0.0	En proceso
Puentes	pza.	1.0	0.0	0.00%	1.0	0.0	0.0	Por iniciar
SEÑALAMIENTO								
Obra complementaria	km	3.6	0.0	0.00%	3.60	0.0	0.0	Por iniciar
Señalamiento definitivo	km	3.6	0.0	0.00%	3.60	0.0	0.0	Por iniciar

km 35+160 al km 38+820

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 12/06/2026 al 18/06/2026		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
TERRACERÍAS								
Despalme	m³	34,330.0	6,032.0	17.57%	28,298.0	2,288.7	0.0	En proceso
Cortes	m³	203,755.0	81,122.2	39.81%	122,632.8	11,845.8	6,987.6	En proceso
Terraplenes 90%	m³	78,664.0	20,492.8	26.05%	58,171.2	4,878.5	988.8	En proceso
Pedraplen	m³	33,734.0	24,254.0	71.90%	9,480.0	2,558.8	4,186.3	En proceso
Subyacente	m³	23,233.0	10,166.9	43.76%	13,066.1	2,323.0	1,857.1	En proceso
Subrasante	m³	16,228.0	4,454.3	27.45%	11,773.7	901.6	844.1	En proceso
OBRAS DE DRENAJE								
Obras de drenaje Tubería	pza.	12	4.5	37.50%	7.5	0.6	0.0	En proceso
PAVIMENTOS								
Base hidráulica	m³	7,895.0	1,484.5	18.80%	6,410.5	464.4	0.0	En proceso
Base asfáltica	m³	4,561.0	385.2	8.45%	4,175.8	325.8	0.0	En proceso
Carpeta asfáltica	m³	3,327.0	0.0	0.00%	3,327.0	0.0	0.0	En proceso
Puentes	pza.	2.0	0.0	0.00%	2.0	0.0	0.0	Por iniciar
SEÑALAMIENTO								
Obra complementaria	km	3.6	0.0	0.00%	3.60	0.0	0.0	Por iniciar
Señalamiento definitivo	km	3.6	0.0	0.00%	3.60	0.0	0.0	Por iniciar

Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Tamazunchale - Huejutla

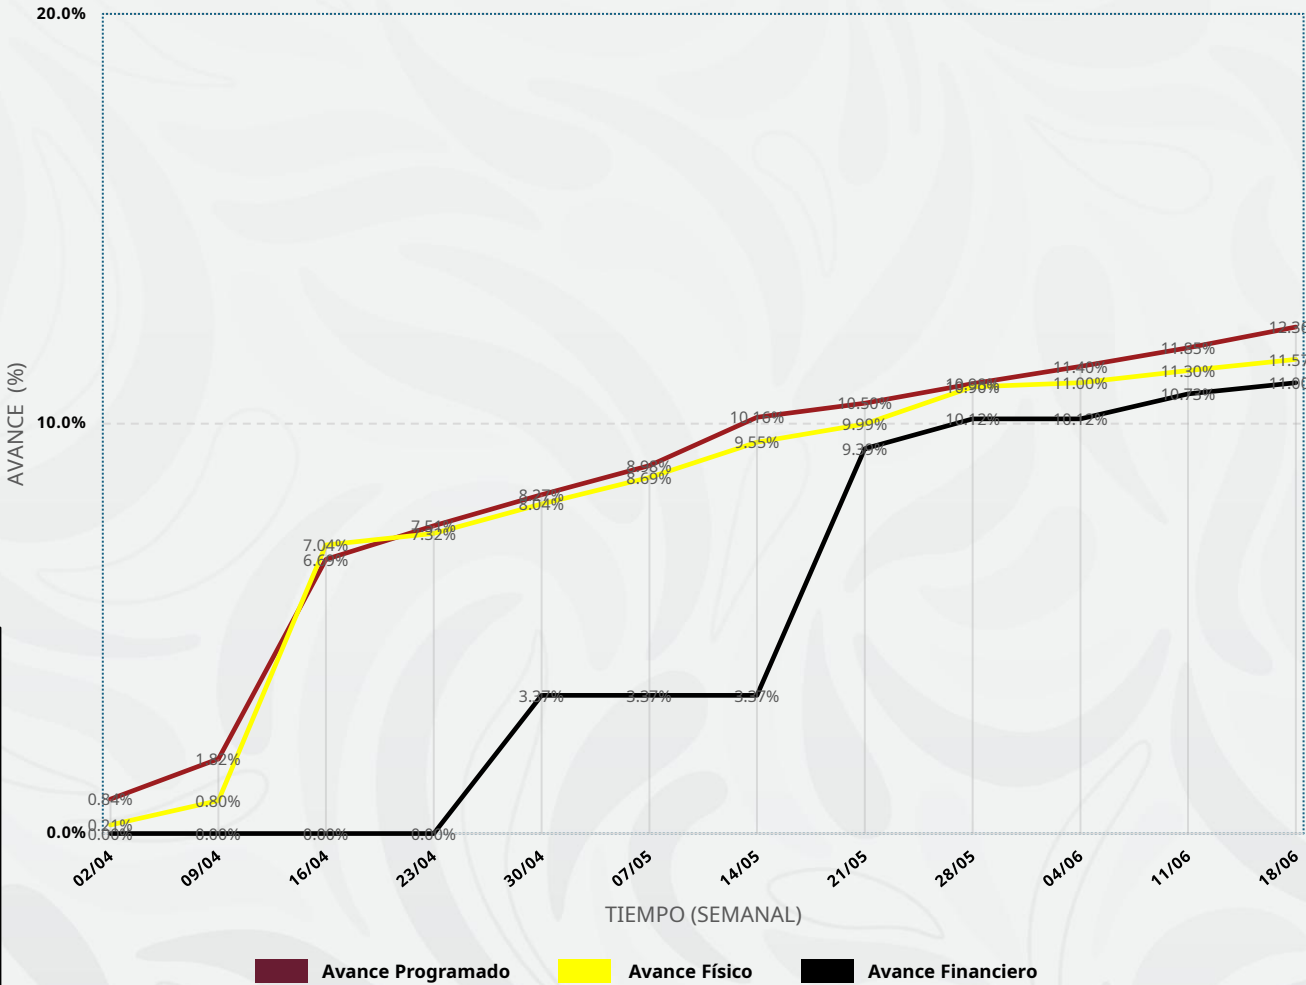

	05 de junio al 11 de junio	12 de junio al 18 de junio
Fuerza de Trabajo (personas)	257	236
Maquinaria	155	133
Frentes	22	24

Pachuca-Huejutla-Tamazunchale

Inversiones y Metas 2025 - 2030

	2025		2026		PEF		VDG		2027		2028		2029		2030		Total	
	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta
Pachuca-Huejutla-Tamazunchale	1,649.5	27	2,550.4	37	1,682.1	21	868.3	16	3,008.1	52	1,645.1	42	86.1	0	84.5	0	9,023.68	158
Hidalgo	821.7	17	1651.8	30	1093.6	-	558.2	-	1,612.6	48	1,206.3	36	77.5	-	76.8	-	5,446.6	131
San Luis Potosi	827.9	10	898.6	7	588.5	-	310.1	-	1,395.5	4	438.8	6	8.5	-	7.8	-	3,577.0	27
