



Tabasco-Campeche

Macuspana-Escárcega (Carretera Federal 186)

Del km 60+000 al km 86+000 y del km 287+000 al 293+000

Avance global

- Programado: 12.06%
- Real: 11.17%
- Semanal: 0.34%
- Financiero: 9.57%

Avance 2026

- Programado: 19.62%
- Real: 16.00%
- Semanal: 1.39%
- Financiero: 11.15%


Inversión total 2025-2029: 29,950.9mdp
 Tabasco: 4,910.4mdp | Campeche: 17,400.1 mdp | Chiapas: 7,640.4 mdp
Meta total 2025-2029: 249 km
 Tabasco • 44 km | Campeche • 143 km | Chiapas: 62 km

Inversión 2025: 1,429 MDP
 Tabasco: 1,145 mdp | Campeche: 284 mdp
Meta 2025:
 Tabasco: 12 km y 2 puentes | Campeche: 4 km y 2 entronques

Inversión total 2026: 6,225.3 MDP
 Tabasco: 3,227 mdp | Campeche: 2,363 mdp | Chiapas: 636 mdp
Meta total 2026: 54 km
 Tabasco: 28.5 km | Campeche: 20 km | Chiapas: 5.5 km

Inversión PEF 2026: 3,491.7 MDP
 Tabasco: 2,938.7 mdp | Campeche: 553 mdp
Meta PEF 2026: 32 km
 Tabasco: 26 km | Campeche: 6 km

Inversión VDG 2026: 2,733.6 MDP
 Tabasco: 288.4 mdp | Campeche: 1,809.5 mdp | Chiapas: 635.7 mdp
Meta PEF 2026: 22 km
 Tabasco: 2.5 km | Campeche: 14 km | Chiapas: 5.5 km

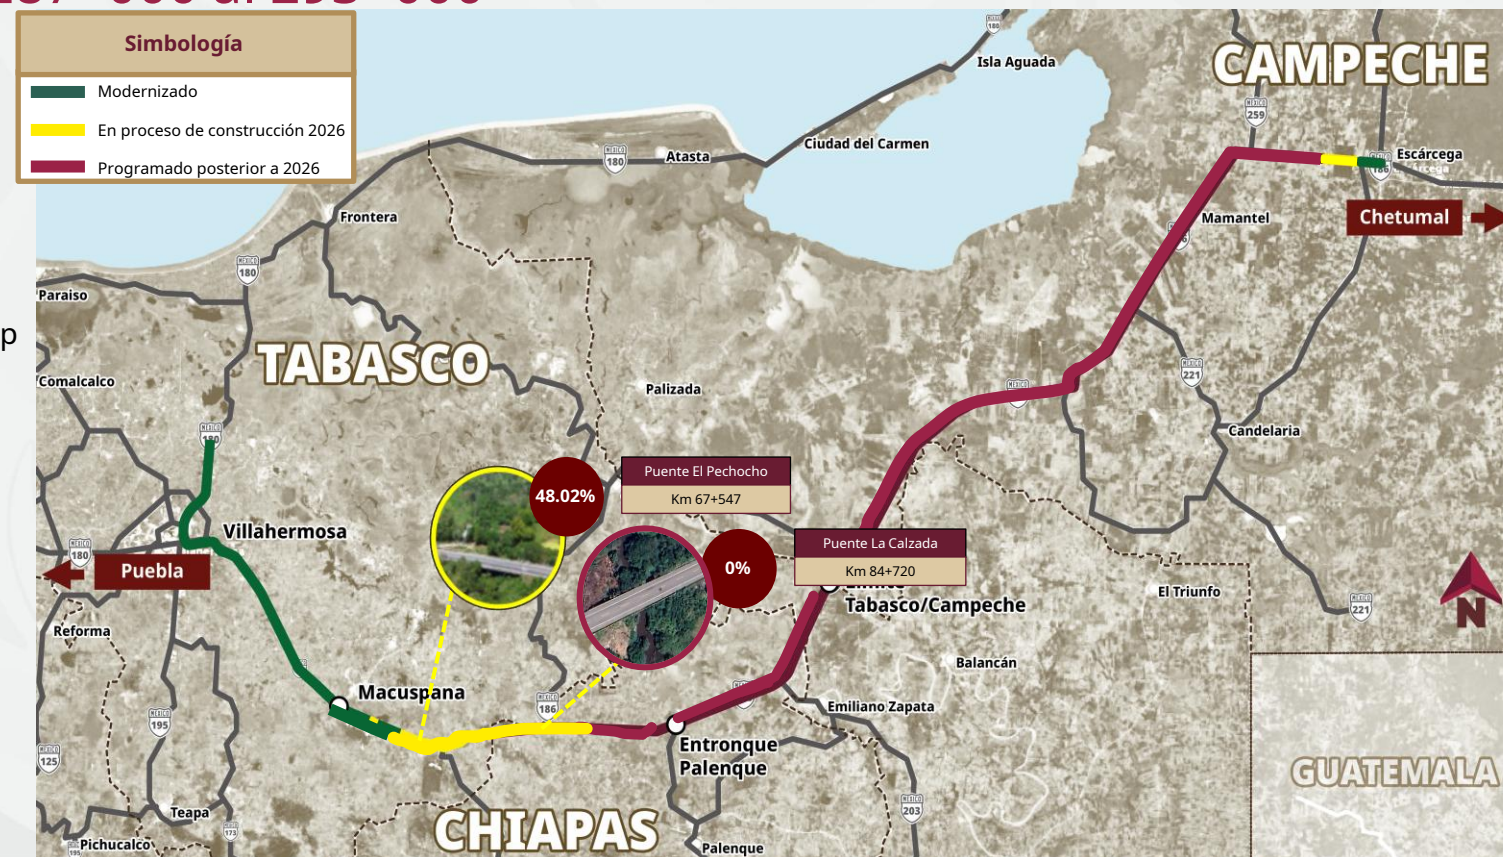

Inicio: 16 de marzo de 2025
Término: Diciembre 2030
Término meta 2026: 31 de diciembre de 2026

89,853 empleos generados

760 mil habitantes beneficiados

40 minutos de ahorro en tiempo

Beneficios Incrementaría la capacidad de la vía, mejora el nivel de servicio, reduce los costos de operación vehicular y los tiempos de recorrido de los usuarios, así como el riesgo de accidentes.

Tabasco-Campeche


Macuspana-Escárcega (Carretera Federal 186)

Del km 60+000 al km 86+000 y del km 287+000 al 293+000



Km 60+000 al km 86+000 y Km 287+000 al Km 293+000						
Elemento	Unidad	Intervención total	Ejecutado acumulado	Faltante	26/06/2026 al 02/07/2026 Programado	Ejecutado
Desmonte	ha	71.20	64.21	6.99	2.39	1.25
Despalme	m³	162,476.70	148,336.76	14,139.94	6,102.27	2,621.52
Escalones de liga	m³	32,005.29	14,550.75	17,454.54	1,080.24	440.00
Cortes	m³	414,403.47	332,409.54	81,993.93	20,903.34	11,949.36
Pedraplén	m³	322,585.30	242,591.95	79,993.35	16,522.52	7,462.62
Terraplén	m³	705,242.64	336,401.95	368,840.69	41,852.78	25,909.98
Subyacente	m³	349,477.94	138,245.70	211,232.24	20,220.11	10,457.00
Subrasante	m³	173,824.24	62,885.25	110,938.99	10,661.77	3,606.08
Base Hidráulica	m³	239,655.30	47,987.64	191,667.66	5,239.74	3,785.06
Base Asfáltica	m³	102,264.85	8,592.31	93,672.54	1,532.27	2,076.31
Carpeta Asfáltica	m³	83,172.17	0.00	83,172.17	0.00	0.00
Riego de sello	m²	673,185.24	0.00	673,185.24	0.00	0.00
Obras de drenaje	pzs	141.00	54.32	86.68	4.63	5.41
Obras complementarias	km	38.71	0.50	38.21	0.00	0.20
Barreras centrales	km	14.79	0.00	14.79	0.00	0.00
Señalamiento vertical y horizontal	km	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00

PSV “El Tortuguero” km 53+620, Puente “El Pechocho” y Puente “La Calzada”						
Elemento	Unidad	Intervención total	Ejecutado acumulado	Faltante	26/06/2026 al 02/07/2026 Programado	Ejecutado
Pilotes de 1.20 m de diámetro	pzs	107.00	44.00	63.00	1.00	0.00
Columnas de 1.20 m de diámetro	pzs	72.00	40.00	32.00	1.22	0.00
Cabezales	pzs	15.00	7.00	8.00	0.35	0.00
Fabricación de Traves AASHTO III, IV y VI	pzs	108.00	68.00	40.00	0.00	3.00
Transporte y montaje de Traves AASHTO III, IV y VI	pzs	108.00	56.00	52.00	0.00	0.00
Diafragmas	pzs	386.00	195.00	191.00	15.16	0.00
Losas de calzada	Claros	12.00	1.00	11.00	1.00	0.00
Guarnición	m	277.37	0.00	277.37	0.00	0.00
Parapeto metálico	m	470.66	0.00	470.66	0.00	0.00

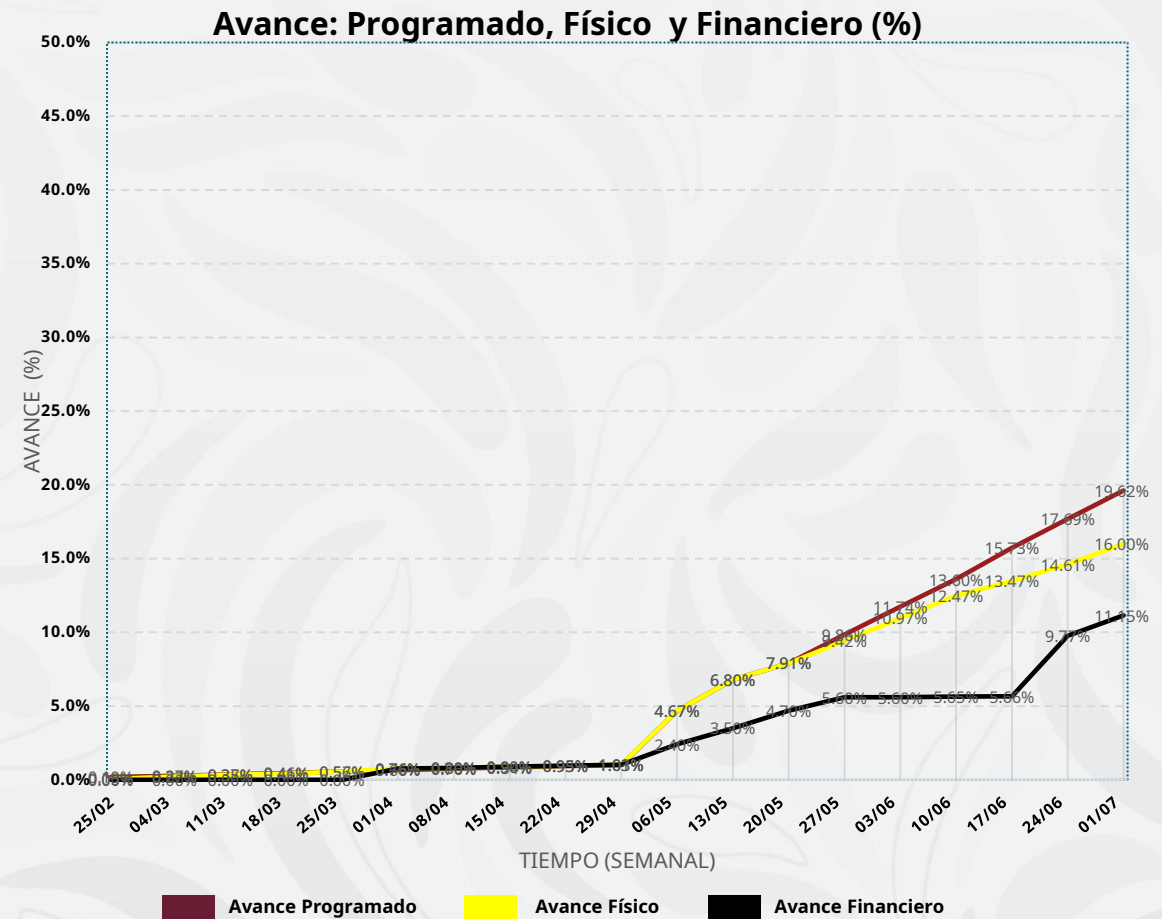

	19 al 25 de junio	26 de junio al 02 de julio
Fuerza de Trabajo (personas)	784	834
Maquinaria	301	327
Frentes de trabajo	54	61

Macuspana-Escárcega

Inversiones y Metas 2025 - 2030

	2025		2026		PEF		VDG		2027		2028		2029		2030		Total	
	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta
Macuspana-Escárcega	1,428.5	16	6,225.3	54	3,491.7	32	2,733.6	22	8,441.2	68	7,326.2	59	6,218.1	52	311.7	0	29,950.9	249
Tabasco	1,144.7	12	3,227	28.5	2,938.7	26	288.4	2.50	-	-	-	-	433	3.5	105	-	4,910.4	44
Chiapas	-	-	636	5.5	-	-	635.7	5.50	2,856	23	2,479	20	1,670	13.5	-	-	7,640.4	62
Campeche	283.8	4	2,363	20	553.0	6	1,809.5	14.0	5,585	45	4,848	39	4,114	35	206	-	17,400.1	143
