

Salina Cruz-Zihuatanejo (MEX-200)

Tramo Guerrero

Avance global	- Programado: 4.32% - Real: 4.06%	- Semanal: 0.06% - Financiero: 4.00%	Avance 2025	- Programado: 100.0% - Real: 99.69%	- Semanal: 0.16% - Financiero: 100.0%	Avance 2026 (Incluye VDG)	- Programado: 17.30% - Real: 15.88%	- Semanal: 5.27% - Financiero: 10.61%
----------------------	--	---	--------------------	--	--	----------------------------------	--	--



Descripción	
1	Puente Las Vigas Km 81+200 123 m
2	Puente Río Nexpa Km 85+300 425 m
3	Puente Agua Hedionda Km 106+760 21 m
4	Puente Copala Km 116+000 120 m
5	Puente Marquelia I Km 135+500 220 m
6	Puente Talapilla Km 171+857 41 m
7	Puente Río Quetzala Km 173+711 190 m
8	Puente Santa Catarina Km 184+744 101 m
9	Tramo 9 IG=km 209+500 AT – km 209+240 AD al km 219+540 10.30 km
10	Tramo 10 km 219+540 al km 229+600 10.06 km
11	Tramo 11 km 229+600 al km 234+843.77 5.24 km

Inversión total 2025-2029:
38,277.30 mdp

- Guerrero: 9,508.80 mdp
- Oaxaca: 28,768.50 mdp

Meta total 2025-2029: 446 km

- Guerrero: 103 km
- Oaxaca: 343 km

Inversión 2025:
1,606.0 mdp

- Guerrero: 724 mdp
- Oaxaca: 882 mdp

Meta 2025: 27 km

- Guerrero: 1 km
- Oaxaca: 26 km

Inversión 2026:
1,714 mdp

- Oaxaca: 1,504 mdp
- Guerrero: 210 mdp

Meta 2026: 10 km

- Guerrero: 2 km
- Oaxaca: 8 km

Inicio : 1 de abril de 2025
Termino: 31 de diciembre 2029
Término meta 2025: 15 de julio de 2026
Término meta 2026: 31 de diciembre de 2026

114,832 empleos generados

1,947,399 habitantes beneficiados

Beneficios: Reducción en tiempos de traslados de la Costa Chica de Gro. hacia Puerto Escondido Oax., reduciendo costos operativos e impulsando el turismo local y nacional de los municipios de Acapulco, San Marcos, Florencio Villareal, Cuajinicuilapa, Pinotepa Nacional, Villa de Tututepec, San Pedro Mixtepec, Pochutla y Huatulco.

Oaxaca/Guerrero

Salina Cruz-Zihuatanejo (MEX-200)



Elemento	Meta	Ejecutado Acumulable	Faltante	26-06-26 al 02-07-26	
				Programado	Ejecutado
Troncal	*13.58 km (2025) 12.02 km (2026)	*13.58 km 3.50 km	*0.0 km 8.52 km	0.0% 2.30%	0.0% 1.91%
8 puentes	8 pts	97.20% de 8 pts	2.80% de 8 pts	0.0%	0.28%

OBSERVACIONES

Oaxaca

Tramo 1 (9 frentes de trabajo)

Trabajos de excavación, armado y aplicación de impermeabilizante para su protección, en la alcantarilla tipo tubo de lámina de 2.74 m ø, de la obra de drenaje del km 209+300 LD. Y Se realizan trabajos de acostillado de la alcantarilla.

Tramo 2 (7 frente de trabajo)

Formación de capa de Base Hidráulica del km 219+820 al km 220+000, Excavación, afine, armado de acero estructural y colocación de concreto premezclado f'c= 250 km/cm2 de muro de contención del km 220+100 al km 220+240, Formación y compactación de terraplén al 100% del km 225+100 al km 226+320 cuerpo completo.

Tramo 3 (8 frentes de trabajo)

Construcción de muro Gavión ubicado en el km 231+663.68 LI en alero de ODD tipo bóveda de 4.00 x 4.00m aguas arriba, Formación y compactación de terraplén del km 231+720 al km 231+900 LD y Desmonte, despalme y demolición de construcciones en derecho de vía ubicado en el km 232+240 al km 232+460 LI.

Guerrero

Puente Las Vigas km 81+200:

Concluido.

Puente Agua Hedionda Km 106+760:

Concluido.

Puente Copala Km 116+000:

Concluido.

Puente Marquelia I km 135+500:

Concluido.

Puente Nexpa km 85+300:

Concluido.

Puente Talapilla km 171+857:

Concluido


Puente Río Quetzala Km 173+711:

Tendido de carpeta asfáltica, Habilitado de juntas de calzada, Cimbrado para colado de muro de contención y Fabricación y colocación de parapeto metálico segunda etapa.

Puente Santa Catarina km 183+740:

Habilitado y colado de lavaderos.

Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Salina Cruz - Zihuatanejo

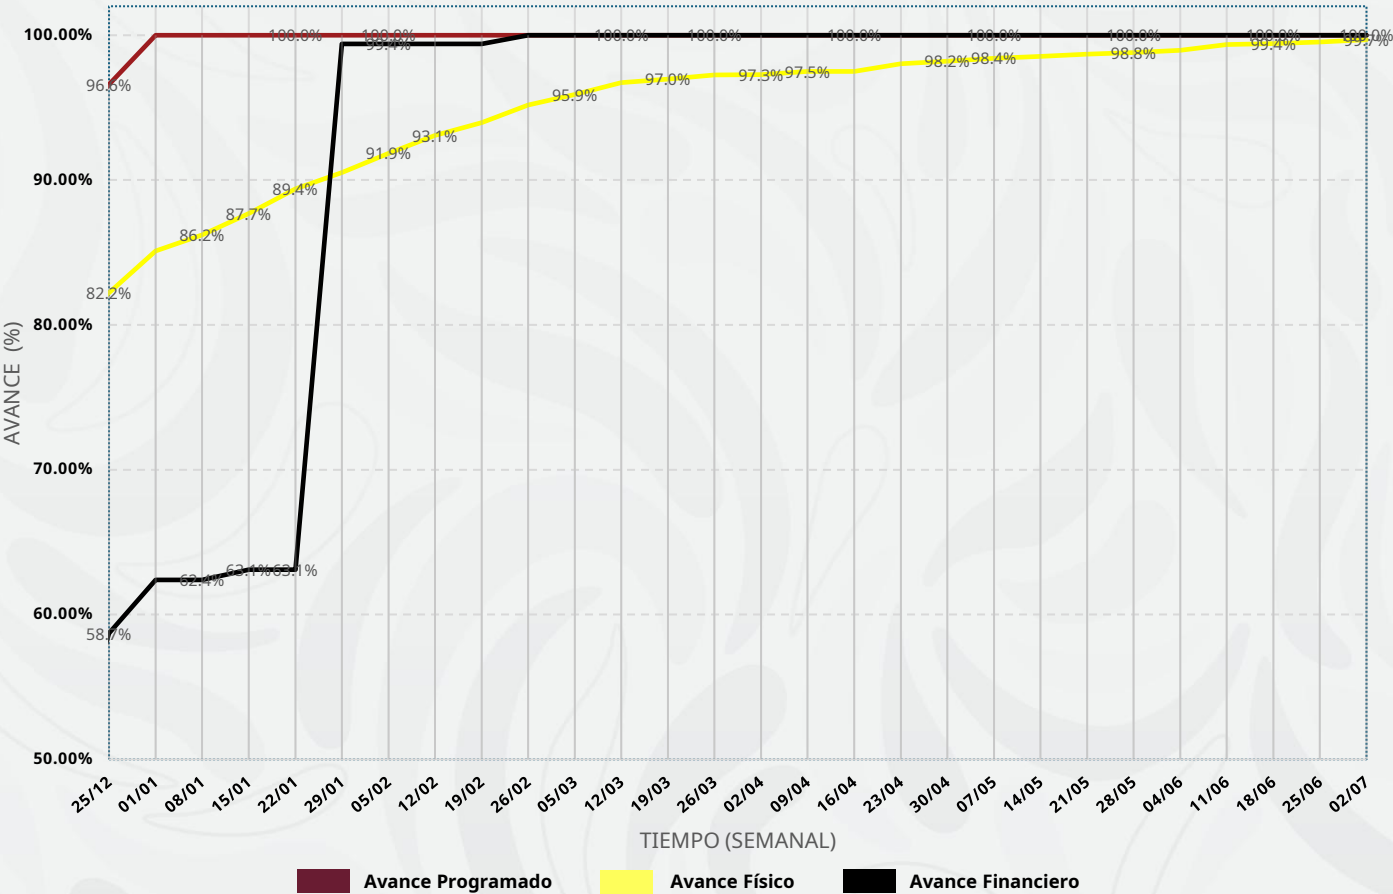

	19 de junio al 25 de junio 2026	26 de junio al 02 de julio 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	43	288
Maquinaria	5	86
Frentes	5	29

* 13.58 km se realizó un convenio en reducción de volúmenes del tramo I

Inversiones y Metas 2025 - 2030

	2025		2026		PEF		VDG		2027		2028		2029		2030		Total	
	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta
Salina Cruz-Zihuatanejo	1,606.3	27	1,714.3	10.0	861.5	1	852.8	9.0	13,516	161	10,853.7	130	9,937.3	118	649.8	0	38,277.4	446
Guerrero	723.9	1	210.7	2	1.4	-	209	2	3,315.3	39	2,662.3	32	2,437.5	29	159.4	-	9,509	103
Oaxaca	882.4	26	1,503.6	8	860.1	1	644	7	10,200.7	122	8,191.4	98	7,499.8	89	490.4	-	28,768	343
