



Toluca- Zihuatanejo

Toluca- Zihuatanejo (Carretera Federal 134)

Tramo Estado de México

Avance global

- Programado: 2.37%
- Real: 2.65%
- Semanal: 0.01%
- Financiero: 2.62%

Avance 2025

- Programado: 100%
- Real: 99.70%
- Semanal: 0.00%
- Financiero: 99.61%

Avance 2026

- Programado: --%
- Real: 3.22%
- Semanal: 0.15%
- Financiero: 2.87%

Inversión total: 43,507 mdp

- Edo. Méx.: 10,673 mdp
- Guerrero: 32,834 mdp

Meta total: 385 km

- Edo. Méx.: 87 km
- Guerrero: 298 km

Inversión 2025: 945 mdp

- Edo. Méx.: 945 mdp
- Meta 2025:** 12 km, 1 paso a desnivel, 1 puente y 3 entronques (Edo. Méx.)

Inversión 2026: 4,013.5 mdp


- Edo. Méx.: 1,842.8 mdp
 - Guerrero: 2,170.7 mdp
- Meta 2026:** 46.4 km
- Edo. Méx.: 20.9 km
 - Guerrero: 25.5 km

Inicio: 09-Mayo-2025

Término meta-2025: 15 - julio-2026

Término meta-2026: Diciembre 2026

Término total: Diciembre 2029

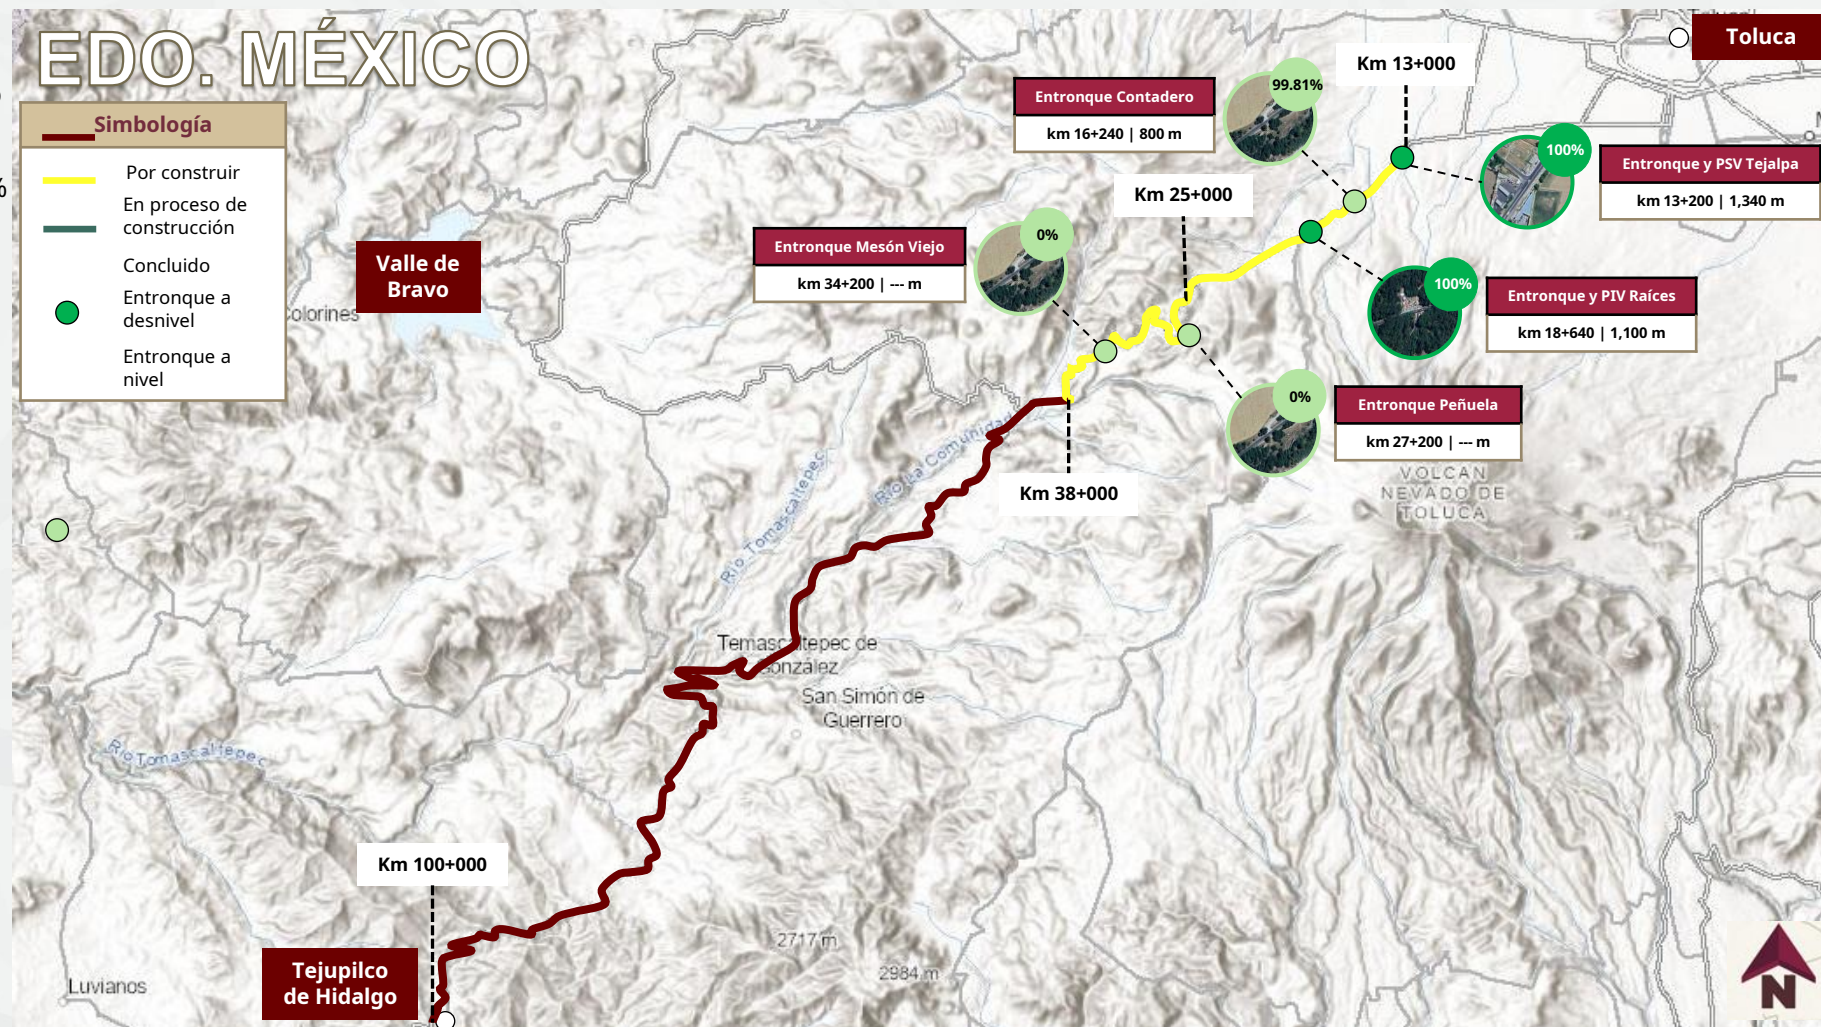

130,521 empleos generados



2 horas 35 minutos de ahorro en tiempo



1 millón 480 mil habitantes beneficiados

Beneficios Mejorar las condiciones de tránsito, reduciendo el riesgo de accidentes, así mismo se reducen los tiempos traslados, garantizando una mejor conectividad que contribuye al desarrollo económico y turístico del Centro - Poniente del país.

Nota:

- De la inversión 2026, a la fecha se tienen autorizados 757 mdp, para la ejecución de los trabajos del km 13+000 al km 25+000, que corresponden al convenio 2025 y del km 25+000 al km 38+000 que corresponden al convenio 2026.
- Así mismo, se tienen autorizados 43 mdp para servicios ambientales y supervisión

Toluca- Cd. Altamirano

Toluca- Zihuatanejo (Carretera Federal 134)


Km 13+000 – km 25+000

Elemento	Intervención	Unidad	Ejecutado acumulado	Faltante	26/jun/26 al 02/jul/26	
					Programado	Ejecutado
Carpeta asfáltica	17,063.24	m³	15,453.81	1,609.43	-	0
Señalamiento Horizontal	52.75	Km	44.97	7.78	-	0
Señalamiento Vertical	699	Pzs	694	5	-	0

Nota: Se consideran solo los trabajos faltantes por concluir



Avance Programado - Físico - Financiero (%)

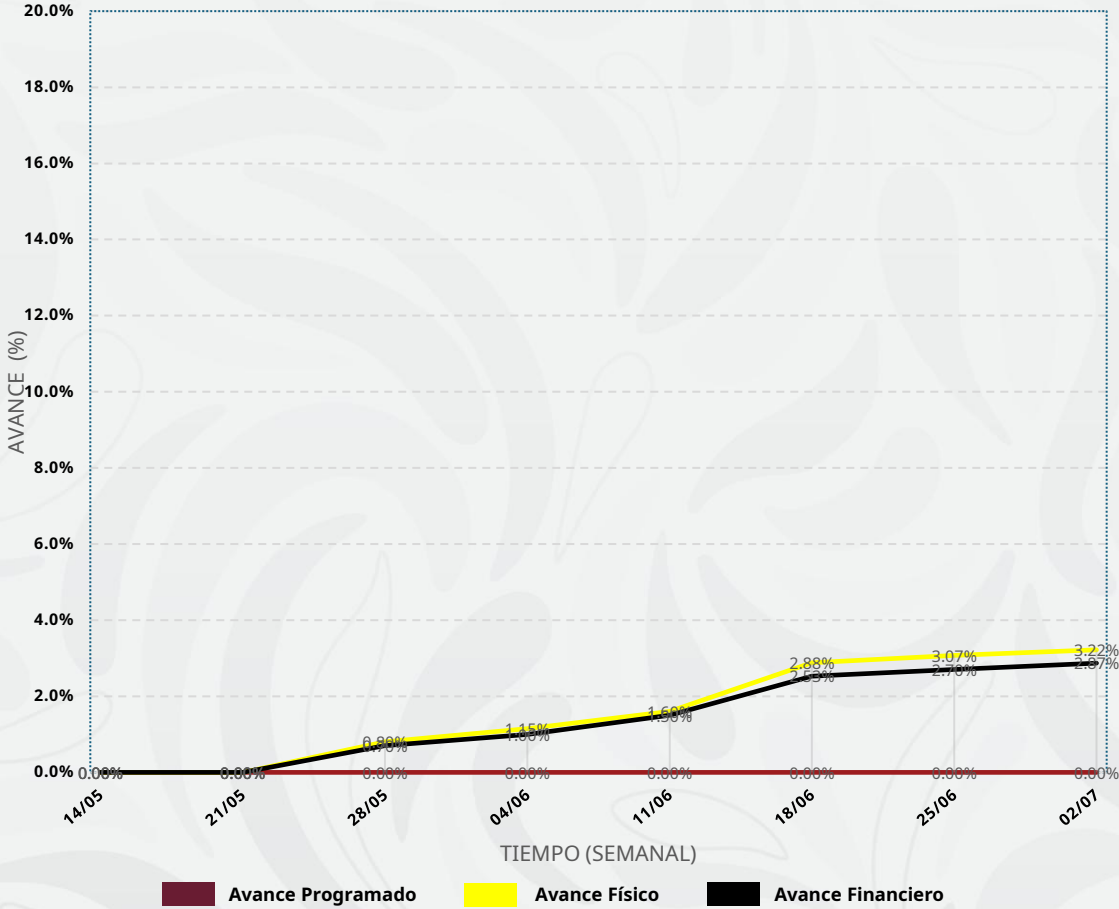

	Del 19 al 25 de junio de 2026	Del 26 de junio al 02 de julio de 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	10	10
Maquinaria	2	2
Frentes de Trabajo	2	2

Inversiones y metas 2025 - 2030

	2025		2026		PEF		VDG		2027		2028		2029		2030		Total	
	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta
Toluca - Zihuatanejo	945	12.0	4,013.5	46.4	757	13.0	3,256	33.4	11,939	108.0	11,939	108.0	11,976	110.6	2,693	0	43,507	385
Estado de México	945	12.0	1,842.8	20.9	757	13.0	1,085	7.9	2,481	18.1	2,481	18.1	2,444	17.8	479	-	10,673	87.0
Guerrero	-	-	2,170.7	25.5	-	-	2,171	25.5	9,458	89.9	9,458	89.9	9,533	92.8	2,214	-	32,834	298.0
