

Guerrero - Puebla

Eje Cuautla – Tlapa

Ramal Igualapa – Chilixtlahuaca - Alacatlalzala

Avance global	• Programado: 10.12%	• Semanal: 0.01%	Avance 2025	• Programado: 100.0%	• Semanal: 0.00%	Avance 2026	• Programado: 14.95%	• Semanal: 0.01%
	• Real: 9.69%	• Financiero: 5.26%		• Real: 100.0%	• Financiero: 100.0%		• Real: 10.38%	• Financiero: 3.10%

Inversión total 2025-2029: 13,652 mdp

- Morelos: 688 mdp
- Puebla: 7,525 mdp
- Guerrero: 5,440 mdp

Meta total 2025-2029: 393 km

- Morelos: 26 km
- Puebla: 159 km
- Guerrero: 208 km

Inversión 2025: 641.2 mdp

- Guerrero: 515.5 mdp
- Puebla: 125.7 mdp

Meta 2025: 33 km

- Guerrero: 30 km
- Puebla: 3 km

Inversión 2026: 3,148 mdp

- Guerrero: 750 mdp
- Puebla: 2,398 mdp

Meta 2026: 112 km

- Guerrero: 63 km
- Puebla: 49 km

Inicio meta 2026: 17 de febrero de 2026


Inicio: 16 de mayo 2025

Término: diciembre 2029

Termino meta 2025: marzo de 2026

40,956 empleos generados

7,750 habitantes beneficiados

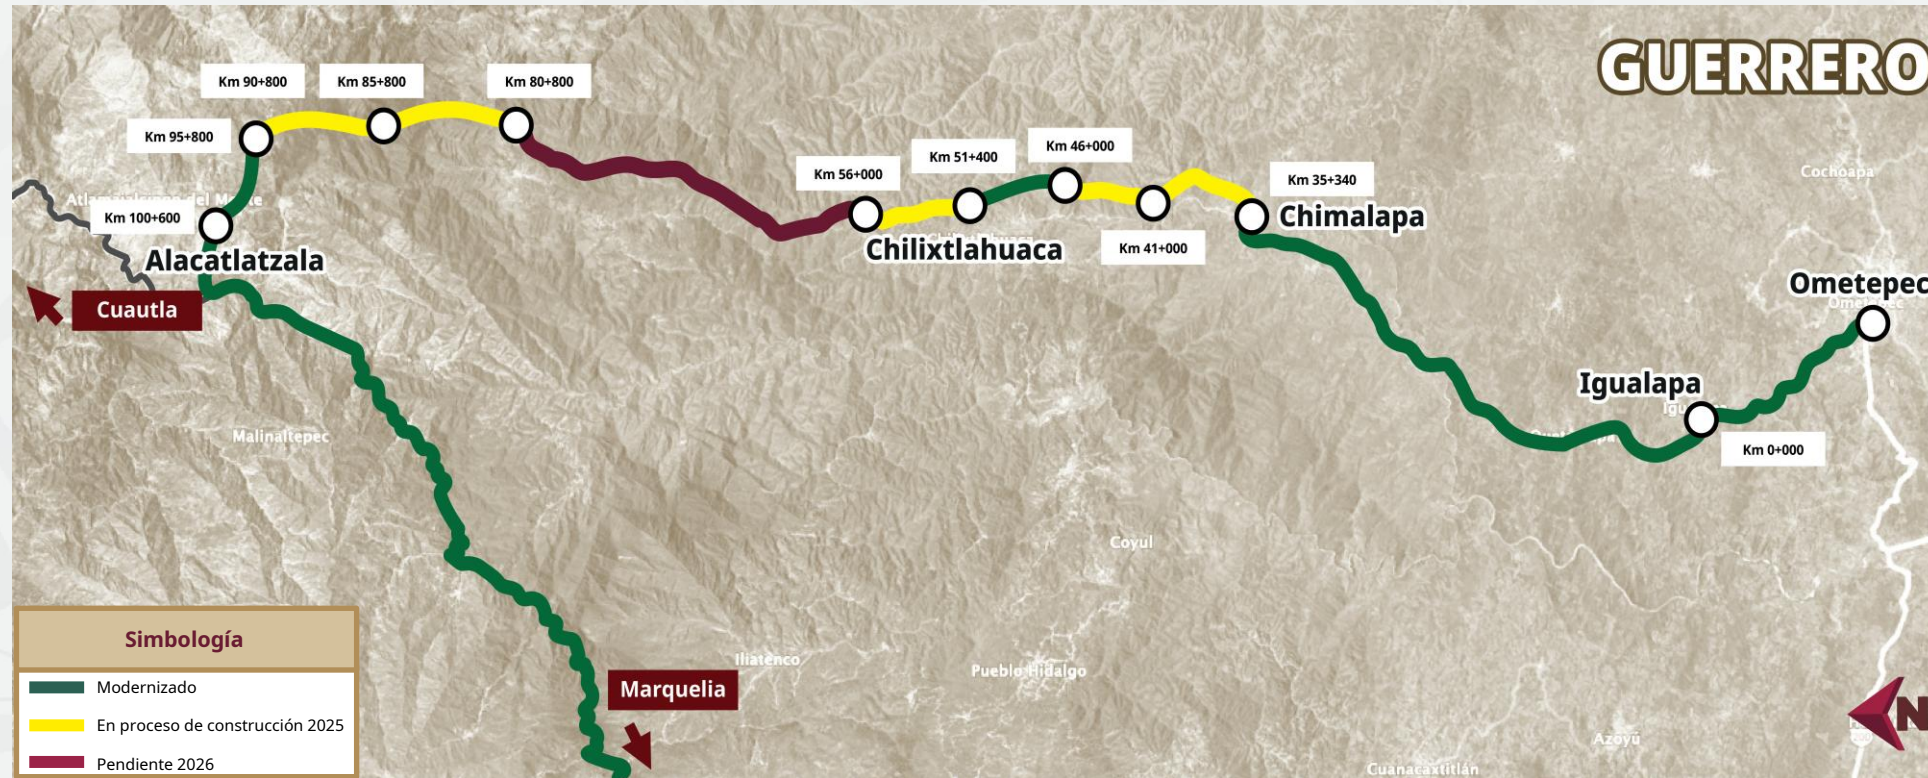

1 hora de ahorro en tiempo


Se beneficiará a una población de 7,750 habitantes de los municipios de Igualapa, Cochoapa el Grande, Metlatonoc y Malinaltepec, reduciendo tiempos de traslado.

Guerrero 2026

Eje Cuautla – Tlapa

Ramal Igualapa – Chilixtlahuaca - Alacatlatzala

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	24-04-26 al 30-04-26	
				Programado	Ejecutado
Del km 56+000 – al km 61+000	5.0	1.87%	98.13%	0.80%	0.47%
Del km 61+000 – al km 66+000	5.0	5.35%	94.65%	1.45%	1.30%
Del km 66+000 – al km 71+000	5.0	0.23%	99.77%	1.23%	0.08%
Del km 71+000 – al km 76+000	5.0	2.0%	98.00%	1.50%	0.50%
Del km 76+000 – al km 81+000	5.0	0.05%	99.05%	1.26%	0.05%

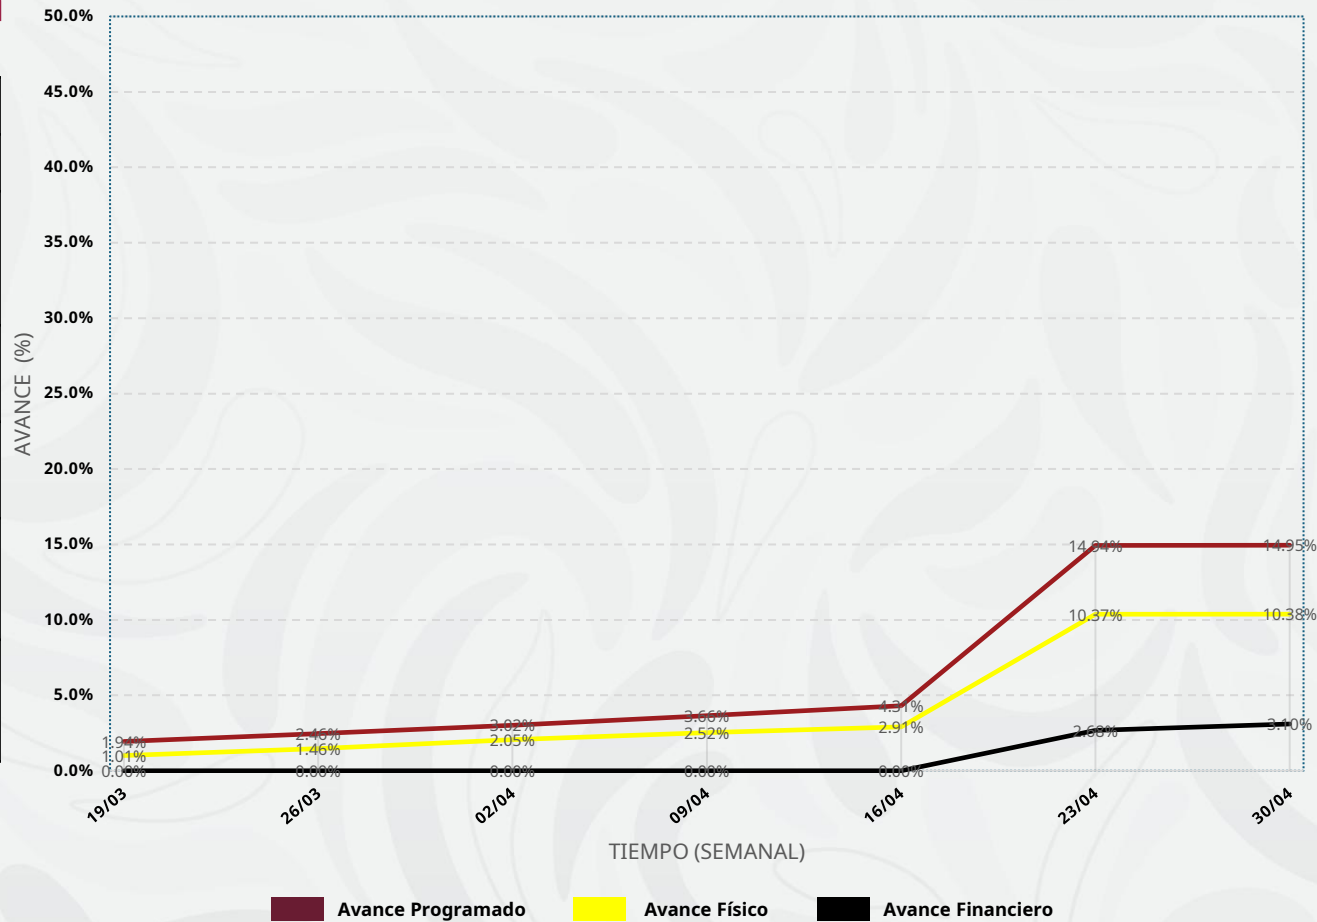

	17 de abril al 23 de abril 2026	24 de abril al 30 de abril 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	85	95
Maquinaria	33	35
Frentes de trabajo	8	10
