

# Tabasco-Campeche

## Macuspana-Escárcega (Carretera Federal 186)

### Tramo Tabasco



**Avance global**

- Programado: 6.93%
- Real: 6.93%
- Semanal: 0.01%
- Financiero: 6.93%

**Avance 2026**

- Programado: 1.01%
- Real: 1.03%
- Semanal: 0.08%
- Financiero: 1.03%



**Inversión total 2025-2028:** 21,047 mdp

- **Tabasco:** 8,335 mdp
- **Campeche:** 11,483 mdp
- **Chiapas:** 1,229 mdp

**Meta total 2025-2028:** | 249 km |

**Ampliación a 22 m (A4)**

Tabasco • 92 km | Chiapas • 14 km | Campeche • 143 km



**Inversión 2025:** 1,429 MDP

- **Tabasco:** 1,145 mdp
- **Campeche:** 284 mdp

**Meta 2025:**

- **Tabasco:** 12 km y 2 puentes
- **Campeche:** 4 km y 2 entronques



**Inversión 2026:** 3,749 MDP

- **Tabasco:** 3,109 mdp
- **Campeche:** 640 mdp

**Meta 2026:**

- **Tabasco:** 26 km, 1 PSV y 2 puentes
- **Campeche:** 6 km



**Inicio:** 16 de marzo de 2025

**Término:** Diciembre 2029

**Término meta 2025:** 28 de febrero de 2026



**63,141** empleos generados



**760 mil** habitantes beneficiados



**40 minutos** de ahorro en tiempo

**Beneficios** Incrementaría la capacidad de la vía, mejora el nivel de servicio, reduce los costos de operación vehicular y los tiempos de recorrido de los usuarios, así como el riesgo de accidentes.

# Tabasco-Campeche


## Macuspana-Escárcega (Carretera Federal 186)

### Tramo Tabasco

| Elemento                                                            | Unidad | Intervención total | Ejecutado  | Faltante   | 24/04/2026 al 30/04/2026 |           |
|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|------------|------------|--------------------------|-----------|
|                                                                     |        |                    | acumulado  |            | Programado               | Ejecutado |
| Desmonte                                                            | ha     | 27.92              | 26.79      | 1.13       | 2.18                     | 0.66      |
| Despalme                                                            | m³     | 115,589.04         | 106,341.36 | 9,247.68   | 11,453.30                | 2,142.53  |
| Escalones de Liga                                                   | m³     | 20,122.39          | 17,714.07  | 2,408.32   | 2,137.10                 | 665.05    |
| Cortes                                                              | m³     | 114,909.49         | 72,502.22  | 42,407.27  | 14,903.35                | 1,538.71  |
| Pedraplén                                                           | m³     | 151,364.26         | 124,512.44 | 26,851.82  | 13,128.09                | 6,634.80  |
| Geotextil                                                           | m²     | 159,125.66         | 92,083.65  | 67,042.01  | 10,279.43                | 6,595.59  |
| Geomalla                                                            | m²     | 173,510.17         | 105,460.78 | 68,049.39  | 7,404.66                 | 5,552.03  |
| Terraplén                                                           | m³     | 320,776.23         | 163,924.34 | 156,851.89 | 6,447.77                 | 24,025.08 |
| Subyacente                                                          | m³     | 132,720.47         | 60,118.55  | 72,601.92  | 1,169.03                 | 5,174.61  |
| Subrasante                                                          | m³     | 67,539.93          | 14,332.67  | 53,207.26  | 227.30                   | 1,864.79  |
| Obras de drenaje                                                    | pza    | 95.00              | 33.00      | 62.00      | 17.00                    | 6.00      |
| Columnas de 1.20 m de diámetro                                      | pza    | 66.00              | 30.00      | 36.00      | 3.80                     | 4.00      |
| Cabezal                                                             | pza    | 9.00               | 3.00       | 6.00       | 0.90                     | 1.00      |
| Trabes Aashto IV de 1.35 m x 30.60 m (fabricación)                  | pza    | 102.00             | 40.00      | 62.00      | 3.50                     | 20.00     |
| Trabes Aashto IV de 1.35 m x 0.60 m x 0.50 m (transporte y montaje) | pza    | 102.00             | 14.00      | 88.00      | 8.00                     | 14.00     |
| Escamas de concreto en muros                                        | pza    | 3,413.00           | 557.00     | 2,856.00   | 0.00                     | 200.00    |

La intervención de Escamas de concreto en muro disminuyó por la conversión de unidades de “m²” a “pzas”.

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

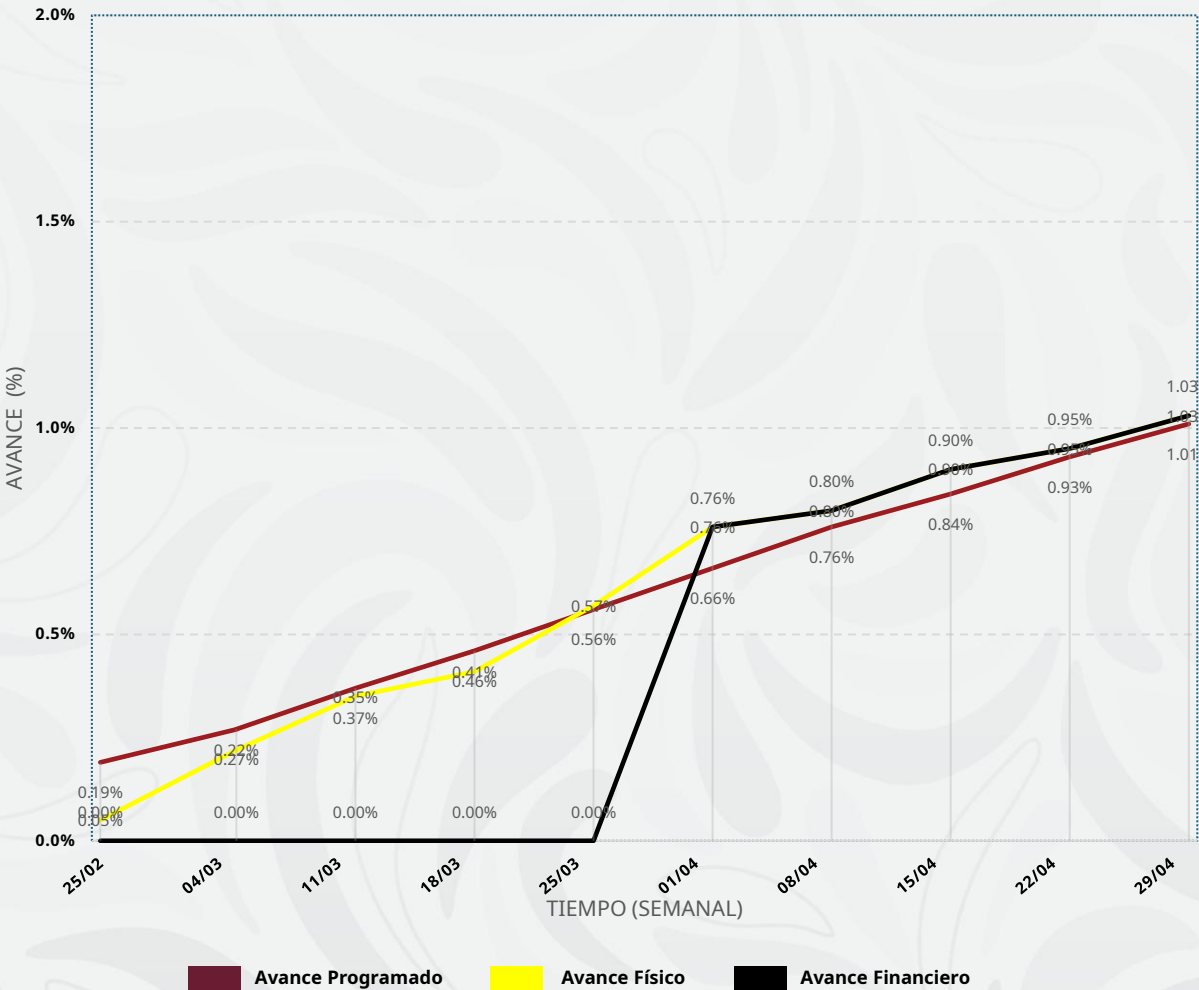

|                              | 17 de abril al 23 de abril | 24 de abril al 30 de abril |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Fuerza de Trabajo (personas) | 475                        | 499                        |
| Maquinaria                   | 145                        | 156                        |
| Frentes de trabajo           | 33                         | 33                         |
