



Guerrero - Puebla

Eje Cuautla - Tlapa

Ramal Igualapa - Chilixtlahuaca - Alacatlalzala

Avance global	• Programado: 12.41%	• Semanal: 1.48%	Avance 2025	• Programado: 100.0%	• Semanal: 0.00%	Avance 2026	• Programado: 15.00%	• Semanal: 0.07%
	• Real: 11.17%	• Financiero: 5.26%		• Real: 100.0%	• Financiero: 100.0%		• Real: 10.45%	• Financiero: 3.10%

Inversión total 2025-2029: 13,652 mdp

- Morelos: 688 mdp
- Puebla: 7,525 mdp
- Guerrero: 5,440 mdp

Meta total 2025-2029: 393 km

- Morelos: 26 km
- Puebla: 159 km
- Guerrero: 208 km

Inversión 2025: 641.2 mdp

- Guerrero: 515.5 mdp
- Puebla: 125.7 mdp

Meta 2025: 33 km

- Guerrero: 30 km
- Puebla: 3 km

Inversión 2026: 3,148 mdp

- Guerrero: 867 mdp
- Puebla: 2,281 mdp

Meta 2026: 112 km

- Guerrero: 63 km
- Puebla: 49 km

Inicio meta 2026: 17 de febrero de 2026

Inicio: 16 de mayo 2025

Término: diciembre 2029

Termino meta 2025: marzo de 2026

40,956 empleos generados

7,750 habitantes beneficiados



1 hora de ahorro en tiempo

Se beneficiará a una población de 7,750 habitantes de los municipios de Igualapa, Cochoapa el Grande, Metlatonoc y Malinaltepec, reduciendo tiempos de traslado.

Guerrero - Puebla

Eje Cuautla – Tlapa

Ramal Igualapa – Chilixtlahuaca - Alacatlalzala

Avance global	• Programado: 12.77%	• Semanal: 0.31%	Avance 2025	• Programado: 100.0%	• Semanal: 0.00%	Avance 2026	• Programado: 15.00%	• Semanal: 0.78%
	• Real: 11.48%	• Financiero: 5.84%		• Real: 100.0%	• Financiero: 100.0%		• Real: 11.23%	• Financiero: 5.80%

Inversión total 2025-2029: 13,652 mdp

- Morelos: 688 mdp
- Puebla: 7,525 mdp
- Guerrero: 5,440 mdp

Meta total 2025-2029: 393 km

- Morelos: 26 km
- Puebla: 159 km
- Guerrero: 208 km

Inversión 2025: 641.2 mdp

- Guerrero: 515.5 mdp
- Puebla: 125.7 mdp

Meta 2025: 33 km

- Guerrero: 30 km
- Puebla: 3 km

Inversión 2026: 3,433.9 mdp

- Guerrero: 1,035.9 mdp [(PEF) (867.10 mdp modernización y 168.84 mdp conservación)]
- Puebla: 2,398 mdp

Meta 2026: 135.8 km

- Guerrero: 86.8 km (28.84 km construcción y 58.0 km conservación)
- Puebla: 49 km

Inicio meta 2026: 17 de febrero 2026


Inicio: 16 de mayo 2025

Término: diciembre 2029

Termino meta 2025: marzo de 2026

40,956 empleos generados

7,750 habitantes beneficiados

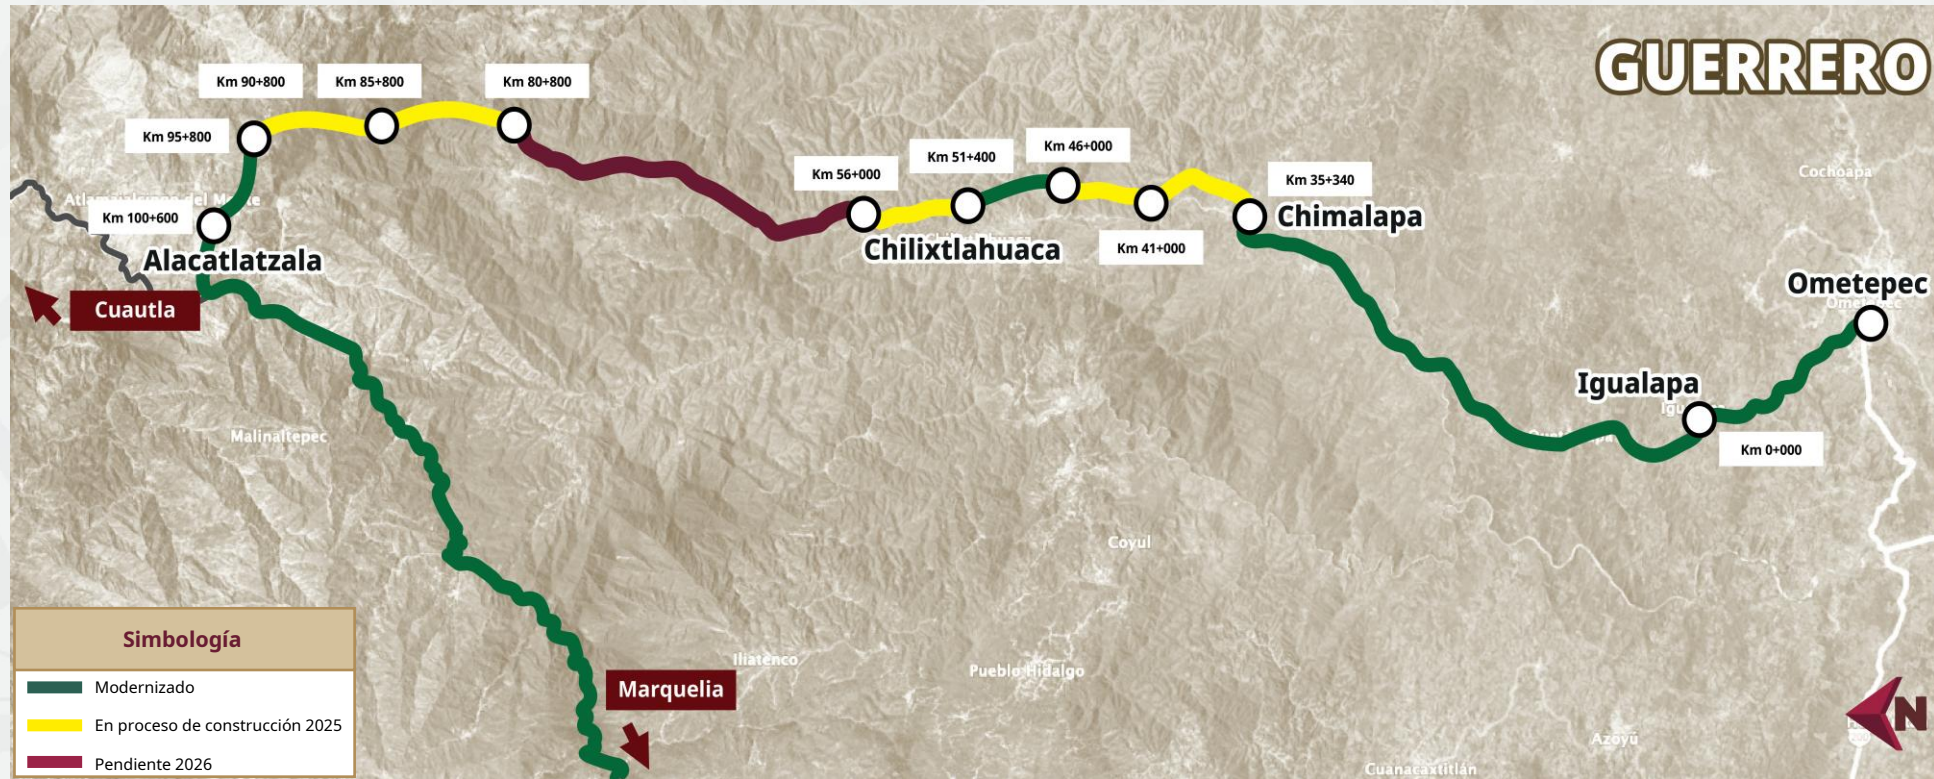

Se beneficiará a una población de 7,750 habitantes de los municipios de Igualapa, Cochoapa el Grande, Metlatonoc y Malinaltepec, reduciendo tiempos de traslado.

Guerrero 2026

Eje Cuautla – Tlapa

Ramal Igualapa – Chilixtlahuaca - Alacatlitzala

ACTUALIZADA 18/05/2026




Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance: Programado, Físico y Financiero

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	08-05-26 al 14-05-26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Del km 56+000 – al km 61+000	5.0	2.06%	97.94%	0.80%	0.08%	
Del km 61+000 – al km 66+000	5.0	7.06%	92.94%	1.00%	1.47%	
Del km 66+000 – al km 71+000	5.0	1.28%	98.72%	1.10%	0.955	
Del km 71+000 – al km 76+000	5.0	4.7%	95.3%	1.20%	2.25%	
Del km 76+000 – al km 81+000	5.0	0.57%	99.43%	1.00%	0.02%	

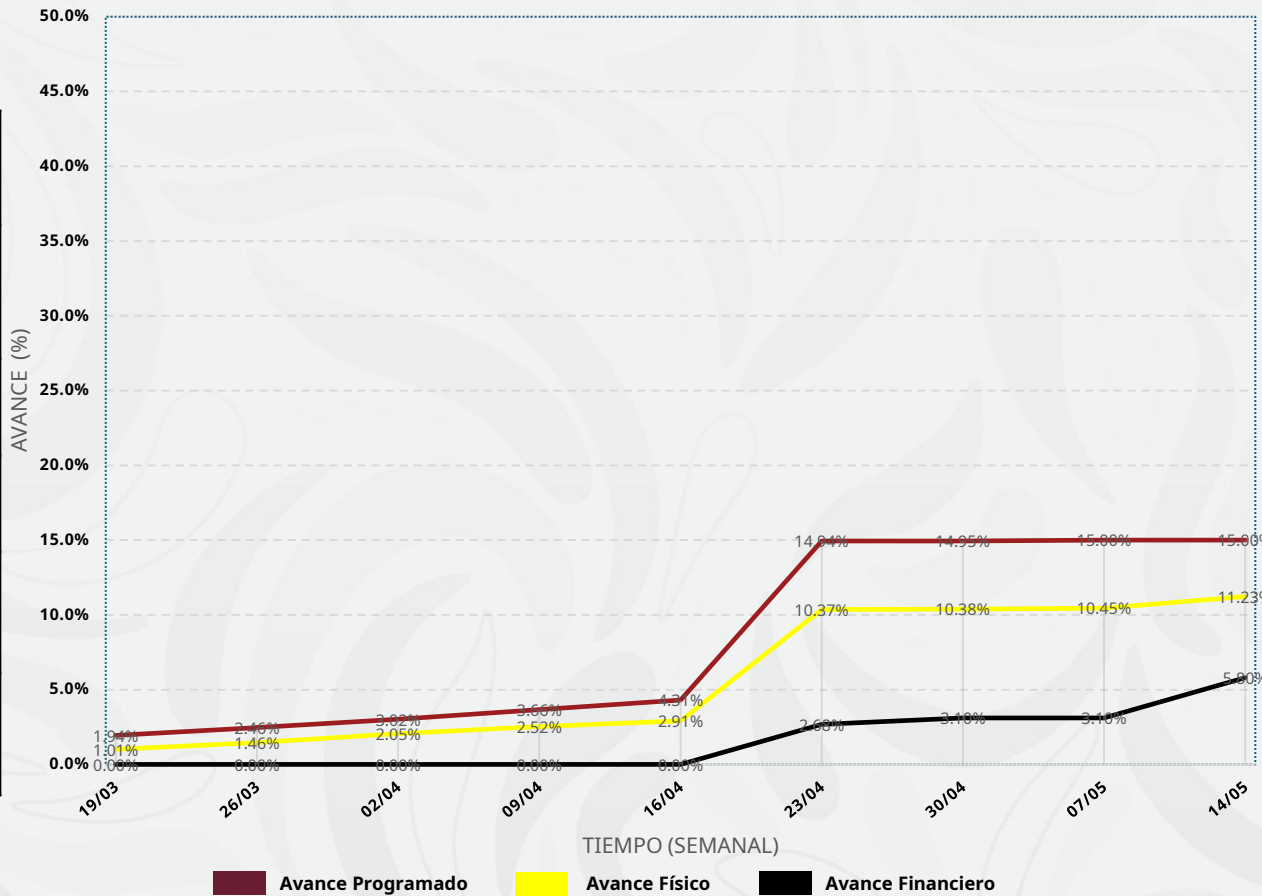

	01 de mayo al 07 de mayo 2026	08 de mayo al 14 de mayo 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	95	100
Maquinaria	35	36
Frentes de trabajo	10	10
