

# Sonora/Chihuahua

## Camino Límite Estados Chihuahua/Sonora-Pancho Villa-E.C. (Janos-Monte Verde)



### Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes


CONCLUIDA

Avance físico

• Programado: 100%

• Real: 100% (obras complementarias)

• Financiero: 81.0%

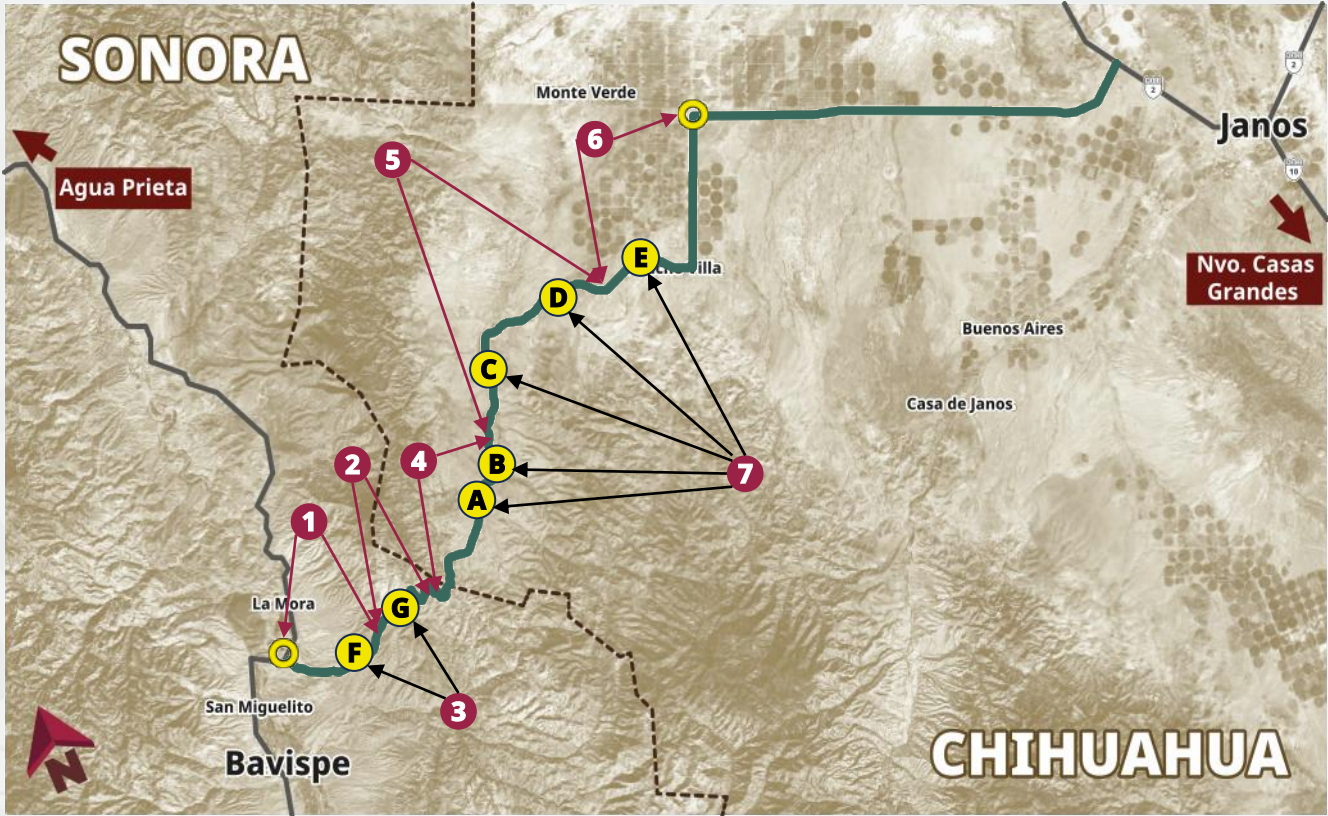

- Inversión total: 1,710 mdp**  
**Sonora:** 769 mdp  
**Chihuahua:** 941 mdp
- Meta total: 67 km y 7 puentes**  
• 6.6 km modernizados C,  
Chihuahua (se requiere  
trabajos complementarios)
- Inversión 2026: 60 mdp**
- Inicio:** marzo, 2025  
**Término:** 30 Enero de 2026
- 5,130** empleos generados
- 4,145** habitantes beneficiados
- 90 minutos** de ahorro en tiempo

<b>1.- Constructora URBATRAC, S.A. de C.V.</b> <b>Meta:</b> Km 0+000-km 11+000, incluye entronque km 0+000 <b>Inversión:</b> 324.6 MDP C/IVA
<b>2.- ESMA Instalaciones, S.A. de C.V.</b> <b>Meta:</b> Km 11+000-km 18+093 km <b>Inversión:</b> 306.2 MDP C/IVA
<b>3.- INNOVACIONES INTELIGENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN,S.A DE C.V Y CMCO,S.A DE C.V</b> F. Km 6+900 Puente I, 122.0 m G. Km 14+700 Puente II, 61.5 m
<b>4.- CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PROYECTOS INTERESTATALES,S.A DE C.V</b> Por modernizar a nivel de pavimento a 7.0 m <b>Meta:</b> Km 18+093 – km 29+093
<b>5.- La CIMA Terraceros, S.A. de C.V. y Estructuras y Excavaciones JM, S.A. de C.V.</b> <b>Meta:</b> Km 29+093-KM 47+233 <b>Inversión:</b> 193.9 MDP C/IVA
<b>6.- MERP Edificaciones y Terracerías, S.A. de C.V.</b> <b>Meta:</b> Km 47+233-Km 59+823 y Km 66+422-Km 66+829, incluye Boulevard y entronque a nivel. <b>Inversión:</b> 179.4 MDP C/IVA
<b>7.- Asfaltos y Triturados EL PUJAL, S.A. de C.V.</b> <b>En proceso de construcción de 5 puentes:</b> A. Km 22+758 El Papalote, 30.0 m B. Km 25+758 Los Pilares, 40.0 m C. Km 33+832 Las Profesoras, 40.0 m D. Km 36+682 La Enramada, 30.0 m E. Km 38+362 La Pila, 120.0 m <b>Inversión:</b> 122.5 MDP C/IVA

<b>S1.- CLAMI INGENIEROS, S.C</b>  <b>Tramo:</b> del km 0+000 al km 11+000, puente Sonora I en el km 6+900 <b>Inversión:</b> 6.1 MDP C/IVA	<b>S2.- NEDOX, S.A DE C.V</b>  <b>Tramo:</b> del km 11+000 al km 18+093, puente Sonora II en el km 14+700 <b>Inversión:</b> 6.8 MDP C/IVA	<b>S3.- JIDASA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V</b>  <b>Tramo:</b> tramo del km 18+093 al km 29+093, 5 puentes Chihuahua <b>Inversión:</b> 7.5 MDP C/IVA	<b>S4.- GSM SUPERVISIÓN, PROYECTO E IMPACTO AMBIENTAL, S.A DE C.V</b>  <b>Tramo:</b> tramo del km 29+093 al km 59+822, del km 66+422 al km 66+828 <b>Inversión:</b> 7.5 MDP C/IVA	<b>S5.- GRUPO SELOME, S.A. DE C.V</b>  <b>Tramo:</b> Manifestación de Impacto Ambiental y de Cambio de Uso de Suelo Forestal, Chihuahua <b>Inversión:</b> 6.7 MDP C/IVA	<b>S6.- PROVEEDORA DE INGENIERIA, INSTALACION E INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V</b>  <b>Tramo:</b> implementación y ejecución de medidas de mitigación de la Manifestación de Impacto Ambiental, Sonora <b>Inversión:</b> 14.0 MDP C/IVA	<b>S7.- GRUPO CORPOSIIA, S.A. DE C.V.</b>  <b>Tramo:</b> implementación y ejecución de medidas de mitigación de la Manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad regional, Sonora <b>Inversión:</b> 10.5 MDP C/IVA
---	--	---	--	--	---	--
