

Sonora/Chihuahua

Camino Límite Estados Chihuahua/Sonora-Pancho Villa-E.C. (Janos-Monte Verde)

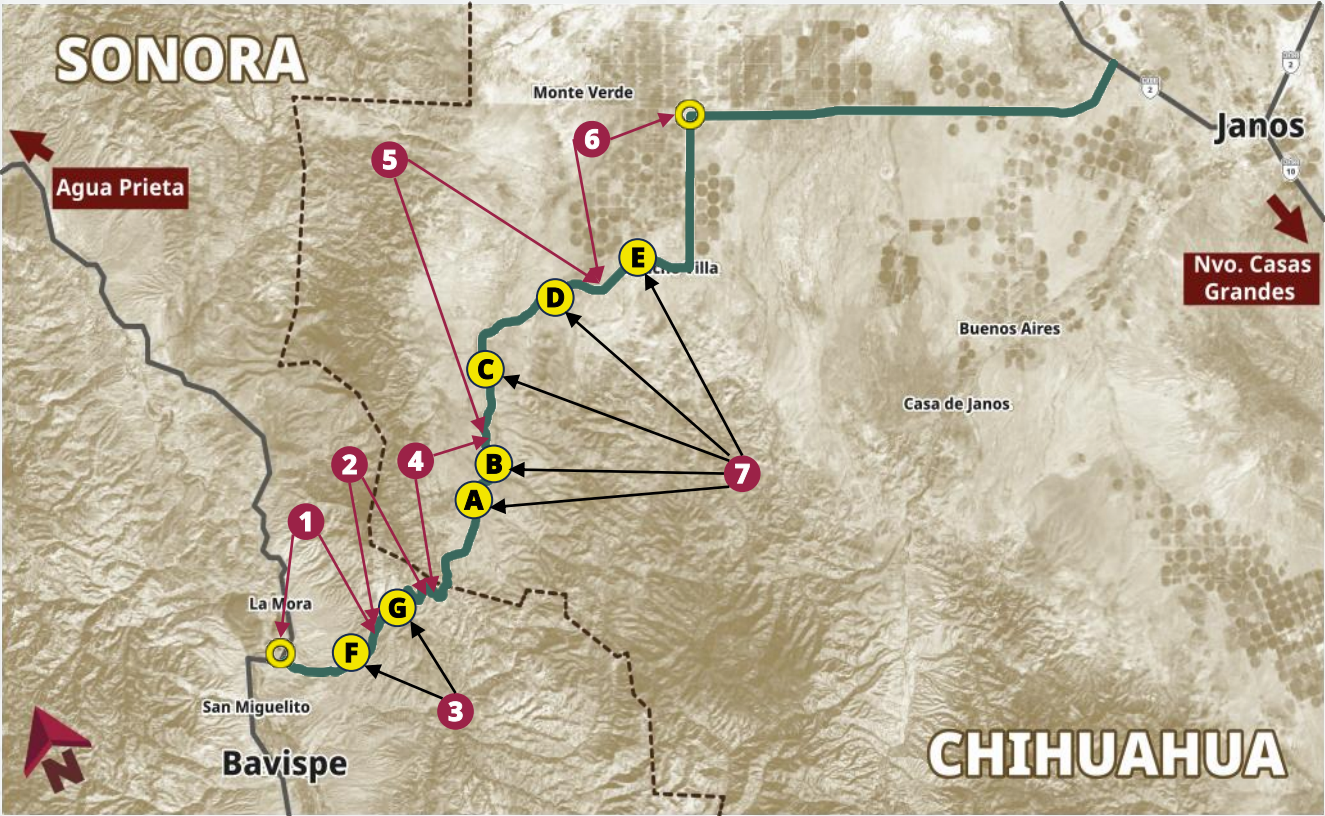









Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

CONCLUIDA

Avance físico • Programado: 100%
• Real: 100% (obras complementarias) • Financiero: 81.0%



-  **Inversión total: 1,710 mdp**
Sonora: 769 mdp
Chihuahua: 941 mdp
-  **Meta total: 67 km y 7 puentes**
• 6.6 km modernizados C, Chihuahua (se requiere trabajos complementarios)
-  **Inversión 2026: 60 mdp**
-  **Inicio:** marzo, 2025
Término: 30 Enero de 2026
-  **5,130** empleos generados
-  **4,145** habitantes beneficiados
-  **90 minutos** de ahorro en tiempo

1.- Constructora URBATRAC, S.A. de C.V. Meta: Km 0+000-km 11+000, incluye entronque km 0+000 Inversión: 324.6 MDP C/IVA
2.- ESMA Instalaciones, S.A. de C.V. Meta: Km 11+000-km 18+093 km Inversión: 306.2 MDP C/IVA
3.- INNOVACIONES INTELIGENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN,S.A DE C.V Y CMCO,S.A DE C.V F. Km 6+900 Puente I, 122.0 m G. Km 14+700 Puente II, 61.5 m
4.- CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PROYECTOS INTERESTATALES,S.A DE C.V Por modernizar a nivel de pavimento a 7.0 m Meta: Km 18+093 – km 29+093
5.- La CIMA Terraceros, S.A. de C.V. y Estructuras y Excavaciones JM, S.A. de C.V. Meta: Km 29+093-KM 47+233 Inversión: 193.9 MDP C/IVA
6.- MERP Edificaciones y Terracerías, S.A. de C.V. Meta: Km 47+233-Km 59+823 y Km 66+422-Km 66+829, incluye Boulevard y entronque a nivel. Inversión: 179.4 MDP C/IVA
7.- Asfaltos y Triturados EL PUJAL, S.A. de C.V. En proceso de construcción de 5 puentes: A. Km 22+758 El Papalote, 30.0 m B. Km 25+758 Los Pilares, 40.0 m C. Km 33+832 Las Profesoras, 40.0 m D. Km 36+682 La Enramada, 30.0 m E. Km 38+362 La Pila, 120.0 m Inversión: 122.5 MDP C/IVA

S1.- CLAMI INGENIEROS, S.C Tramo: del km 0+000 al km 11+000, puente Sonora I en el km 6+900 Inversión: 6.1 MDP C/IVA	S2.- NEDOX, S.A DE C.V Tramo: del km 11+000 al km 18+093, puente Sonora II en el km 14+700 Inversión: 6.8 MDP C/IVA	S3.- JIDASA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V Tramo: tramo del km 18+093 al km 29+093, 5 puentes Chihuahua Inversión: 7.5 MDP C/IVA	S4.- GSM SUPERVISIÓN, PROYECTO E IMPACTO AMBIENTAL, S.A DE C.V Tramo: tramo del km 29+093 al km 59+822, del km 66+422 al km 66+828 Inversión: 7.5 MDP C/IVA	S5.- GRUPO SELOME, S.A. DE C.V Tramo: Manifestación de Impacto Ambiental y de Cambio de Uso de Suelo Forestal, Chihuahua Inversión: 6.7 MDP C/IVA	S6.- PROVEEDORA DE INGENIERIA, INSTALACION E INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V Tramo: implementación y ejecución de medidas de mitigación de la Manifestación de Impacto Ambiental, Sonora Inversión: 14.0 MDP C/IVA	S7.- GRUPO CORPOSIIA, S.A. DE C.V. Tramo: implementación y ejecución de medidas de mitigación de la Manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad regional, Sonora Inversión: 10.5 MDP C/IVA
---	--	---	--	--	---	--
