



Guerrero - Puebla

Eje Cuautla – Tlapa

Ramal Igualapa – Chilixtlahuaca - Alacatlitzala

Avance global	• Programado: 16.76%	• Semanal: 0.37%	Avance 2025	• Programado: 100.0%	• Semanal: 0.00%	Avance 2026	• Programado: 27.74%	• Semanal: 1.32%
	• Real: 13.77%	• Financiero: 7.57%		• Real: 100.0%	• Financiero: 100.0%		• Real: 19.27%	• Financiero: 13.30%

Inversión total 2025-2029: 13,652 mdp

- Morelos: 688 mdp
- Puebla: 7,525 mdp
- Guerrero: 5,440 mdp

Meta total 2025-2029: 393 km

- Morelos: 26 km
- Puebla: 159 km
- Guerrero: 208 km

Inversión 2025: 641.2 mdp

- Guerrero: 515.5 mdp
- Puebla: 125.7 mdp

Meta 2025: 33 km

- Guerrero: 30 km
- Puebla: 3 km

Inversión 2026: 3,433.9 mdp

- Guerrero: 1,035.9 mdp (PEF) (867.10 mdp modernización y 168.84 mdp conservación)
- Puebla: 2,398 mdp

Meta 2026: 134.8 km

- Guerrero: 85.84 km (28.84 km construcción y 57.0 km conservación en tramos aislados)
- Puebla: 49 km

Inicio meta 2026: 17 de febrero 2026


Inicio: 16 de mayo 2025

Término: diciembre 2029

Termino meta 2025: marzo de 2026

40,956 empleos generados

7,750 habitantes beneficiados

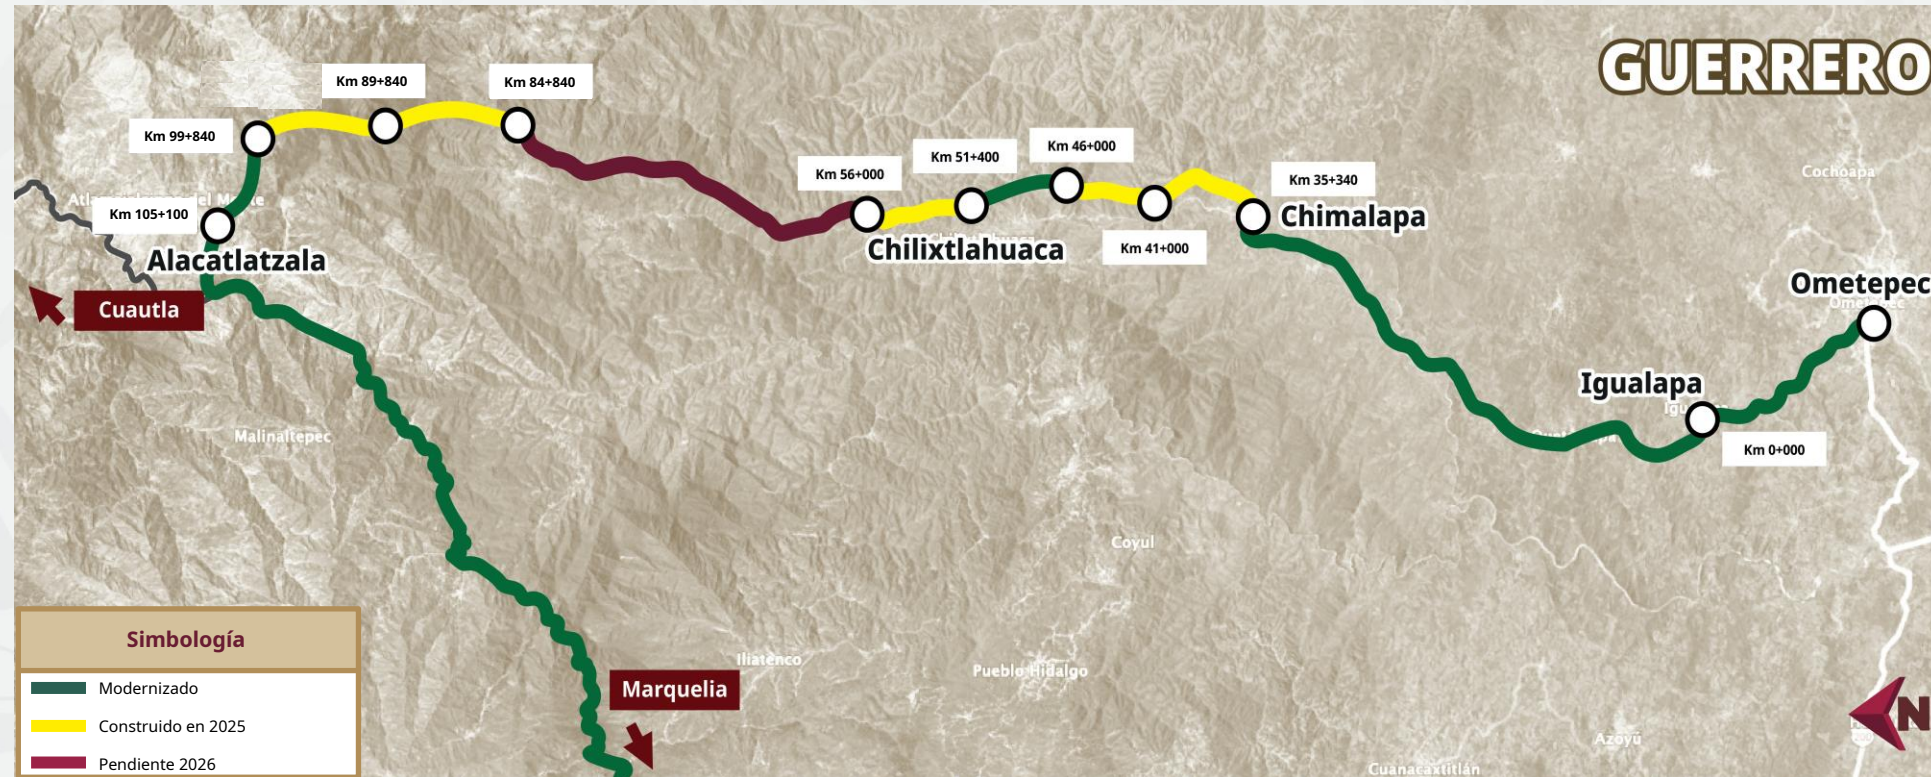

1 hora de ahorro en tiempo

Se beneficiará a una población de 7,750 habitantes de los municipios de Igualapa, Cochoapa el Grande, Metlatonoc y Malinaltepec, reduciendo tiempos de traslado.




Guerrero 2026

Eje Cuautla – Tlapa

Ramal Igualapa – Chilixtlahuaca - Alacatlitzala

Elemento	Meta	Ejecutado acumulabl e	Faltant e	05-06-26 al 11-06-26		Observaciones
				Programad o	Ejecutad o	
Del km 56+000 – al km 61+000	5.0	14.87%	85.13%	4.69%	0.91%	
Del km 61+000 – al km 66+000	5.0	18.27%	81.73%	3.78%	0.22%	
Del km 66+000 – al km 71+000	5.0	12.78%	87.22%	3.92%	1.18%	
Del km 71+000 – al km 76+000	5.0	19.86%	80.14%	3.46%	0.40%	
Del km 76+000 – al km 81+000	5.0	5.33%	94.67%	1.52%	0.31%	
Del km 81+000 al km 84+840	3.87	0.17%	99.83%	1.58	0.17%	

Avance: Programado, Físico y Financiero

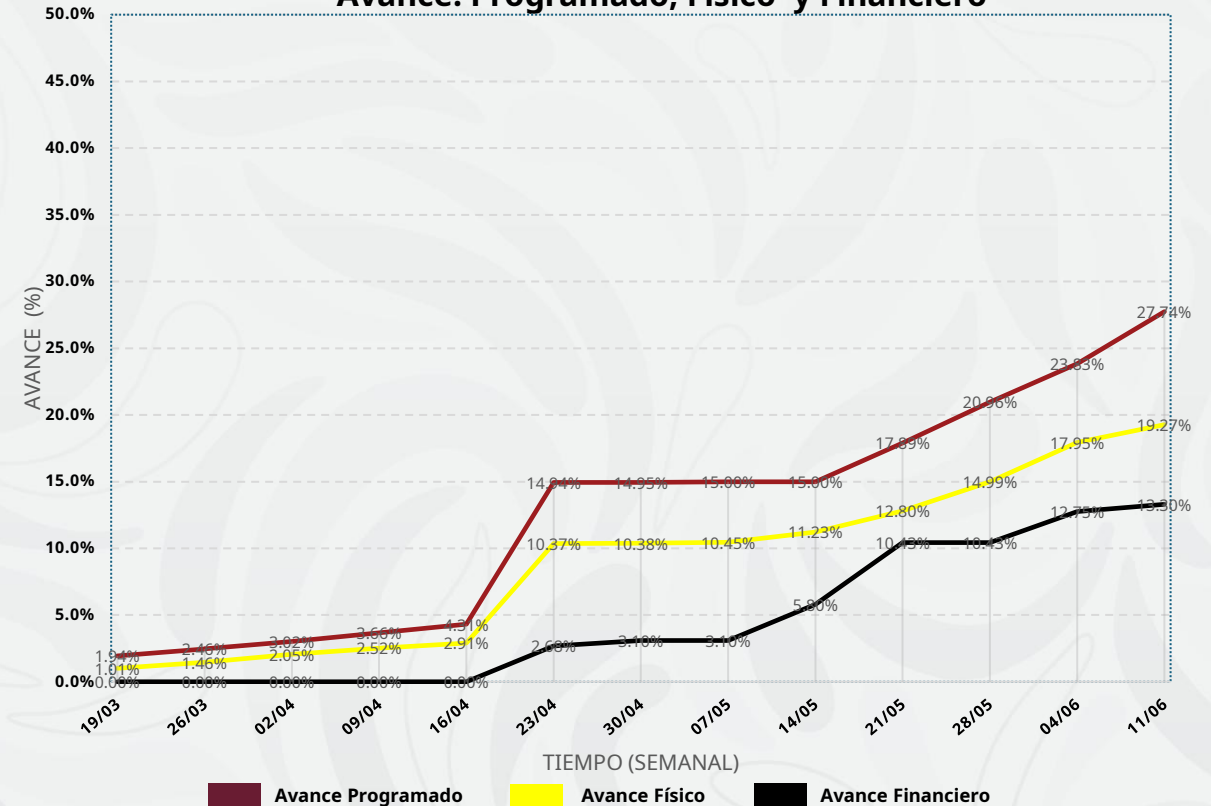

	29 de mayo al 04 de junio 2026	05 de mayo al 11 de junio 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	100	197
Maquinaria	43	57
Frentes de trabajo	10	20

Guerrero - Puebla

Eje Cuautla – Tlapa

Ramal Igualapa – Chilixtlahuaca - Alacatlitzala



Inversiones y metas 2025 - 2030

	2025		2026		PEF		FONADIN		VDG		2027		2028		2029		2030		Total	
	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta
Cuautla - Tlapa	641.2	33	3,597.6	84	2,685.6	66	0	0	912.0	18	3,300	64	3,300	64	3,427	67	1,063	0	15,328.8	312
Morelos	-	-	302.8	6	-	-	-	-	302.8	5.6	-	-	-	-	-	-	-	-	303	6
Puebla	125.7	3	2,231.9	46	1,814.7	37	-	-	417.2	8.4	2,200	42	2,200	42	2,369	45	713	-	9,840	178
Guerrero	515.5	30	1062.9	33	870.9	29	-	-	192	4	1,100	22	1,100	22	1,058	22	350	-	5,186	129
