



Morelos – Puebla - Guerrero

Eje Cuautla – Tlapa

Cuautla – Tlapa y Ramal: Igualapa – Chilixtlahuaca - Alacatlaltzala

Avance global • Programado: 14.57% • Semanal: 0.09%
• Real: 12.87% • Financiero: 3.47%

Avance 2026 • Programado: 20.13% • Semanal: 0.50%
• Real: 10.18% • Financiero: 7.80%



Totales

Inversión total 2025-2029: 21,936 mdp

- Morelos: 469.5 mdp
- Puebla: 14,188.3 mdp
- Guerrero: 7,278.3 mdp

Meta total 2025-2029: 311.8 km

- Morelos: 5.6 km
- Puebla: 177.1 km
- Guerrero: 129.1 km



2025

Inversión 2025: 641.2 mdp

- Guerrero: 515.5 mdp
- Puebla: 125.7 mdp

Meta 2025: 33.3 km

- Guerrero: 30.3 km
- Puebla: 3.0 km



2026

Inversión PEF 2026: 2,685.5 mdp

- Guerrero: 870.8 mdp
- Puebla: 1,814.7 mdp

Meta PEF 2026: 65.9 km

- Guerrero: 28.84 km
- Puebla: 37.1 km

Inversión VDG 2026: 1,414.1 mdp

- Morelos: 114.5 mdp
- Puebla: 1,001.9 mdp
- Guerrero: 297.7 mdp

Meta VDG 2026: 17.5 km

- Morelos: 1.4 km
- Puebla: 12.3 km
- Guerrero: 3.9 km

REVISAR METAS

Inicio: 16 de mayo 2025

Termino: diciembre 2029

Termino meta 2025: marzo de 2026



65,808 empleos generados

Inicio meta 2026: 17 de febrero 2026

Término meta 2026: 31 de diciembre de 2026



7,750 habitantes beneficiados



1 hora de ahorro en tiempo



Se beneficiará a una población de 7,750 habitantes de los municipios de Igualapa, Cochoapa el Grande, Metlatonoc y Malinaltepec, reduciendo tiempos de traslado.




Morelos – Puebla - Guerrero

Eje Cuautla – Tlapa

Cuautla – Tlapa y Ramal: Igualapa – Chilixtlahuaca - Alacatlitzala

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	26-06-26 al 02-07-26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Del km 56+000 – al km 61+000	5.0	16.52%	83.48%	4.69%	0.57%	
Del km 61+000 – al km 66+000	5.0	21.55%	78.45%	3.78%	0.95%	
Del km 66+000 – al km 71+000	5.0	18.53%	81.47%	3.92%	1.31%	
Del km 71+000 – al km 76+000	5.0	25.31%	74.69%	3.46%	1.24%	
Del km 76+000 – al km 81+000	5.0	6.94%	93.06%	1.52%	0.21%	
Del km 81+000 al km 84+840	3.87	7.23%	92.77%	1.58	0.45%	

Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Tamazunchale - Huejutla

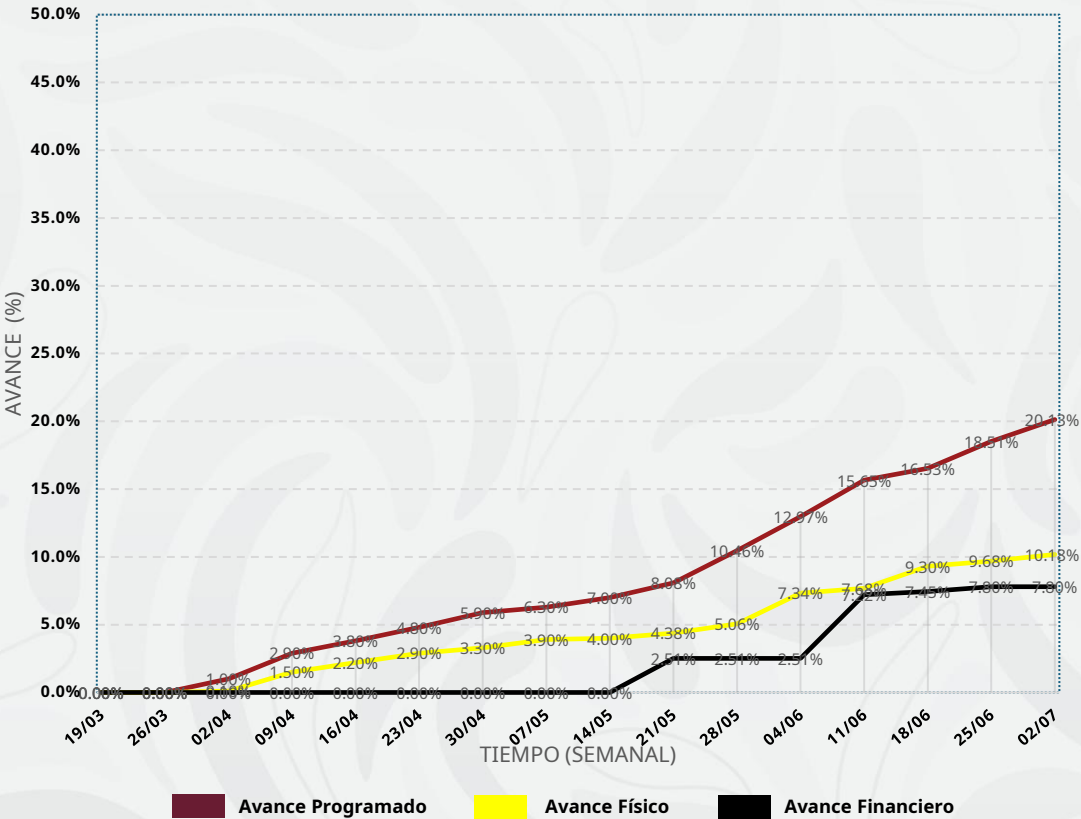

	19 de mayo al 25 de junio 2026	26 de junio al 02 de julio 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	253	253
Maquinaria	65	65
Frentes de trabajo	17	17

Inversiones y metas 2025 - 2030

	2025		2026		PEF		VDG		2027		2028		2029		2030		Total	
	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta	Inversión	Meta
Cuautla - Tlapa	641	33	4,100	83	2,685	66	1,414	18	5,117	64	5,117	64	5,314	67	1,648	0	21,936	312
Morelos	0	0	114	1	0	0	114	1	355	4	0	0	0	0	0	0	470	6
Puebla	126	3	2,817	49	1,815	37	1,002	12	3,056	38	3,411	42	3,673	45	1,106	0	14,188	177
Guerrero	516	30	1,168	33	871	29	298	4	1,706	22	1,706	22	1,640	21	543	0	7,278	129
