Guaymas – Esperanza – Yécora - Chihuahua

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance 2025

Avance Programado:100.00 %
Avance Real: 88.50 %
Avance Financiero: 50.80 %

Inversión total: 10,228 mdp
- Sonora: 5,935 mdp
- Chihuahua: 4,293 mdp

Meta total: 450 km
- Sonora: 252 km, 4 puentes
- Chihuahua: 198 km

Inversión 2025: 450 mdp
- Sonora:450 mdp

Meta 2025: 10 km.
- Sonora: 10 km

Inversión 2026: 4,000 mdp
- Sonora: 4,000 mdp

Meta 2026: 95 km.
- Sonora: 95 km

Inicio : 20 de octubre de 2025
Termino: 28 de febrero de 2026
Término meta 2025: 28 de febrero de 2026

30,684 empleos generados

669,912 habitantes beneficiados

Beneficios:
- Derrama económica regional.
- Fortalecimiento de exportaciones.
- Impulso al crecimiento turístico.
- Mejora en los puntos de salida para la producción agropecuaria, manufacturera e industrial.

Guaymas – Esperanza – Yécora - Chihuahua

Km 17+300 al Km 32+300

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	19-02-26 al 26-02-26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Trabajos preliminares (km)	9.97	9.97	-	-	-	-
Terracerías (km)	9.97	9.97	-	-	-	-
Obras de drenaje (Pza)	23	23	-	-	-	-
Pavimento (km)	9.97	7.46	2.51	0.78	0.78	-
Señalamiento (km)	9.97	-	9.97	-	-	-
Construcción Puente I (Canal alto)	100%	42.86%	57.14%	0.00%	0.00%	-
Construcción Puente II (Agua Caliente)	100%	84.52%	15.48%	13.12%	13.12%	-
Construcción Puente III (Chinitos I)	100%	85.71%	14.29%	5.41%	5.41%	-
Construcción Puente IV (Chinitos II)	100%	81.94%	28.57%	10.5%	10.5%	-

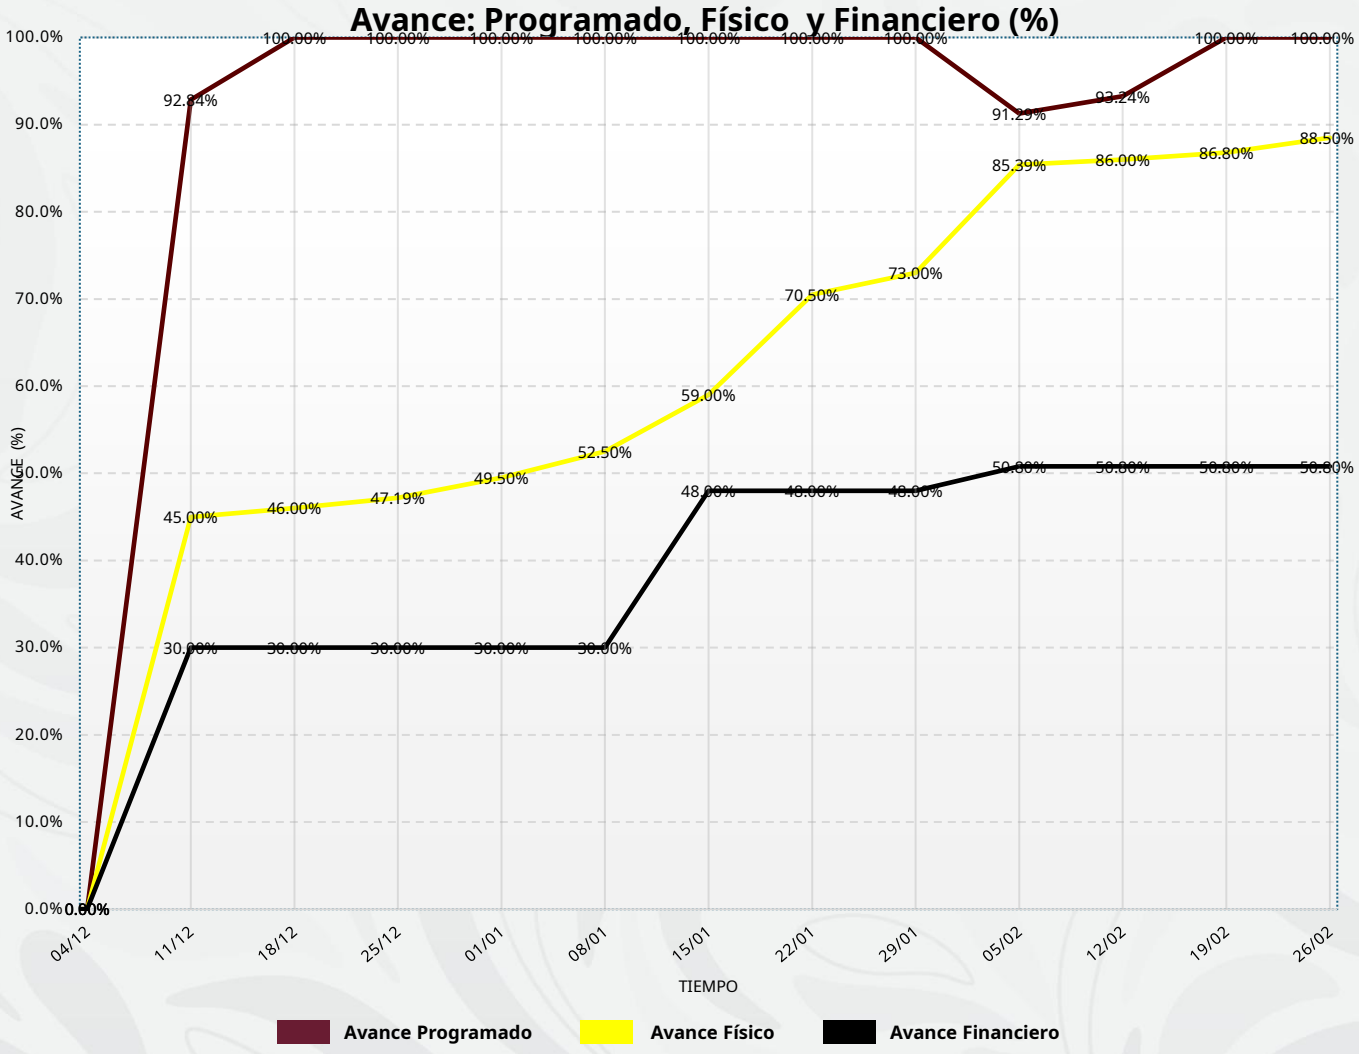

	13 de febrero al 19 de febrero 2026	20 de febrero al 26 de febrero 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	364	280
Maquinaria	110	40
Frentes de trabajo	14	14
