Tabasco-Campeche

Macuspana-Escárcega (Carretera Federal 186)
Tramo Tabasco

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance global
- Programado: 6.82%
- Real: 6.81%
- Semanal: 0.01%
- Financiero: 6.80%

Avance 2026
- Programado: 0.19%
- Real: 0.05%
- Semanal: 0.00%
- Financiero: 0.00%

Inversión total 2025-2028: 21,047 mdp
- **Tabasco:** 8,335 mdp
- **Campeche:** 11,483 mdp
- **Chiapas:** 1,229 mdp

Meta total 2025-2028: |249 km |
Ampliación a 22 m (A4)
Tabasco • 92 km | Chiapas • 14 km | Campeche • 143 km

Inversión 2025: 1,429 MDP
- **Tabasco:** 1,145 mdp
- **Campeche:** 284 mdp

CIERRE PEF 2025

Meta 2025: Tabasco: 12 km y 2 puentes
Campeche: 4 km y 2 entronques

Inversión 2026: 3,749 MDP
- **Tabasco:** 3,109 mdp
- **Campeche:** 640 mdp

Meta 2026: Tabasco: 26 km, 2 PSV y 2 puentes
Campeche: 6 km

Inicio: 16 de marzo de 2025
Término: Diciembre 2028
Término meta 2025: 28 de febrero de 2026

63,141 empleos generados

760 mil habitantes beneficiados

40 minutos de ahorro en tiempo

Beneficios Incrementaría la capacidad de la vía, mejora el nivel de servicio, reduce los costos de operación vehicular y los tiempos de recorrido de los usuarios, así como el riesgo de accidentes.

297 km longitud total
48 km Ampliados (A4)

Tabasco-Campeche

Macuspana-Escárcega (Carretera Federal 186)
Tramo Tabasco

Gobierno de México | Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Km 60+000 – km 74+000 y km 154+000 al km 297+000

Elemento	Unidad	Intervención total	Ejecutado acumulado	Faltante	20/02/2026 AL 26/02/2026	
					Programado	Ejecutado
Desmonte	**ha**	27.92	14.19	13.73	6.59	11.99
Despalme	**m³**	114,134.04	44,630.43	69,503.61	16,510.28	38,600.43
Cortes	**m³**	88,979.83	3,150.00	85,829.83	11,255.39	3,150.00
Pedraplén	**m³**	151,364.26	3,550.00	147,814.26	15,662.56	3,550.00
Pilotes de 120 cm. De diámetro.	**pza**	30.00	1.00	29.00	4.30	1.00

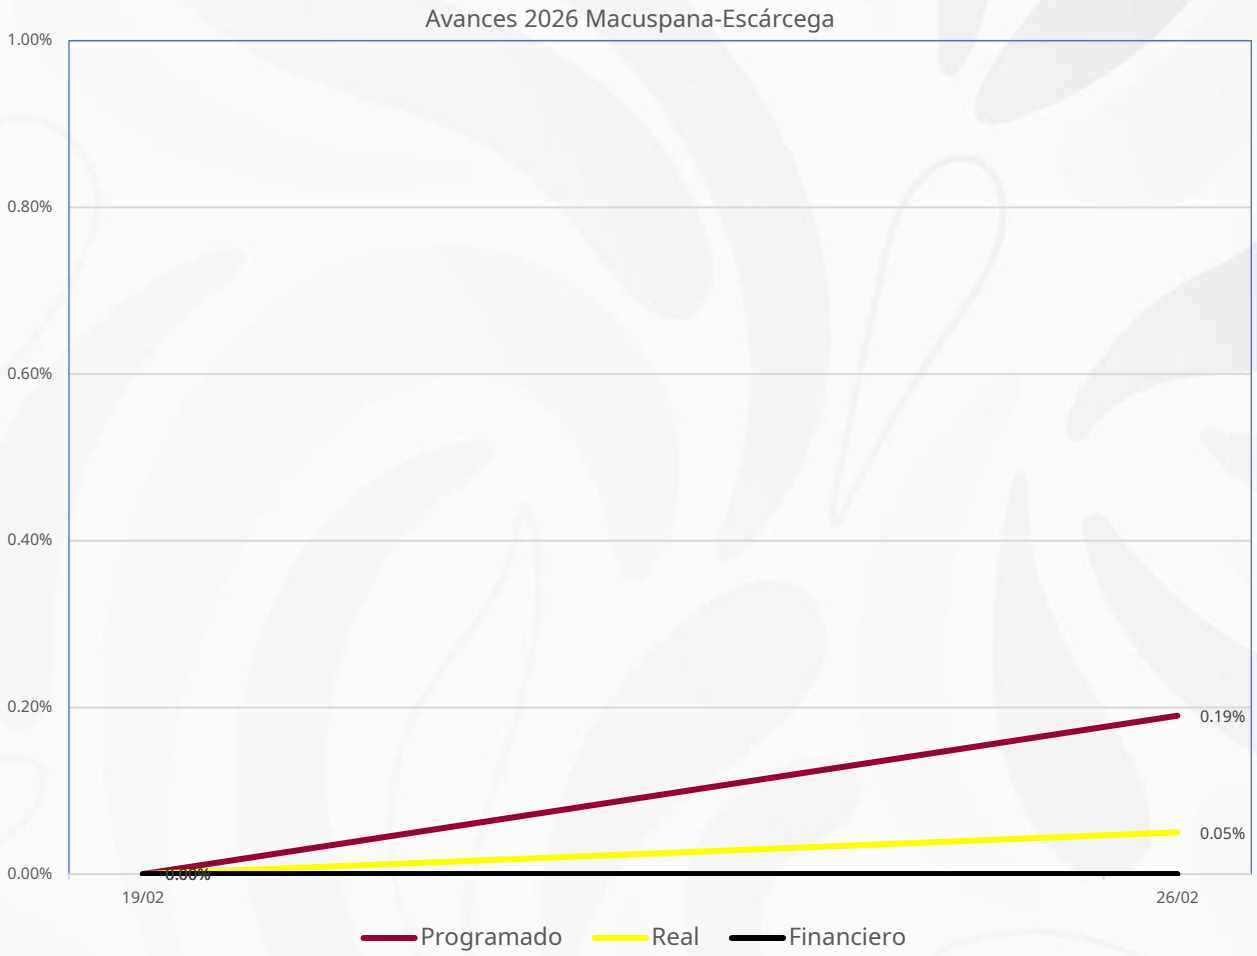

	13 de febrero al 19 de febrero	20 de febrero al 26 de febrero
Fuerza de Trabajo (personas)	170	125
Maquinaria	66	19
Frentes de trabajo	7	14
