Salina Cruz-Zihuatanejo (MEX-200)

Tramo Guerrero

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance global
- Programado: 6.54%
- Real: 6.22%
- Semanal: 0.08%
- Financiero: 6.54%

Avance 2025
- Programado: 100.0%
- Real: 95.17%
- Semanal: 1.21%
- Financiero: 100.0%

	Descripción
1	**Puente Las Vigas** Km 81+200 | 123 m
2	**Puente Río Nexpa** Km 85+300 | 425 m
3	**Puente Agua Hedionda** Km 106+760 | 21 m
4	**Puente Copala** Km 116+000 | 120 m
5	**Puente Marquelia I** Km 135+500 | 220 m
6	**Puente Talapilla** Km 171+857 | 41 m
7	**Puente Río Quetzala** Km 173+711 | 190 m
8	**Puente Santa Catarina** Km 184+744 | 101 m
9	**Tramo 9** IG=km 209+500 AT – km 209+240 AD al km 219+540 | 10.30 km
10	**Tramo 10** km 219+540 al km 229+600 |10.06 km
11	**Tramo 11** km 229+600 al km 234+843.77 | 5.24 km

Inversión total 2025-2030: 24,722 mdp
- Guerrero: 6,641 mdp
- Oaxaca: 18,081 mdp

Meta total 2025-2030: 422 km
- Guerrero: 103 km
- Oaxaca: 319 km

Inversión 2025: 1,616 mdp
- Guerrero: 725 mdp
- Oaxaca: 891 mdp

Meta 2025: 27 km
- Guerrero: 1 km
- Oaxaca: 26 km

Inversión 2026: 2,754 mdp
- Oaxaca: 2,754 mdp

Meta 2026: 37 km

Inicio : 1 de abril de 2025
Termino: 31 de diciembre 2029
Término meta 2025: 20 de febrero de 2026

74,166 empleos generados

1,947,399 habitantes beneficiados

Beneficios: Reducción en tiempos de traslados de la Costa Chica de Gro. hacia Puerto Escondido Oax., reduciendo costos operativos e impulsando el turismo local y nacional de los municipios de Acapulco, San Marcos, Florencio Villareal, Cuajinicuilapa, Pinotepa Nacional, Villa de Tututepec, San Pedro Mixtepec, Pochutla y Huatulco.

Oaxaca/Guerrero

Salina Cruz-Zihuatanejo (MEX-200)

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Meta	Ejecutado Acumulable	Faltante	20-02-26 al 26-02-26	
				Programado	Ejecutado
Troncal	*13.58 km	*12.88 km	*0.70 km	0.0%	0.5%
8 puentes	8 pts	93.36% de 8 pts	6.64% de 8 pts	0.0%	0.8%

OBSERVACIONES

Oaxaca

Tramo 1 (4 frentes de trabajo)
trabajos de mantenimiento de señalamiento de protección de obra del km 212+200 al km 219+540, trabajos de excavación de cepas y colocación de postes de concreto en el derecho de vía del km 217+400 al km 217+600 LD y excavación de cepas, colocación de postes de concreto y aplicación de pintura en el derecho de vía del km 217+500 al km 217+900 LI
Tramo 2 (19 frentes de trabajo)
Producción de mezcla asfáltica, en banco de materiales ubicado en el km. 224+250 desviación izquierda 50 m., Tendido y compactación de base hidráulica del km. 224+550 al km. 225+100. lado izquierdo, Extracción y triturado de material para base hidráulica, en banco de materiales ubicado en carretera a Cuatunalco en el km. 225+700 desviación derecha 1,300 m.
Tramo 3 (54frentes de trabajo)
trabajos de habilitado de cimbra y colado de cunetas km 229+600 al km 231+380 y del km 233+300 al km 234+843.77, tendido de carpeta asfáltica, Km 229+600 al Km 231+400 y tendido de base asfáltica, Km 233+300 al Km 234+000.

Guerrero

Puente Las Vigas km 81+200: Construcción de las guarniciones y banquetas en los accesos del puente y limpieza del puente.
Puente Agua Hedionda Km 106+760: Concluido.
Puente Copala Km 116+000: Suministro y colocación del señalamiento vertical y limpieza de la obra.
Puente Marquelia I km 135+500: Acarreo, tendido y compactado de la mezcla para las capas de la carpeta asfáltica. Construcción de las juntas de dilatación, banquetas y guarniciones. Construcción de camino de acceso a la colonia, postensado de diafragmas, limpieza de la obra.
Puente Nexpa km 85+300: Cimbrado de losas, colado de losas, terracerías en rampa de acceso, colado muro de contención.
Puente Talapilla km 171+857: Suministro y tendido de base asfáltica, 14 cm de espesor ,compactada al 95%.
Puente Rio Quetzala Km 173+711: Perforación de pilotes de 1.50 m de diametro lado derecho 2da etapa, Habilitado armado de acero de refuerzo para pilotes lado derecho 2da etapa, conformación de plataforma lado derecho 2da etapa.
Puente Santa Catarina km 183+740: Cimbrado y armado de acero de refuerzo para cabezal y bancos en pilas no, 2 y 3. lado izquierdo 2da etapa, Montaje de trabes AASHTO tipo V; de 35.86 longitud y 1.60 m, de peralte. lado izquierdo 2da etapa.

Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Salina Cruz - Zihuatanejo

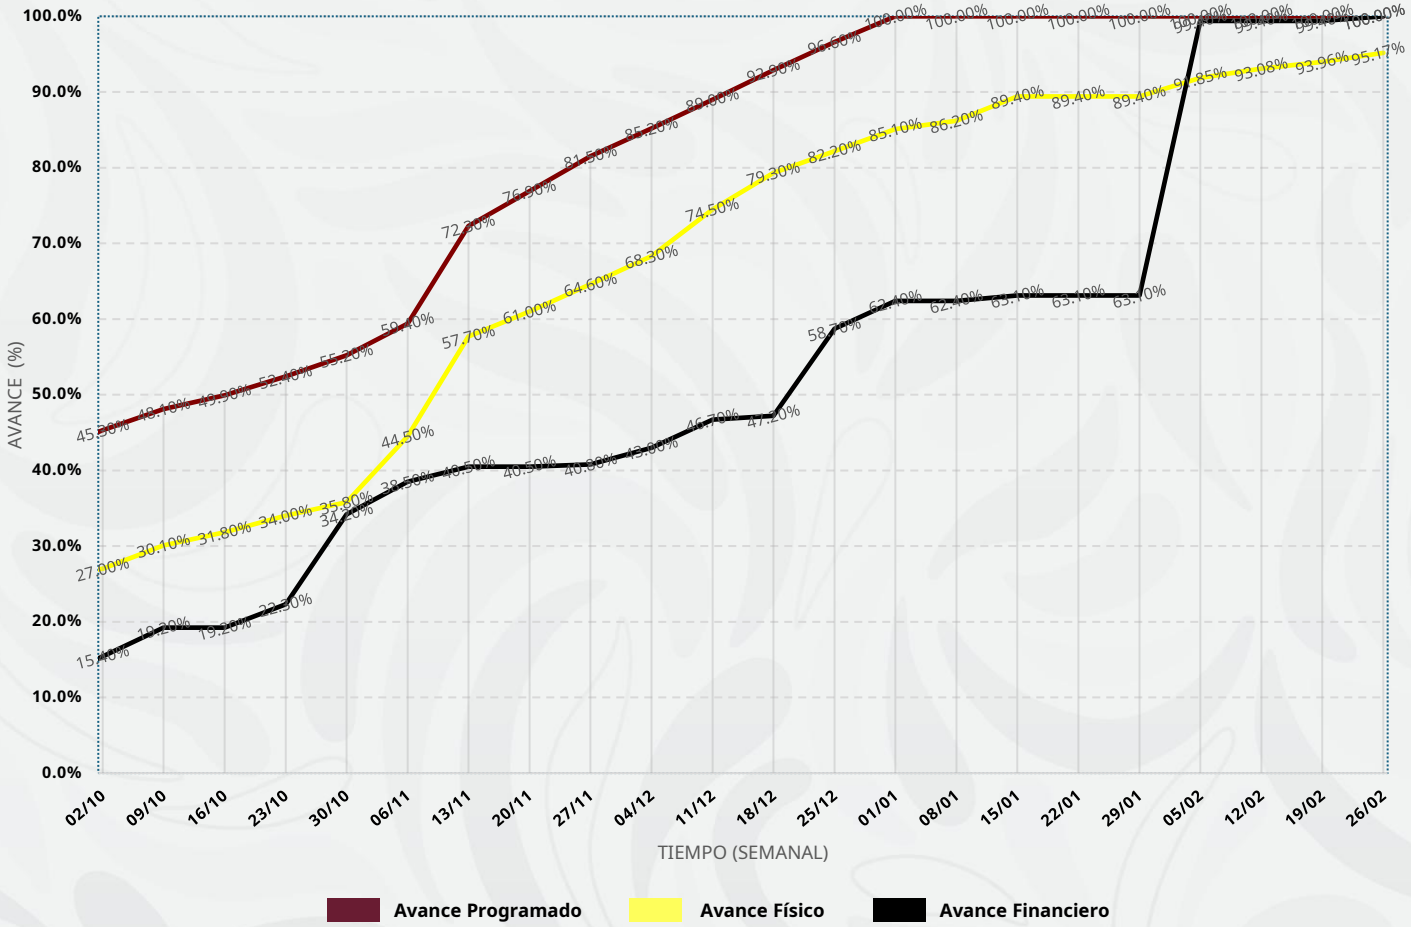

	13 de febrero al 19 de febrero 2026	20 de febrero al 26 de febrero 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	539	426
Maquinaria	218	204
Frentes	45	36

*** 13.58 km se realizó un convenio en reducción de volúmenes del tramo I**
