Guerrero - Puebla

Eje Cuautla – Tlapa

Ramal Igualapa – Chilixtlahuaca - Alacatlatzala

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance global
- Programado: 8.87%
- Real: 8.29%
- Semanal: 0.02%
- Financiero: 4.50%

Avance 2025
- Programado: 100.0%
- Real: 95.26%
- Semanal: 0.17%
- Financiero: 99.51%

Inversión total 2025-2029: 13,652 mdp
- Morelos: 688 mdp
- Puebla: 7,525 mdp
- Guerrero: 5,440 mdp

Meta total 2025-2029: 393 km
- Morelos: 26 km
- Puebla: 159 km
- Guerrero: 208 km

Inversión 2025: 641 mdp*
- Guerrero: 516 mdp
- Puebla: 126 mdp

Meta 2025: 33 km
- Guerrero: 30 km
- Puebla: 3 km

*** Ajuste de decimales**

Inversión 2026: 3,148 mdp
- Guerrero: 750 mdp
- Puebla: 2,398 mdp

Meta 2026: 112 km
- Guerrero: 63 km
- Puebla: 49 km

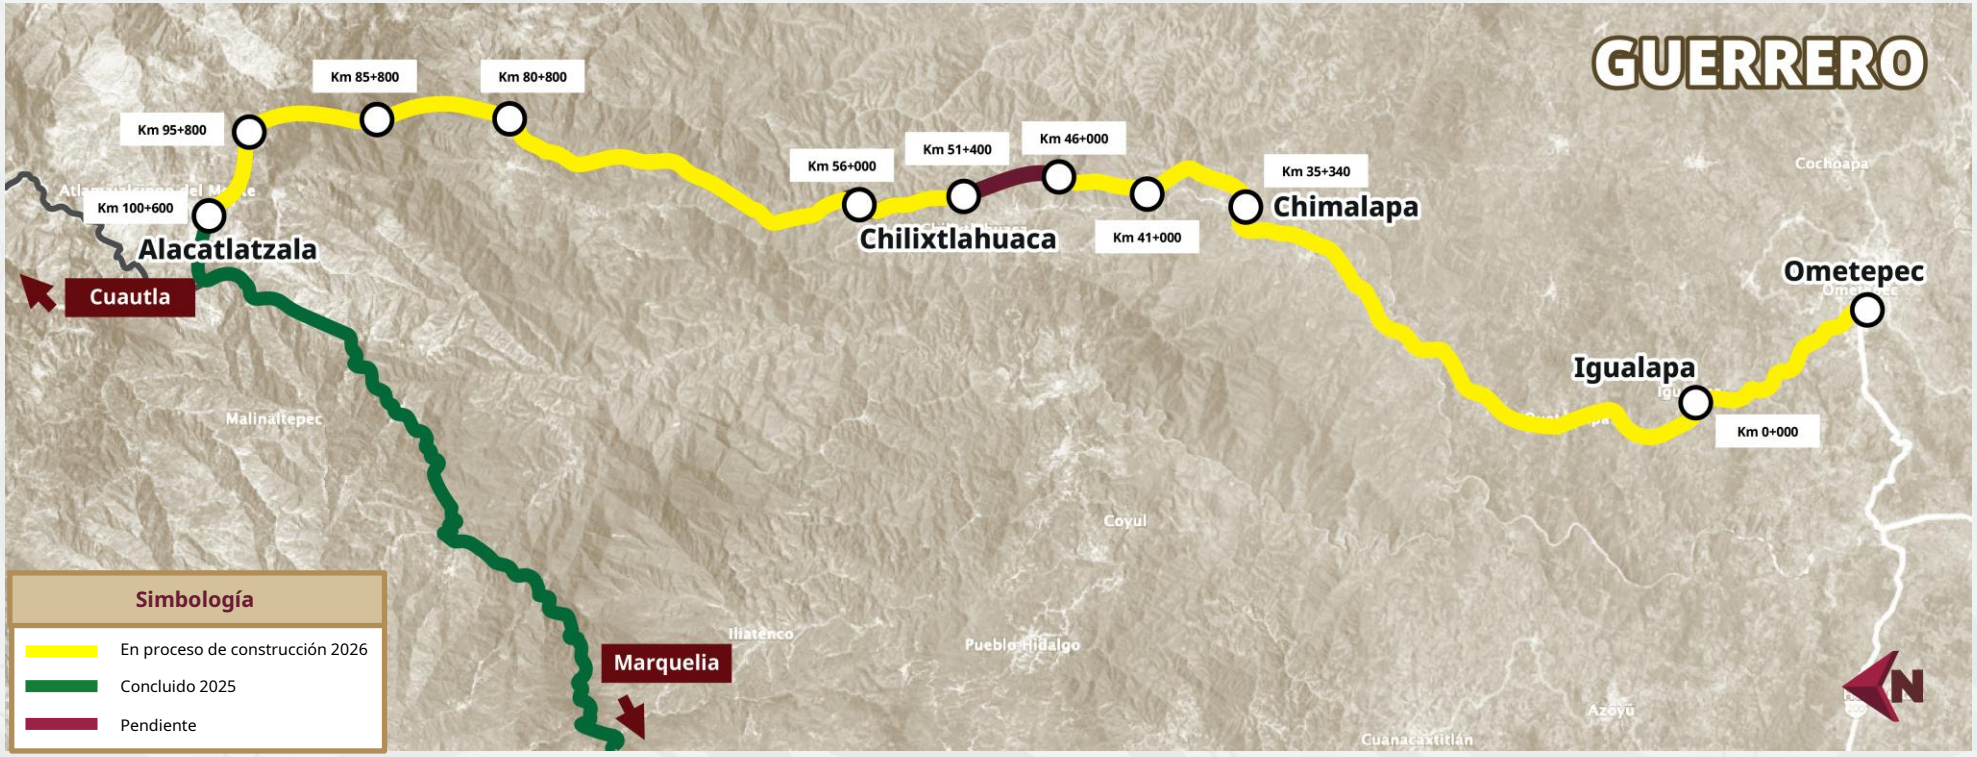

Inicio: 16 de mayo 2025
Término: diciembre 2029
Termino meta 2025: marzo de 2026

40,956 empleos generados

7,750 habitantes beneficiados

1 hora de ahorro en tiempo

Se beneficiará a una población de 7,750 habitantes de los municipios de Igualapa, Cochoapa el Grande, Metlatonoc y Malinaltepec, reduciendo tiempos de traslado.

Guerrero - Puebla

Eje Cuautla – Tlapa
Ramal Igualapa – Chilixtlahuaca - Alacatlatzala

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	27-02-26 al 05-03-26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Trabajos preliminares (km)	30.90	0.00	0.0	0.0	0.0	Trabajos de topografía
Terracerías (km)	30.90	30.86	0.04	0.34	0.16	Desmonte -Despalme -Cortes Terraplenes
Obras de drenaje (Pza.)	141.0	141.0	0.0	0.0	0.0	obras de drenaje
Pavimento (km)	30.9	27.73	3.17	3.3	0.0	Tramos aislados de concreto hidráulico
Señalamiento (km)	30.9	16.18	14.72	14.72	0.02	

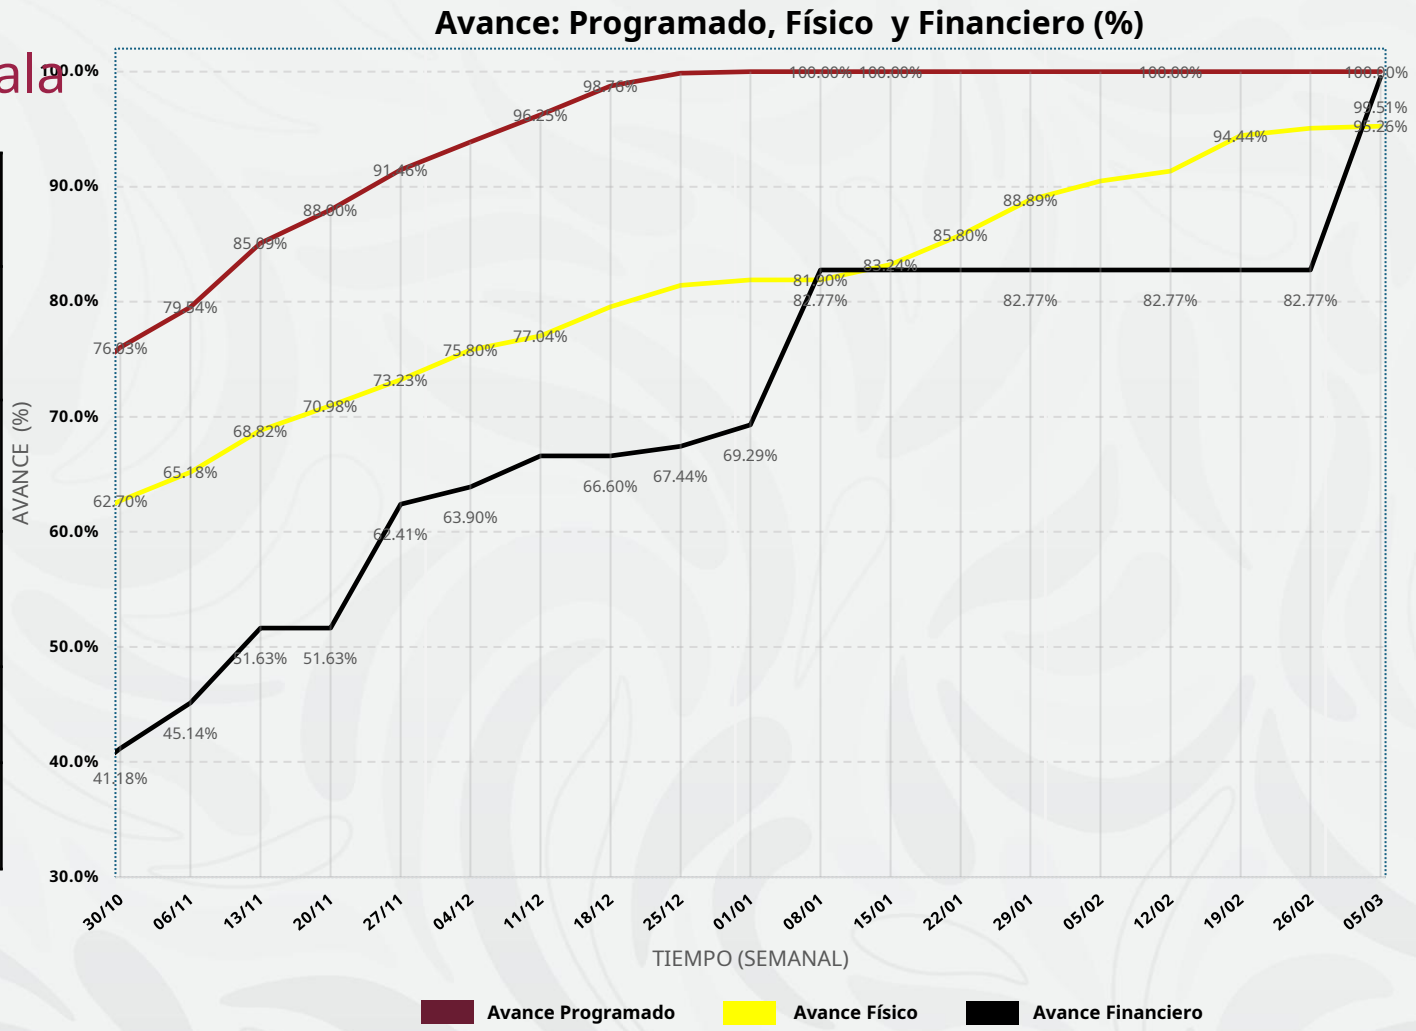

	20 al 26 de febrero	27 de febrero al 05 de marzo
Fuerza de Trabajo (personas)	364	308
Maquinaria	156	138
Frentes de trabajo	22	19
