Tabasco-Campeche

Macuspana-Escárcega (Carretera Federal 186)
Tramo Tabasco

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

META 2025 CONCLUIDA

Avance global
- Programado: 6.84%
- Real: 6.83%
- Semanal: 0.02%
- Financiero: 6.80%

Avance 2026
- Programado: 0.27%
- Real: 0.22%
- Semanal: 0.17%
- Financiero: 0.00%

Inversión total 2025-2028: 21,047 mdp
- **Tabasco:** 8,335 mdp
- **Campeche:** 11,483 mdp
- **Chiapas:** 1,229 mdp

Meta total 2025-2028: |249 km |
Ampliación a 22 m (A4)
Tabasco • 92 km | Chiapas • 14 km | Campeche • 143 km

Inversión 2025: 1,429 MDP **CIERRE PEF 2025**
- **Tabasco:** 1,145 mdp
- **Campeche:** 284 mdp

Meta 2025:
- **Tabasco:** 12 km y 2 puentes
- **Campeche:** 4 km y 2 entronques

Inversión 2026: 3,749 MDP
- **Tabasco:** 3,109 mdp
- **Campeche:** 640 mdp

Meta 2026:
- **Tabasco:** 32 km y 1 puente
- **Campeche:** 8 km

Inicio: 16 de marzo de 2025
Término: Diciembre 2029
Término meta 2025: 28 de febrero de 2026

63,141 empleos generados

760 mil habitantes beneficiados

40 minutos de ahorro en tiempo

Beneficios Incrementaría la capacidad de la vía, mejora el nivel de servicio, reduce los costos de operación vehicular y los tiempos de recorrido de los usuarios, así como el riesgo de accidentes.

249 km longitud total
48 km Ampliados (A4)

Tabasco-Campeche

Macuspana-Escárcega (Carretera Federal 186)
Tramo Tabasco

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Unidad	Intervención total	Ejecutado acumulado	Faltante	27/02/2026 al 05/03/2026	
					Programado	Ejecutado
Desmonte	ha	27.92	19.66	8.26	2.18	5.47
Despalme	m^3	114,134.04	75,963.65	38,170.39	11,076.10	31,333.22
Escalones de Liga	m^3	20,122.39	12,979.40	7,142.99	11,179.40	2,137.10
Cortes	m^3	88,979.83	33,650.23	55,329.60	7,941.05	30,500.23
Pedraplén	m^3	151,364.26	29,715.50	121,648.76	13,128.09	26,165.50
Geotextil	m^2	159,125.66	21,644.99	137,480.67	21,644.99	10,279.43
Geomalla	m^2	173,510.17	28,194.21	145,315.96	28,194.21	7,404.66
Pilotes de 120 cm de diámetro	pza	34.00	6.00	28.00	3.60	5.00

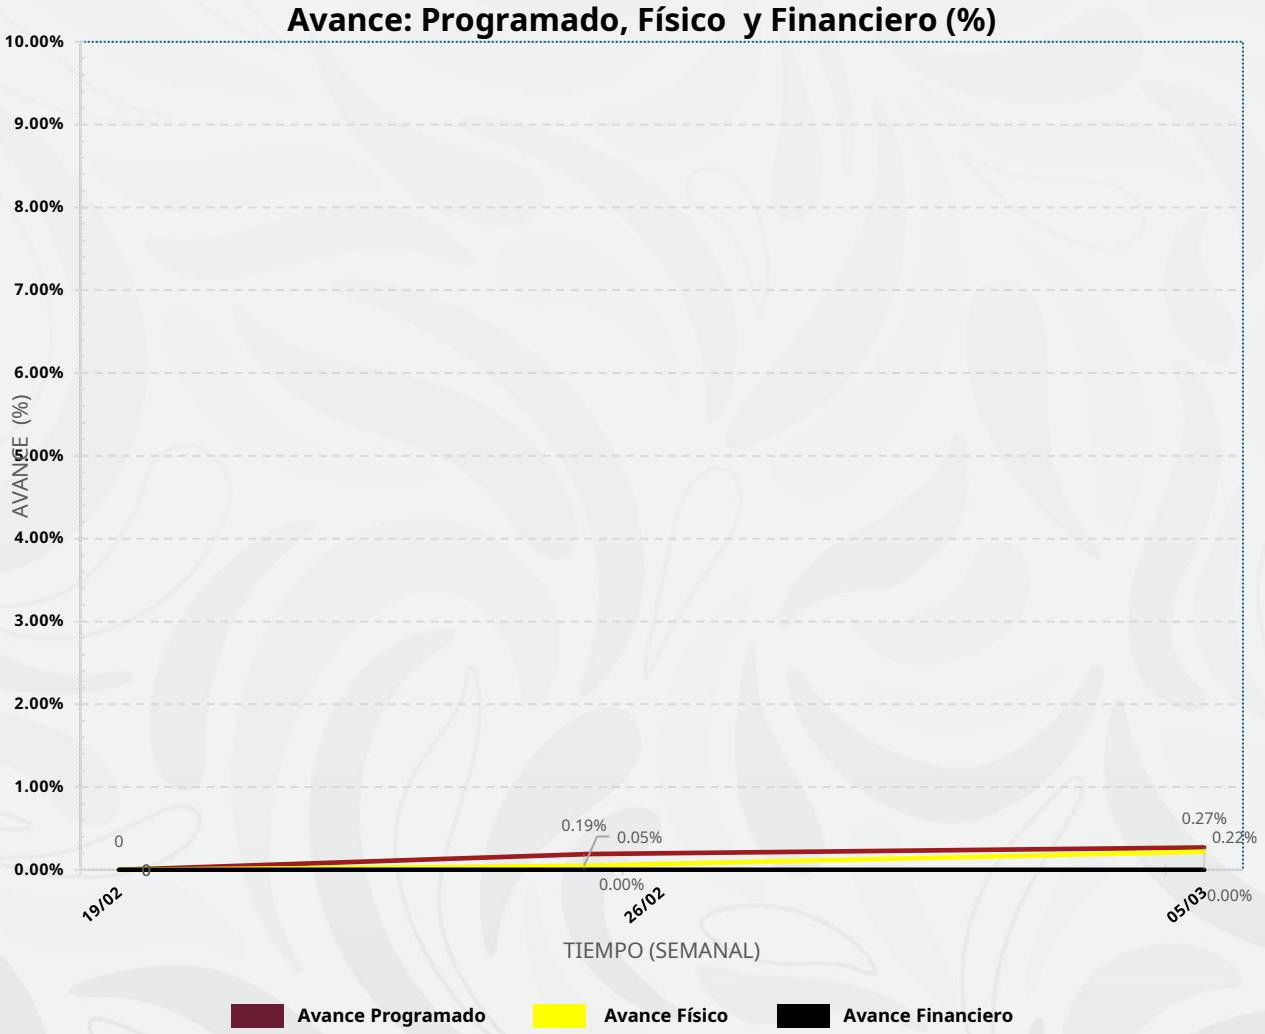

	20 de febrero al 26 de febrero	27 de febrero al 05 de marzo
Fuerza de Trabajo (personas)	125	142
Maquinaria	19	31
Frentes de trabajo	14	15
