Salina Cruz-Zihuatanejo (MEX-200)

Tramo Guerrero

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance global
- Programado: 6.54%
- Real: 6.27%
- Semanal: 0.05%
- Financiero: 6.54%

Avance 2025
- Programado: 100.0%
- Real: 95.91%
- Semanal: 0.26%
- Financiero: 100.0%

	Descripción
1	**Puente Las Vigas** Km 81+200 | 123 m
2	**Puente Río Nexpa** Km 85+300 | 425 m
3	**Puente Agua Hedionda** Km 106+760 | 21 m
4	**Puente Copala** Km 116+000 | 120 m
5	**Puente Marquelia I** Km 135+500 | 220 m
6	**Puente Talapilla** Km 171+857 | 41 m
7	**Puente Río Quetzala** Km 173+711 | 190 m
8	**Puente Santa Catarina** Km 184+744 | 101 m
9	**Tramo 9** IG=km 209+500 AT – km 209+240 AD al km 219+540 | 10.30 km
10	**Tramo 10** km 219+540 al km 229+600 |10.06 km
11	**Tramo 11** km 229+600 al km 234+843.77 | 5.24 km

Inversión total 2025-2030: 24,722 mdp
- Guerrero: 6,641 mdp
- Oaxaca: 18,081 mdp

Meta total 2025-2030: 423 km
- Guerrero: 103 km
- Oaxaca: 319 km

Inversión 2025: 1,616 mdp
- Guerrero: 725 mdp
- Oaxaca: 891 mdp

Meta 2025: 27 km
- Guerrero: 1 km
- Oaxaca: 26 km

Inversión 2026: 2,754 mdp
- Oaxaca: 2,754 mdp

Meta 2026: 37 km

Inicio : 1 de abril de 2025
Termino: 31 de diciembre 2029
Término meta 2025: 20 de febrero de 2026

74,166 empleos generados

1,947,399 habitantes beneficiados

Beneficios: Reducción en tiempos de traslados de la Costa Chica de Gro. hacia Puerto Escondido Oax., reduciendo costos operativos e impulsando el turismo local y nacional de los municipios de Acapulco, San Marcos, Florencio Villareal, Cuajinicuilapa, Pinotepa Nacional, Villa de Tututepec, San Pedro Mixtepec, Pochutla y Huatulco.

Oaxaca/Guerrero

Salina Cruz-Zihuatanejo (MEX-200)

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Meta	Ejecutado Acumulable	Faltante	26-02-26 al 05-03-26	
				Programado	Ejecutado
Troncal	*13.58 km	*12.88 km	*0.70 km	0.0%	0.5%
8 puentes	8 pts	94.01% de 8 pts	5.99% de 8 pts	0.0%	0.3%

OBSERVACIONES

Oaxaca

Tramo 1 (0 frentes de trabajo)
Concluido.
Tramo 2 (7 frentes de trabajo)
Cribado de material para base asfáltica, y producción de mezcla asfáltica para carpeta, en banco de materiales ubicado en el km. 224+250 desviación izquierda 50 m. y tendido y compactación de la primera y segunda capa de base asfáltica del km. 224+500 al km. 224+900, franja central y derecha y Extracción y triturado de material para base hidráulica, y producción de base asfáltica en banco de materiales ubicado en carretera a Cuatunalco en el km. 225+700 desviación derecha 1,300 m.
Tramo 3 (4 frentes de trabajo)
Trabajos de colocación de señalamiento definitivo del km 229+600 al km 231+380, colocación de señalamiento definitivo del km 233+300 al km 234+843.77, tendido de carpeta asfáltica, km 233+300 al km 234+843.77 y trabajos de obras complementaria del km 233+300 al km 234+843.77.

Guerrero

Puente Las Vigas km 81+200: Concluido.
Puente Agua Hedionda Km 106+760: Concluido.
Puente Copala Km 116+000: Concluido.
Puente Marquelia I km 135+500: Concluido.
Puente Nexpa km 85+300: Cimbrado de losas, colado de losas, terracerías en rampa de acceso, colado muro de contención.
Puente Talapilla km 171+857: Suministro y tendido de base asfáltica, 14 cm de espesor ,compactada al 95%.
Puente Rio Quetzala Km 173+711: Perforación de pilotes de 1.50 m de diámetro lado derecho 2da etapa**,** Habilitado armado de acero de refuerzo para pilotes lado derecho 2da etapa, conformación de plataforma lado derecho 2da etapa.
Puente Santa Catarina km 183+740: Cimbrado y armado de acero de refuerzo para cabezal y bancos en pilas no, 2 y 3. lado izquierdo 2da etapa, Montaje de trabes AASHTO tipo V; de 35.86 longitud y 1.60 m, de peralte. lado izquierdo 2da etapa.

Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Salina Cruz - Zihuatanejo

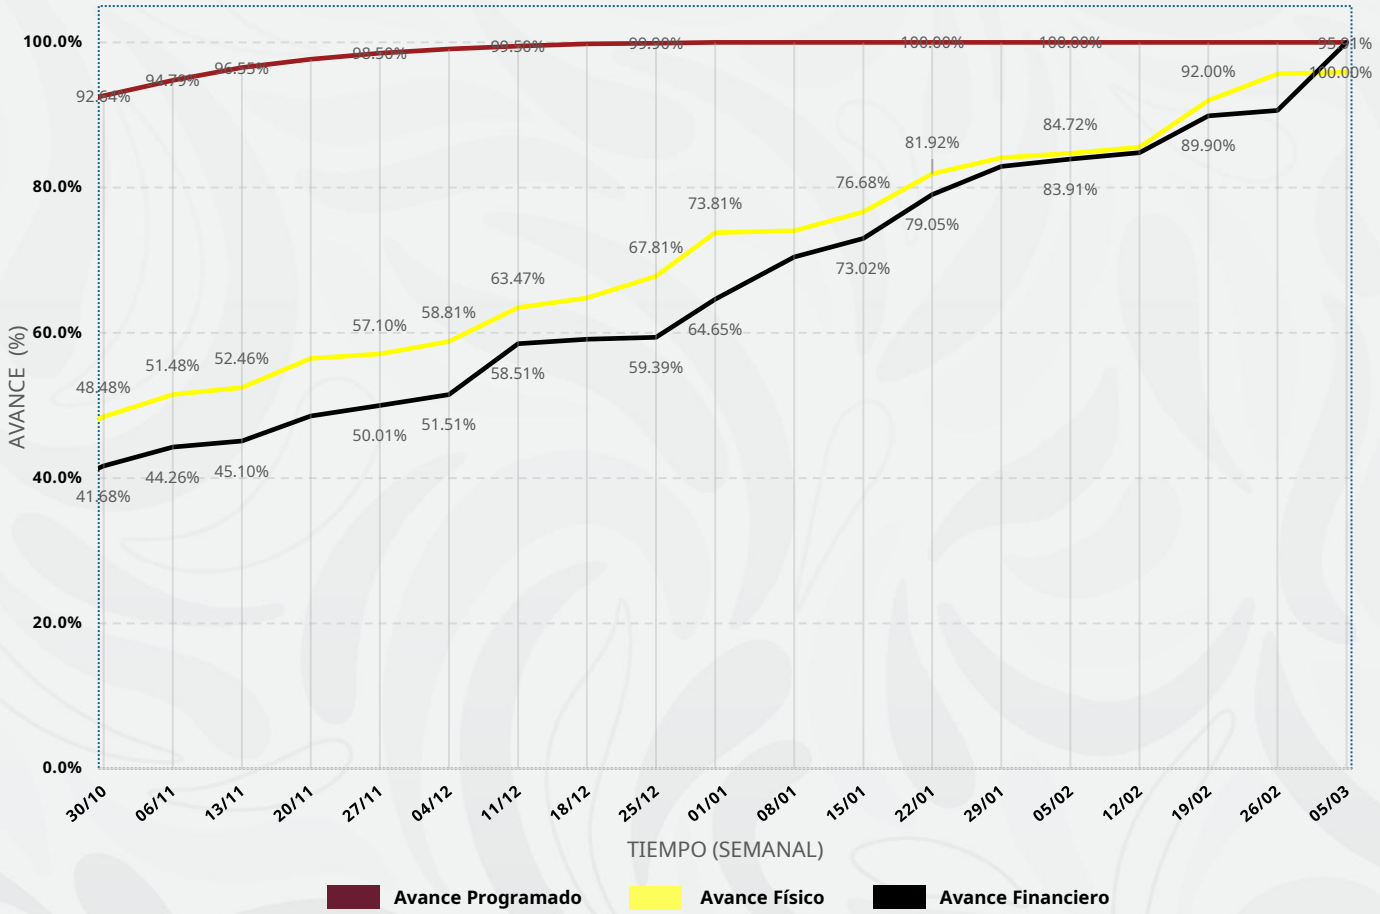

	20 de febrero al 26 de febrero 2026	27 de febrero al 05 de marzo 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	426	288
Maquinaria	204	174
Frentes	36	24

*** 13.58 km se realizó un convenio en reducción de volúmenes del tramo I**
