Toluca- Zihuatanejo

Toluca- Zihuatanejo (Carretera Federal 134)
Tramo Estado de México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance global
- Programado: 3.70%
- Real: 3.66%
- Semanal: 0.01%
- Financiero: 3.50%

Avance 2025
- Programado: 96.76 %
- Real: 95.90%
- Semanal: 0.25%
- Financiero: 91.52%

Avance programado conforme a la ampliación de monto y plazo del 6to, 7mo y 8vo Convenio Modificatorio, con fecha de conclusión al 15-abr-26

Inversión total: 26,969 mdp
- Edo. Méx.:7,220 mdp *
- Gro.: 19,750 mdp *

Meta total: 372 km
- Edo. Méx.: 87 km *
- Gro.: 286 km*

Inversión 2025: 946 mdp
- **Edo. Méx.:** 945.21 mdp

Meta 2025: 12 km, 1 paso a desnivel, 1 puente y 3 entronques (Estado de México)

Inversión 2026: 2,668 mdp
- **Edo. Méx.:** 2,668 mdp

Meta 2026: 38 km (Estado de México)

Nota: De la asignación 2026 se consideran 87.57 mdp para el pago del Séptimo y Octavo Convenio Modificatorio correspondientes del km 13 al km 25, con fecha de conclusión el 15/abr/26

Inicio: 09 de mayo de 2025
Término meta-2025: 15-abril-2026
Término meta-2026: Diciembre 2026
Término total: Diciembre 2029

*Redondeado

80,907 empleos generados

1 millón 480 mil habitantes beneficiados

2 horas 35 minutos de ahorro en tiempo

Beneficios Mejorar las condiciones de tránsito, reduciendo el riesgo de accidentes, así mismo se reducen los tiempos traslados, garantizando una mejor conectividad que contribuye al desarrollo económico y turístico del Centro – Poniente del país.

Toluca- Cd. Altamirano

Toluca- Zihuatanejo (Carretera Federal 134)

Km 13+000 – km 25+000

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Intervención	Unidad	Ejecutado acumulado	Faltante	27/feb/26 al 05/mar/26 Programado	Ejecutado
Despalme y cortes	352,510.36	m³	352,510.36	0	-	0
Alcantarillas tubulares	787.28	m	787.28	0	-	0
Cpo. Terraplén, Subyacente y Subrasante	278,677.81	m³	278,677.81	0	-	0
Base hidráulica	47,257.62	m³	47,257.62	0	-	0
Base asfáltica	27,971.34	m³	27,971.34	0	-	282.58
Carpeta asfáltica	17,063.24	m³	6,789.34	10,273.9	-	956.74
Señalamiento Horizontal	52.75	Km	10.5	42.25	-	10.5
Señalamiento Vertical	699	Pzs	38	661	-	0
Excavación para zapatas y muros	9,738	m³	9,738	0	-	0
Acero de refuerzo en zapatas y muros	184,094.8	Kg	184,094.8	0	-	0
Concreto f'c=250 km/cm² en zapatas y muros	2,186	m³	2,186	0	-	0
Relleno para zapatas y muros	5,566.9	m³	5,566.9	0	-	0
Pilotes ⌀=1.2 m, f'c=250 kg/cm²	530	Pzs	530	0	-	0
Columnas ⌀=1.2 m, f'c=250 kg/cm²	530	Pzs	530	0	-	0
Cabezales f'c=250 kg/cm²	11	Pzs	11	0	-	0
Fabricación AASHTO tipo "V", f'c=400 kg/cm²	88	Pzs	88	0	-	0
Transporte y montaje de Trabes AASHTO "V"	88	Pzs	88	0		0
Fabricación de trabes tipo Tabletas, f'c=350 kg/cm²	51	Pzs	51	0	-	0
Transporte y montaje de trabes tipo Tabletas	51	Pzs	51	0	-	0
Losas f'c=250 kg/cm²	9	Pzs	9	0	-	0
Guarnición f'c=250 kg/cm²	1,886.61	m	1,886.61	0	-	0
Parapeto metálico	2,570.02	m	2,475.59	94.43	-	0
Carpeta asfáltica	225.8	m³	197.4	28.4	-	0
Junta de dilatación	270.9	m	270.9	0	-	0
Muro Mecánicamente Estabilizado	4,316.5	m²	4,316.5	0	-	0
Relleno para MME	39,148.8	m³	39,148.8	0	-	0
Losas de acceso	2	Pzs	2	0	-	0

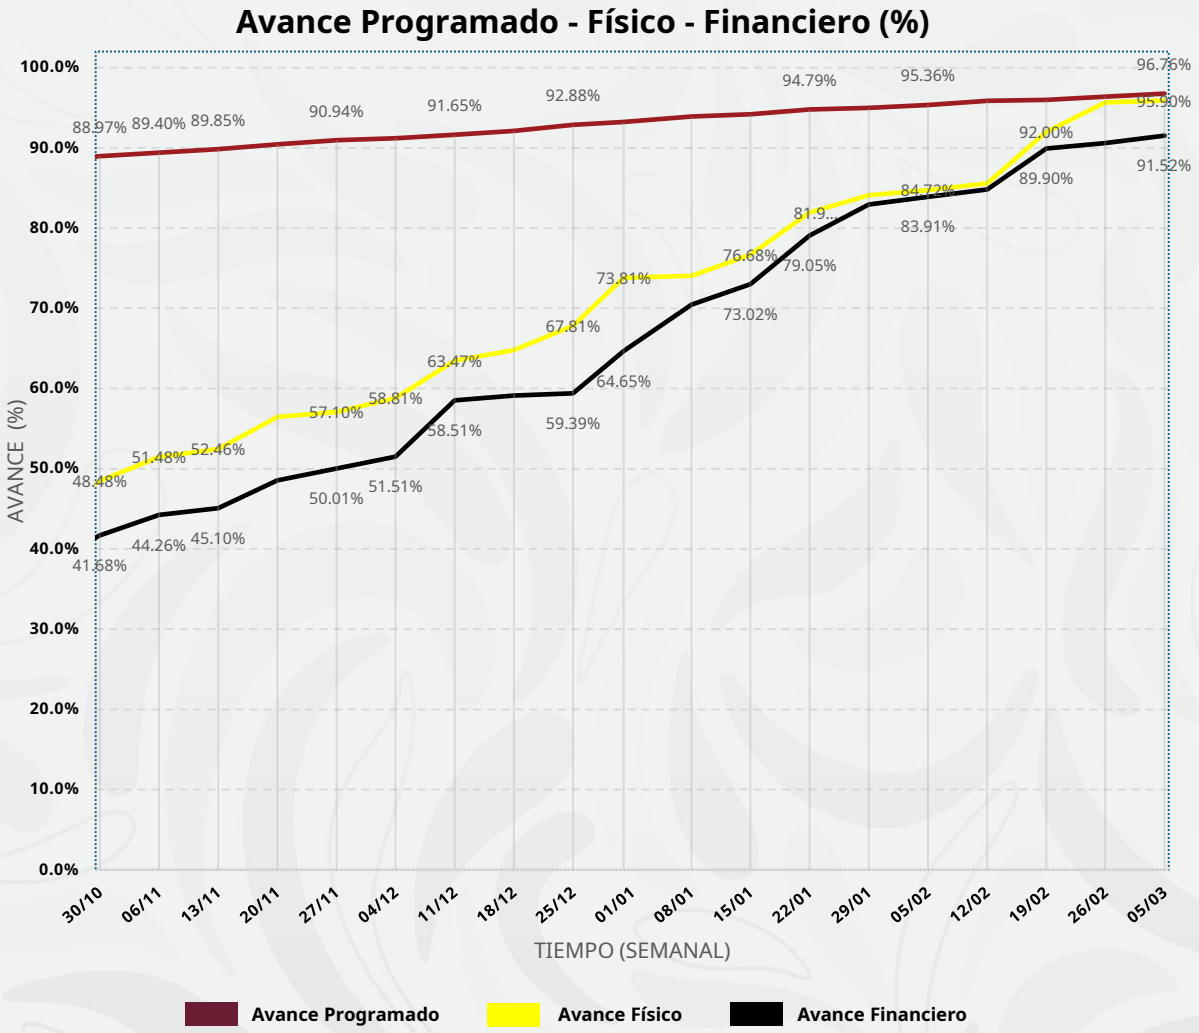

	Del 20 al 26 de febrero de 2026	Del 27 de febrero al 05 de marzo de 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	393	396
Maquinaria	225	221
Frentes de Trabajo	9	9
