Guerrero - Puebla

Eje Cuautla – Tlapa

Ramal Igualapa – Chilixtlahuaca - Alacatlatzala

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance global
- Programado: 9.56%
- Real: 9.15%
- Semanal: 0.20%
- Financiero: 4.50%

Avance 2025
- Programado: 100.0%
- Real: 98.38%
- Semanal: 0.30%
- Financiero: 100.0%

Avance 2026
- Programado: 3.02%
- Real: 2.05%
- Semanal: 0.59%
- Financiero: 0.0%

Inversión total 2025-2029: 13,652 mdp
- Morelos: 688 mdp
- Puebla: 7,525 mdp
- Guerrero: 5,440 mdp

Meta total 2025-2029: 393 km
- Morelos: 26 km
- Puebla: 159 km
- Guerrero: 208 km

Inversión 2025: 641.2 mdp
- Guerrero: 515.5 mdp
- Puebla: 125.7 mdp

Meta 2025: 33 km
- Guerrero: 30 km
- Puebla: 3 km

Inversión 2026: 3,148 mdp
- Guerrero: 750 mdp
- Puebla: 2,398 mdp

Meta 2026: 112 km
- Guerrero: 63 km
- Puebla: 49 km

Inicio meta 2026: 17 de febrero 2026

Inicio: 16 de mayo 2025
Término: diciembre 2029
Termino meta 2025: marzo de 2026

40,956 empleos generados

7,750 habitantes beneficiados

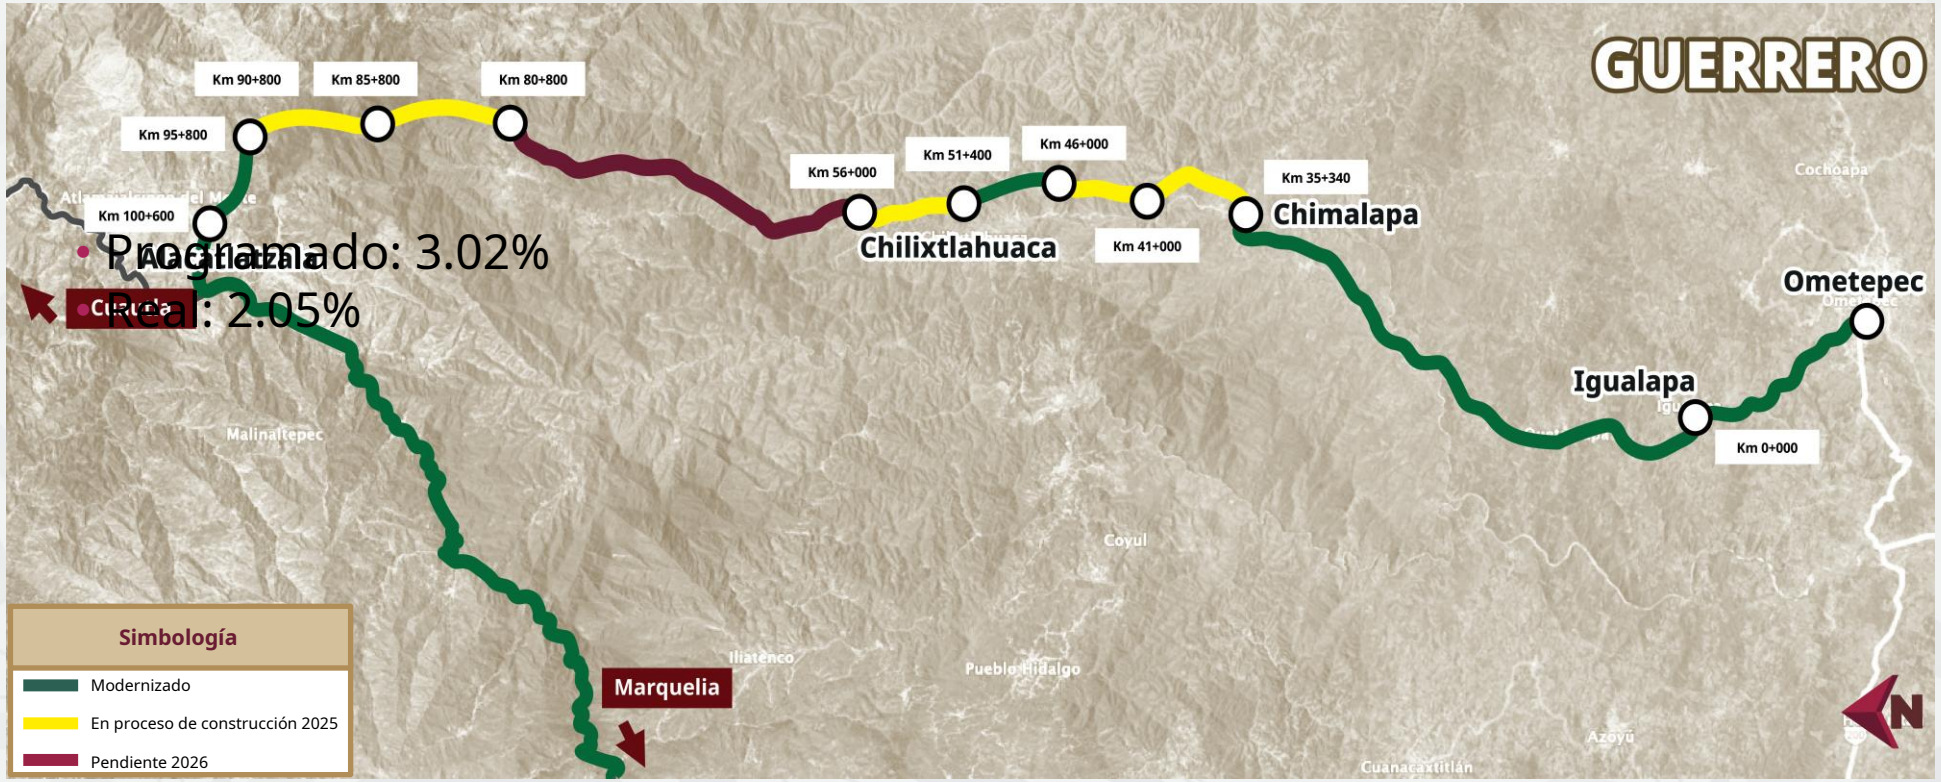

1 hora de ahorro en tiempo

Se beneficiará a una población de 7,750 habitantes de los municipios de Igualapa, Cochoapa el Grande, Metlatonoc y Malinaltepec, reduciendo tiempos de traslado.

Guerrero - Puebla

Eje Cuautla – Tlapa

Ramal Igualapa – Chilixtlahuaca - Alacatlatzala

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	20-03-26 al 02-04-26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Trabajos preliminares (km)	30.90	0.00	0.0	0.0	0.0	Trabajos de topografía
Terracerías (km)	30.90	30.90	0.0	0.0	0.0	Desmonte -Despalme -Cortes Terraplenes
Obras de drenaje (Pza.)	141.0	141.0	0.0	0.0	0.0	obras de drenaje
Pavimento (km)	30.9	29.1	1.8	1.8	0.7	Tramos aislados de concreto hidráulico
Señalamiento (km)	30.9	25.90	5.0	5.00	3.1	Horizontal y vertical

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

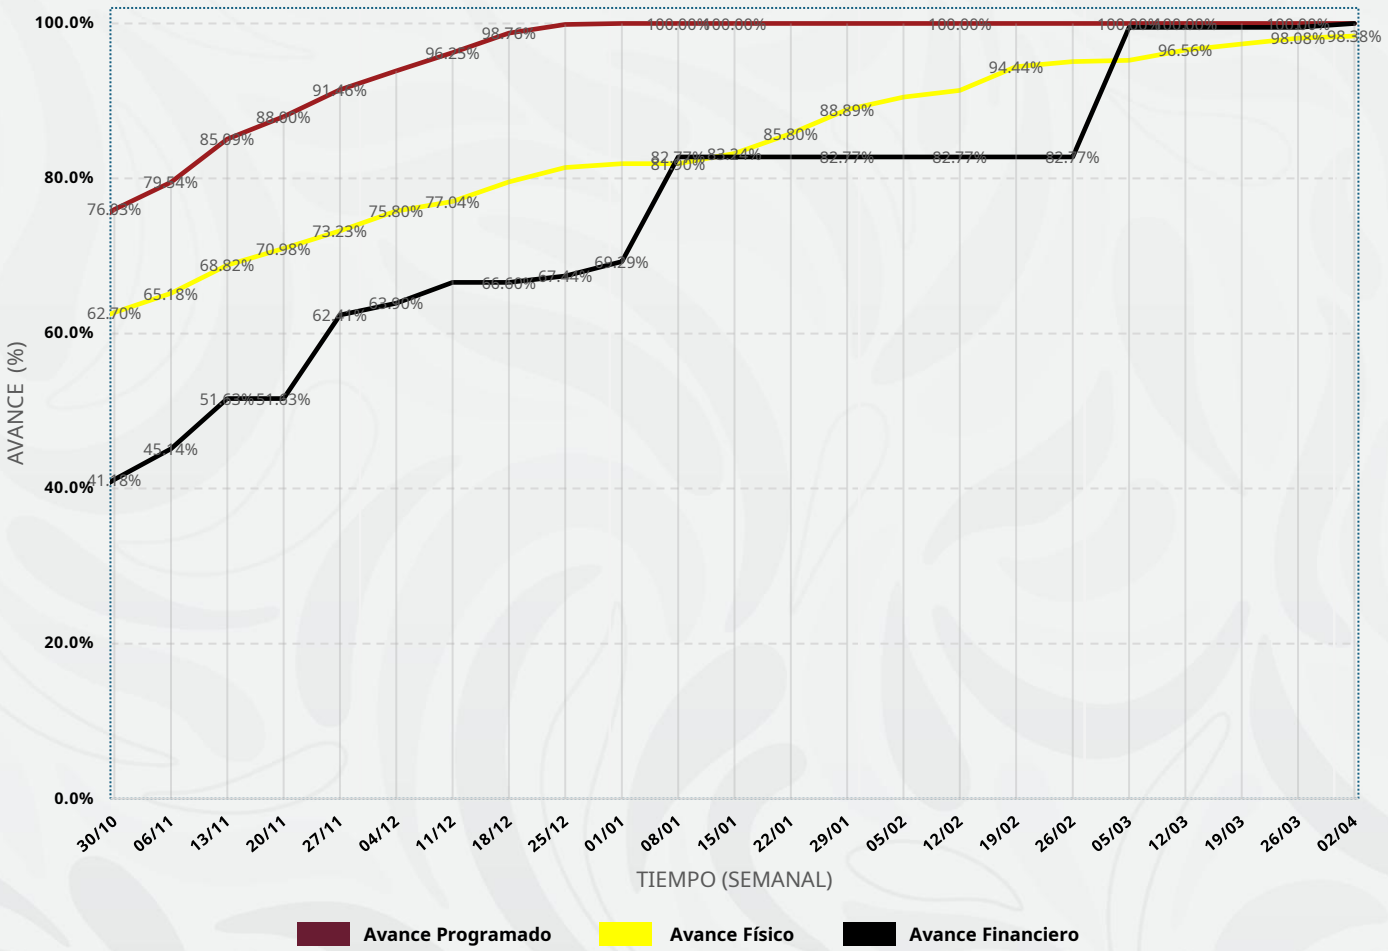

	20 al 26 de marzo	27 de marzo al 02 de abril
Fuerza de Trabajo (personas)	131	19
Maquinaria	64	34
Frentes de trabajo	8	2
