Guaymas – Esperanza – Yécora - Chihuahua

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance 2025

Avance Programado: 100.0 %
Avance Real: 93.65 %
Avance Financiero: 50.80 %

Inversión total: 10,228 mdp
- Sonora: 5,935 mdp
- Chihuahua: 4,293 mdp

Meta total: 450 km
- Sonora: 252 km, 4 puentes
- Chihuahua: 198 km

Inversión 2025: 450 mdp
- Sonora: 450 mdp

Meta 2025: 10 km.
- Sonora: 10 km y 4 puentes

Inversión 2026: 2,000 mdp
- Sonora: 2,000 mdp

Meta 2026: 47 km.
- Sonora: 47 km y 8 puentes

Inicio : 20 de octubre de 2025
Termino: diciembre de 2029
Término meta 2025: 30 de abril de 2026

30,684 empleos generados

669,912 habitantes beneficiados

Beneficios:
- Derrama económica regional.
- Fortalecimiento de exportaciones.
- Impulso al crecimiento turístico.
- Mejora en los puntos de salida para la producción agropecuaria, manufacturera e industrial.

Guaymas – Esperanza – Yécora - Chihuahua

Km 17+300 al Km 32+300

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	27-03-26 al 02-04-26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Trabajos preliminares (km)	9.97	9.97	-	-	-	-
Terracerías (km)	9.97	9.97	-	-	-	-
Obras de drenaje (Pza)	23	23	-	-	-	-
Pavimento (km)	9.97	8.17	1.80	0.0	0.0	-
Señalamiento (km)	9.97	8.0	1.97	0.0	0.0	-
Construcción Puente I (Canal alto)	100%	79.00%	21.00%	9.0%	9.0%	-
Construcción Puente II (Agua Caliente)	100%	98.00%	2.00%	2.00%	2.00%	-
Construcción Puente III (Chinitos I)	100%	97.00%	3.00%	2.00%	2.00%	-
Construcción Puente IV (Chinitos II)	100%	97.00%	3.00%	2.00%	2.00%	-

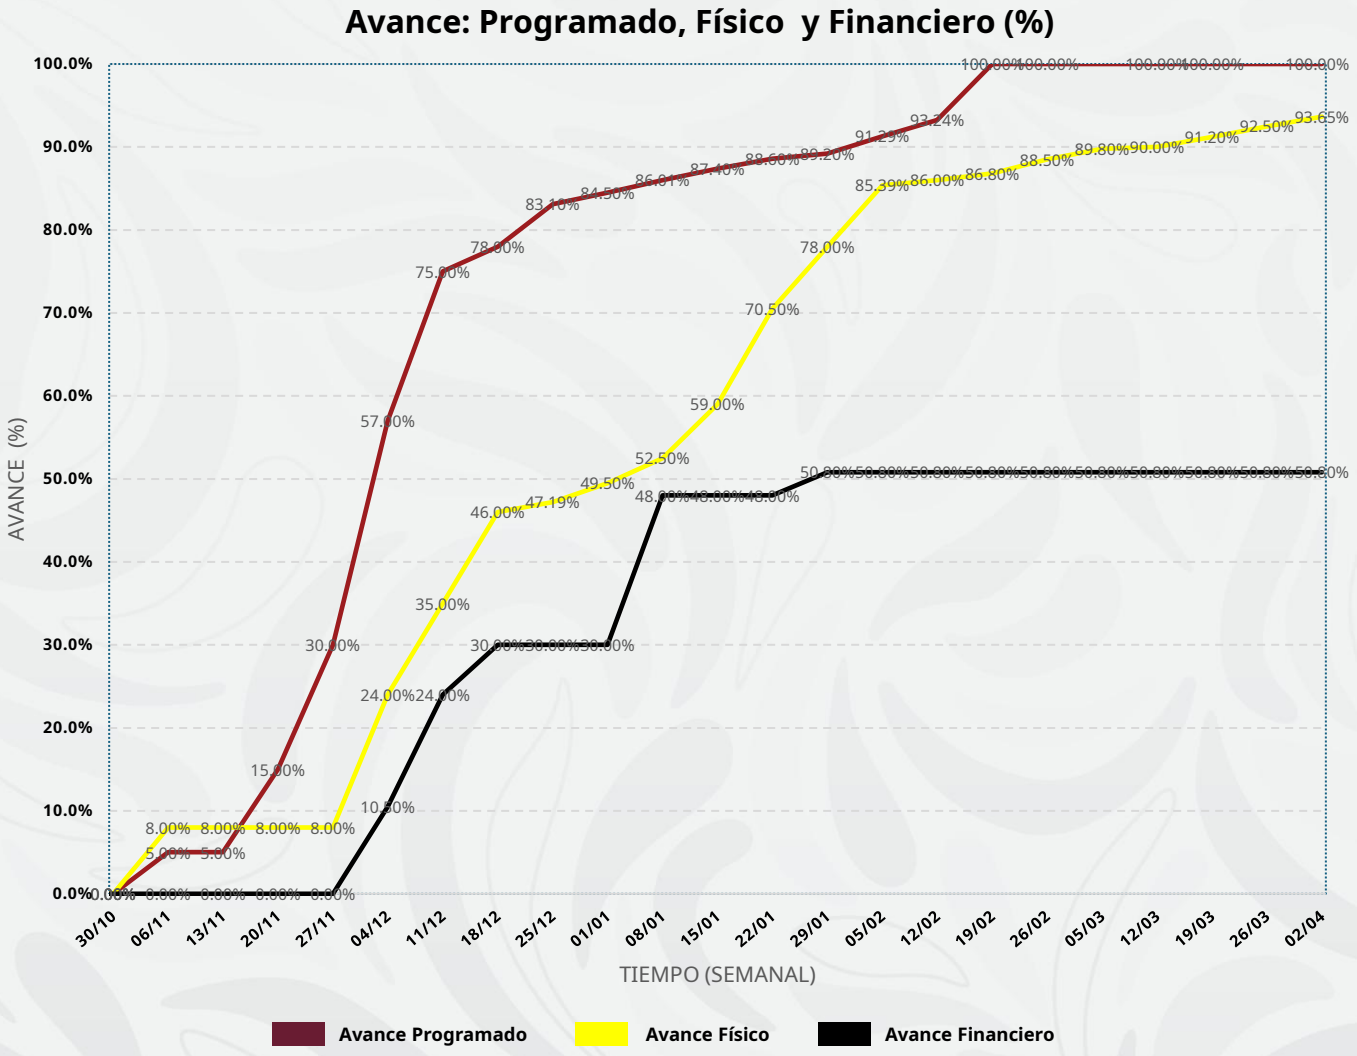

	20 de marzo al 26 de marzo 2026	27 de marzo al 02 de abril 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	280	250
Maquinaria	40	40
Frentes de trabajo	12	10
