Tabasco-Campeche

Macuspana-Escárcega (Carretera Federal 186)

Tramo Tabasco

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance global
- Programado: 6.88%
- Real: 6.90%
- Semanal: 0.03%
- Financiero: 6.90%

Avance 2026
- Programado: 0.66%
- Real: 0.76%
- Semanal: 0.19%
- Financiero: 0.76%

Inversión total 2025-2028: 21,047 mdp
- **Tabasco:** 8,335 mdp
- **Campeche:** 11,483 mdp
- **Chiapas:** 1,229 mdp

Meta total 2025-2028: |249 km |
Ampliación a 22 m (A4)
Tabasco • 92 km | Chiapas • 14 km | Campeche • 143 km

Inversión 2025: 1,429 MDP
- **Tabasco:** 1,145 mdp
- **Campeche:** 284 mdp

Meta 2025:
- **Tabasco:** 12 km y 2 puentes
- **Campeche:** 4 km y 2 entronques

Inversión 2026: 3,749 MDP
- **Tabasco:** 3,109 mdp
- **Campeche:** 640 mdp

Meta 2026: 39 km

Inicio: 16 de marzo de 2025
Término: Diciembre 2029
Término meta 2025: 28 de febrero de 2026

63,141 empleos generados

760 mil habitantes beneficiados

40 minutos de ahorro en tiempo

Beneficios Incrementaría la capacidad de la vía, mejora el nivel de servicio, reduce los costos de operación vehicular y los tiempos de recorrido de los usuarios, así como el riesgo de accidentes.

Tabasco-Campeche

Macuspana-Escárcega (Carretera Federal 186)
Tramo Tabasco

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento.	Unidad	Intervención total	Ejecutado	Faltante	27/03/2026 al 02/04/2026	
			acumulado		Programado	Ejecutado
Desmonte	ha	27.92	23.48	4.44	2.18	1.49
Despalme	m^3	115,589.04	100,733.48	14,855.56	11,076.10	4,310.64
Escalones de Liga	m^3	20,122.39	15,258.86	4,863.53	2,137.10	521.91
Cortes	m^3	114,909.49	60,201.37	54,708.12	7,941.05	5,392.73
Pedraplén	m^3	151,364.26	99,139.50	52,224.76	13,128.09	18,633.00
Geotextil	m^2	159,125.66	71,240.86	87,884.80	10,279.43	14,913.29
Geomalla	m^2	173,510.17	83,781.92	89,728.25	7,404.66	18,396.92
Terraplén	m^3	320,776.23	101,434.53	219,341.70	6,251.87	32,867.48
Subyacente	m^3	132,720.47	36,895.66	95,824.81	638.73	16,988.00
Obras de drenaje	pza	95.00	16.00	79.00	17.00	7.00
Columnas de 1.20 m de diámetro	pza	34.00	16.00	18.00	3.80	4.00
Trabes Aashto IV de 1.35 m x 30.60 m (fabricación)	pza	60.00	4.00	56.00	3.50	2.00
Demolicion de pilotes (Descabece)	pza	160.00	26.00	134.00	0.00	14.00

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

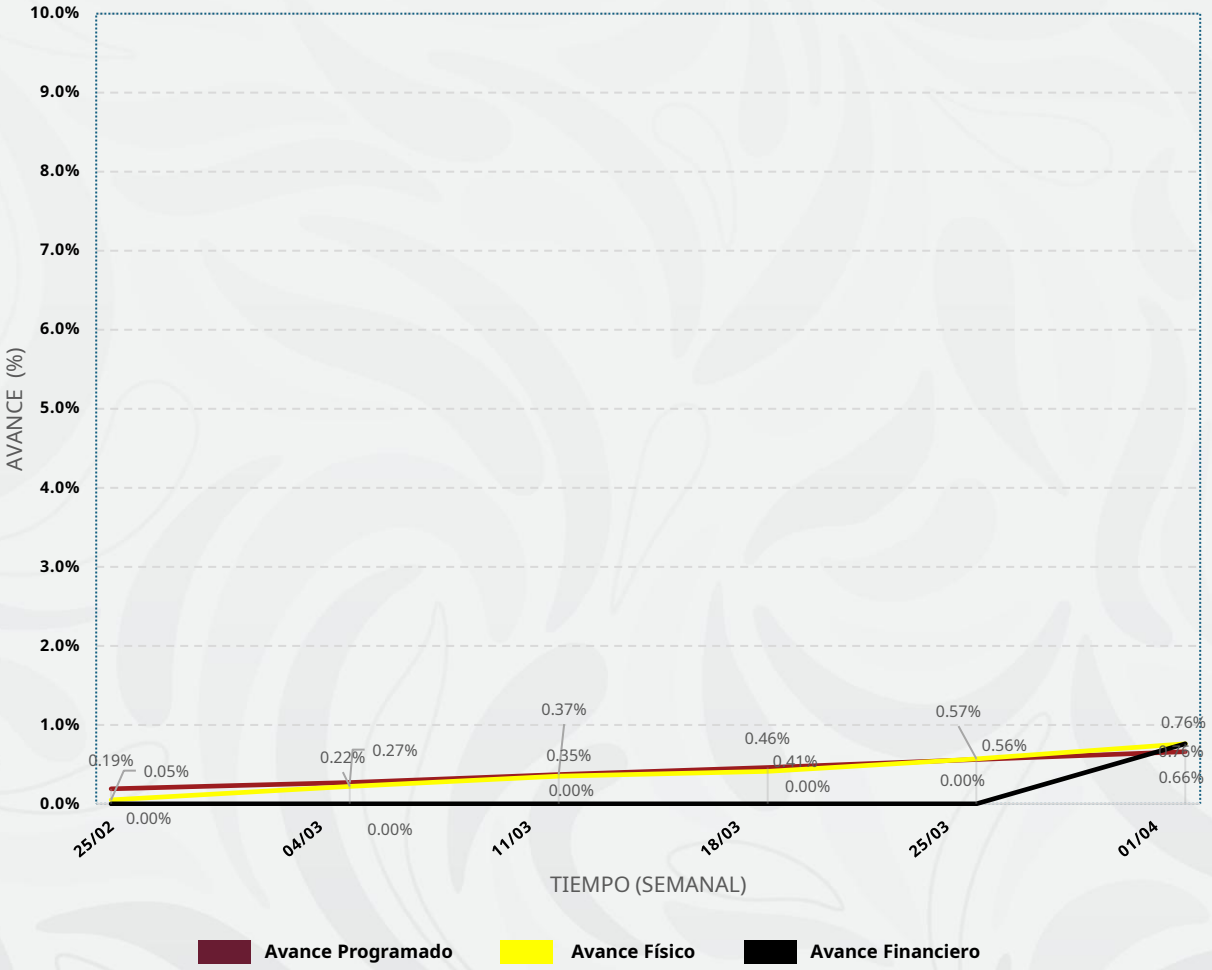

	20 de marzo al 26 de marzo	26 de marzo al 02 de abril
Fuerza de Trabajo (personas)	298	435
Maquinaria	120	126
Frentes de trabajo	24	26
