San Luis Potosí - Hidalgo

Tamazunchale – Huejutla – Pachuca

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance global
- Programado: 25.56%
- Real: 24.93%
- Semanal: 0.34%
- Financiero: 24.72%

Avance 2025
- Programado: 100%
- Real: 99.74%
- Semanal: 0.64%
- Financiero: 99.74%

Avance 2026
- Programado: 0.84%
- Real: 0.21%
- Semanal: 0.0%
- Financiero: 0.0%

El avance considerado en el 2026 corresponde a los convenios por obra complementaria de los tramos contratados en 2025.

Inversión total 2025-2028: 6,674 mdp
- Hidalgo: 3,779 mdp
- SLP: 2,895 mdp

Meta total 2025-2028: 158 km
Hidalgo:
- 130 km

San Luis Potosí:
- 28 km

Inversión 2025: 1,650 mdp
- Hidalgo: 821.66 mdp
- San Luis Potosí: 827.86 mdp

Meta 2025: 26.8 km
- Hidalgo: 16.8 km
- San Luis Potosí: 10 km

Inversión 2026: 2,490 mdp
- Hidalgo: 1,861 mdp
- San Luis Potosí: 629 mdp

Meta 2026: 65.8 km
- Hidalgo: 58.5 km (3.2 km Contratos 2025)
- San Luis Potosí: 7.3 km

Inicio : 28 de abril 2025
Término: diciembre 2028
Término meta 2025: 28 de febrero de 2025

20,022 empleos generados

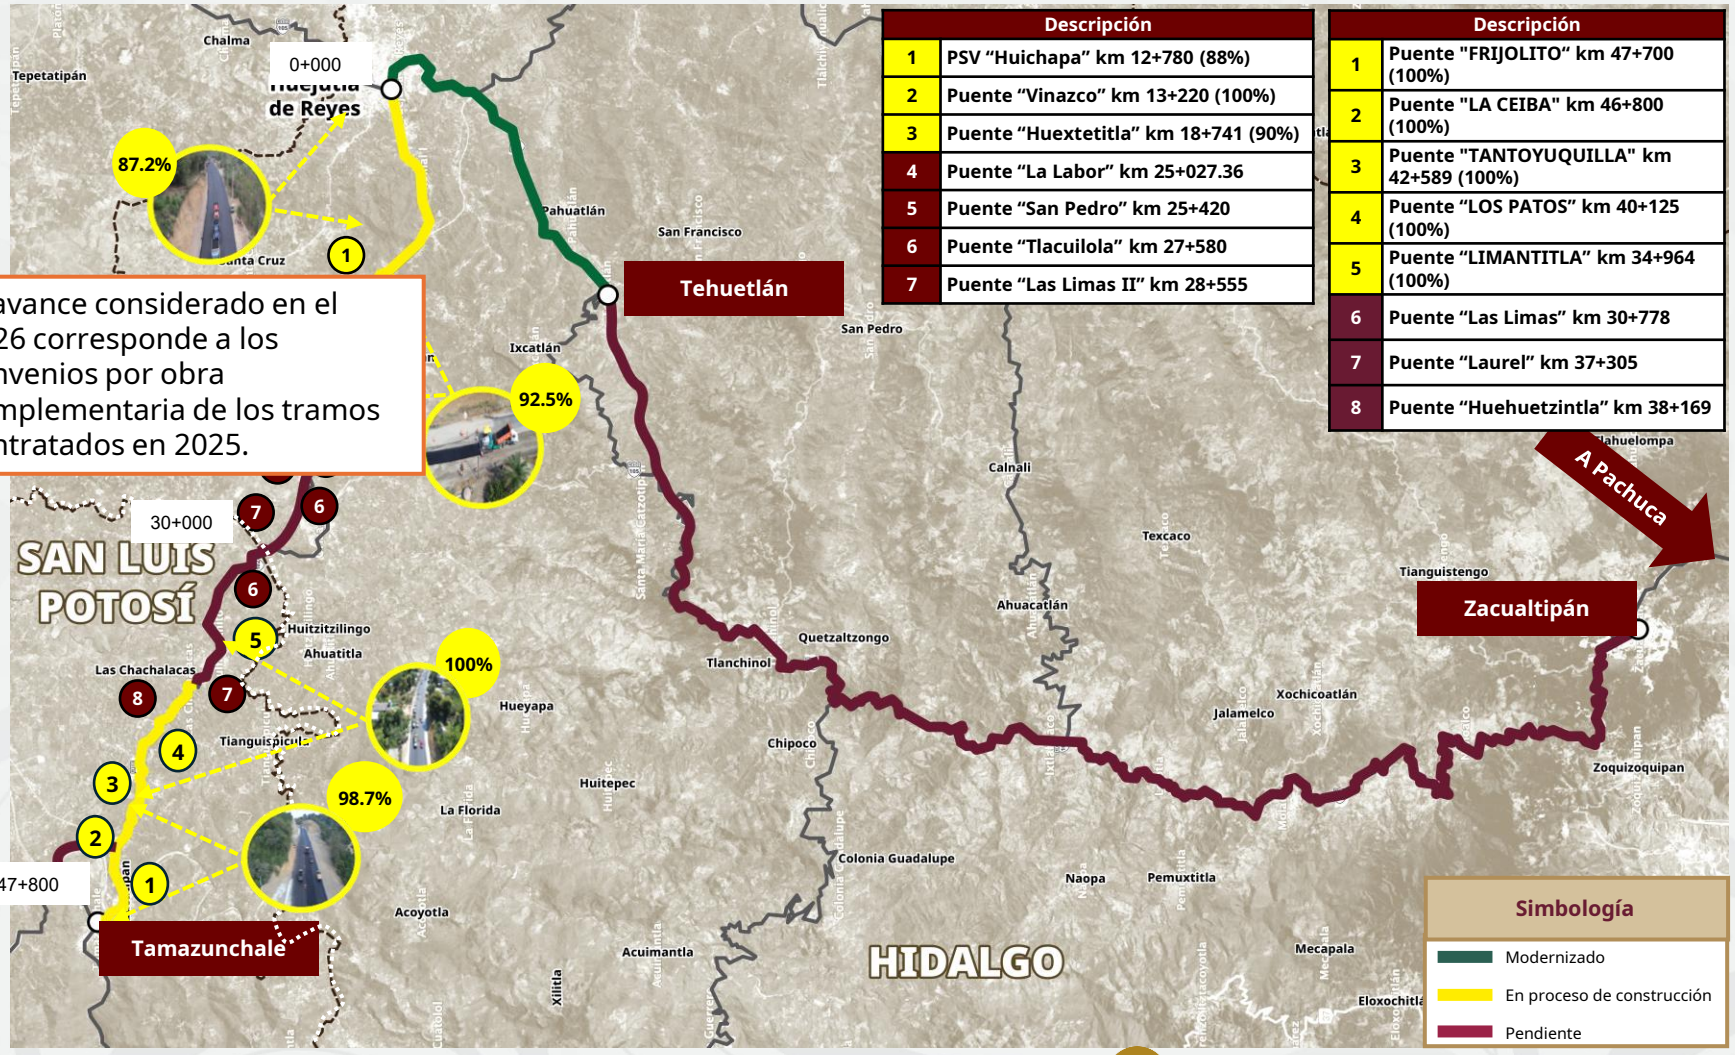

	Descripción
1	PSV "Huichapa" km 12+780 (88%)
2	Puente "Vinazco" km 13+220 (100%)
3	Puente "Huextetitla" km 18+741 (90%)
4	Puente "La Labor" km 25+027.36
5	Puente "San Pedro" km 25+420
6	Puente "Tlacuilola" km 27+580
7	Puente "Las Limas II" km 28+555

	Descripción
1	Puente "FRIJOLITO" km 47+700 (100%)
2	Puente "LA CEIBA" km 46+800 (100%)
3	Puente "TANTOYUQUILLA" km 42+589 (100%)
4	Puente "LOS PATOS" km 40+125 (100%)
5	Puente "LIMANTITLA" km 34+964 (100%)
6	Puente "Las Limas" km 30+778
7	Puente "Laurel" km 37+305
8	Puente "Huehuetzintla" km 38+169

TDPA: 17,318 Veh/hr

65 min de ahorro en tiempo

+395 mil habitantes beneficiados en los municipios de Huejutla de Reyes, Jaltocán, Lolotla, Metztitlán, Molango de Escamilla, San Felipe Orizatlán, Tlanchinol, Xochicoatlán y Zacualtipán de Ángeles en Hidalgo y Tamazunchale, en San Luis Potosi.

Beneficios: Conecta de manera eficiente y segura el centro del país con la Sierra Hidalguense y la Huasteca Potosina.

San Luis Potosí

Tamazunchale – Huejutla

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Km 34+140 al Km 35+160 y del Km 38+820 al Km 42+800

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado		Faltante	Ejecutado del 20/03/2026 al 26/03/2026		Observaciones
						Programado	Ejecutado	
TERRACERÍAS								
Despalme	m³	31,718.00	31,718.0	100.00%	0.00	0.0	0.0	Trabajos concluidos
Cortes	m³	249,345.00	249,345.0	100.00%	0.00	0	0.0	Trabajos concluidos
Terraplenes 90%	m³	127,937.00	127,937.0	100.00%	0.00	0	0.0	Trabajos concluidos
Subyacente	m³	31,983.00	31,983.0	100.00%	0.00	0	0.0	Trabajos concluidos
Subrasante	m³	13,572.00	13,572.0	100.00%	0.00	0	0.0	Trabajos concluidos
OBRAS DE DRENAJE								
Obras de drenaje Tubería	pza.	11	11	100.00%	0	0	0.0	Trabajos concluidos
Obras de drenaje losa	pza.	2	2	100.00%	0	0	0.0	Trabajos concluidos
Obras de drenaje bóveda	pza.	2	2	100.00%	0	0	0.0	Trabajos concluidos
PAVIMENTOS								
Base hidráulica	m³	14,685.00	14,685.0	100.00%	0.00	0	0.0	Trabajos concluidos
Base asfáltica	m³	8,667.00	8,667.0	100.00%	0.00	0	0.0	Trabajos concluidos
Carpeta asfáltica	m³	5,616.00	5,616.0	100.00%	0.00	0	0.0	Trabajos concluidos
SEÑALAMIENTO								
Señalamiento definitivo	km	5	5	100.00%	0	0.0	0.0	Trabajos concluidos

Km 42+800 al Km 47+800

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado		Faltante	Ejecutado del 27/03/2026 al 02/04/2026		Observaciones
						Programado	Ejecutado	
TERRACERÍAS								
spalme	m³	26,738	26,738.0	100.00%	0.0	0.00	0.0	Concluido
tes	m³	189,998.00	189,998.00	100.00%	0.0	0.00	0.0	Concluido
raplenes 90%	m³	24,931.00	24,931.00	100.00%	0.0	0.00	0.0	Concluido
yacente	m³	38,781.00	38,781.00	100.00%	0.0	0.00	0.0	Concluido
rasante	m³	19,107.00	19,107.00	100.00%	0.0	0.00	0.0	Trabajos del km 42+800 al km 47+800
RAS DE DRENAJE								
ras de drenaje Tubería	pza.	10	10	100.0%	0	0	0.0	Concluido
ras de drenaje losa	pza.	2	2	100.0%	0	0	0.0	Concluido
ras de drenaje bóveda	pza.	2	2	100.0%	0	0	0.0	Concluido
VIMENTOS								
se hidráulica	m³	14,718.00	14,718.00	100.0%	0.0	0.0	0.0	Concluido
se asfáltica	m³	8,476.00	8,476.00	100.0%	0.0	126.0	126.0	Trabajos del km 42+800 al km 47+800
peta asfáltica	m³	5,474.00	4,874.00	89.0%	600.0	1,369.0	400.0	Trabajos del km 42+800 al km 47+800
ALAMIENTO								
alamiento definitivo	km	5	4.8	96.0%	0.20	0.50	0.2	Trabajos del km 42+800 al km 47+800

San Luis Potosí

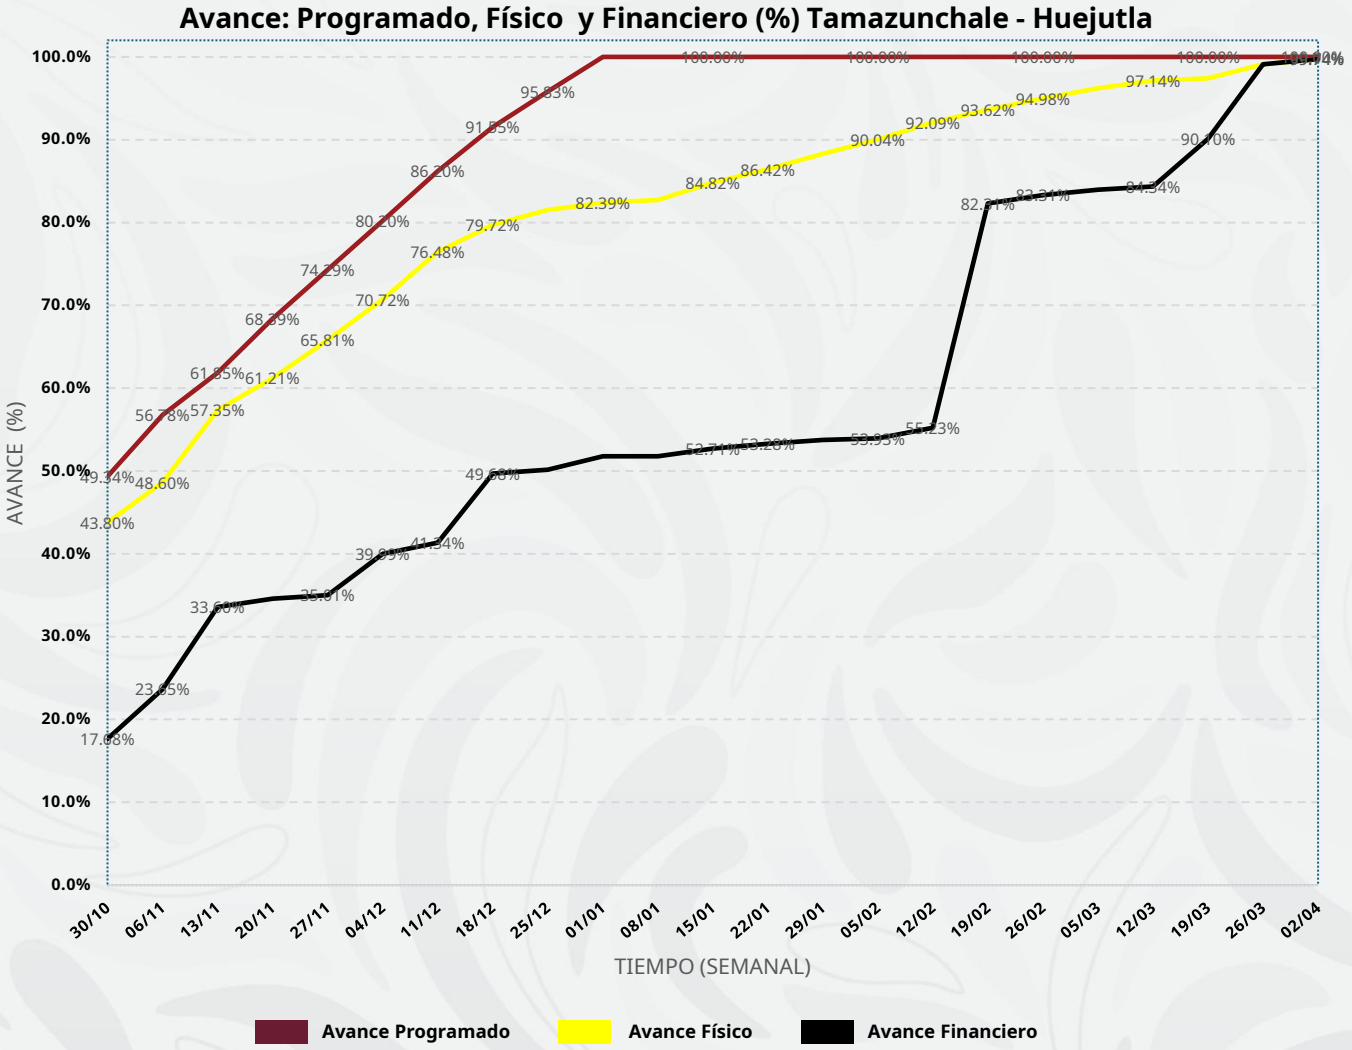

	20 de marzo al 26 de marzo	27 de marzo al 02 de abril
Fuerza de Trabajo (personas)	267	282
Maquinaria	143	149
Frentes	28	29

San Luis Potosí

Tamazunchale – Huejutla – Pachuca

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

km 0+000 al km 10+000

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	27/03/26 al 02/04/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Desmonte **(Ha)**	20.0	20.0	-	-	-	Concluido
Despalme **(m3)**	21,500.0	21,500.0	-	-	-	Concluido
Cortes **(m3)**	183,255.0	183,255.0	-	-	-	Concluido
Terraplén **(m3)**	42,250.0	42,250.0	-	-	-	Concluido
Subyacente **(m3)**	93,012.0	93,012.0	-	-	-	Concluido
Subrasante **(m3)**	36,638.0	36,638.0	-	-	-	Concluido
Excavación estructuras y O.D. **(m3)**	14,264.6	14,264.6	-	-	-	Concluido
Demolición de concreto hidráulico **(m3)**	3,727.5	2,467.5	1,260.0	0.0	227.0	
Base hidráulica **(m3)**	30,000.0	29,527.0	473.0	1,071.4	0.0	
Base asfáltica **(m3)**	16,760.0	15,884.0	876.0	598.6	0.0	
Carpeta asfáltica **(m3)**	10,692.0	4,073.6	6,618.4	822.5	0.0	
Puentes peatonales **(pza)**	2.0	0.7	1.3	0.3	0.0	Reducción meta por conflicto social
Señalamiento **(m)**	43,334.0	0.0	43,334.0	10,833.5	0.0	

Avances físicos (San Luis Potosí)

Hidalgo

km 10+000 al km 20+000

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	27/03/26 al 02/04/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Desmonte **(Ha)**	36.0	36.0	-	-	-	Concluido
Despalme **(m3)**	31,500.0	31,500.0	-	-	-	Concluido
Cortes **(m3)**	347,581.0	332,850.0	14,731.0	9,930.9	4,000.0	
Terraplén **(m3)**	251,735.0	247,700.0	4,035.0	7,866.7	1,000.0	
Subyacente **(m3)**	77,344.0	73,100.0	4,244.0	2,667.0	1,000.0	
Subrasante **(m3)**	32,248.0	30,000.0	2,248.0	1,194.4	400.0	
Excavación estructuras y O.D. **(m3)**	133,739.6	133,739.6	0.0	3,821.1	1,070.6	Concluido
Base hidráulica **(m3)**	30,000.0	27,940.0	2,060.0	1,200.0	300.0	
Base asfáltica **(m3)**	16,760.0	14,600.0	2,160.0	882.1	100.0	
Carpeta asfáltica **(m3)**	10,692.0	0.0	10,692.0	668.3	0.0	
Señalamiento **(m)**	43,334.0	0.0	43,334.0	3,611.2	0.0	

Avances físicos (Hidalgo)
