Salina Cruz-Zihuatanejo (MEX-200)

Tramo Guerrero

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance global
- Programado: 6.54%
- Real: 6.32%
- Semanal: 0.05%
- Financiero: 6.54%

Avance 2025
- Programado: 100.0%
- Real: 96.73%
- Semanal: 0.82%
- Financiero: 100.0%

	Descripción
1	**Puente Las Vigas** Km 81+200 | 123 m
2	**Puente Río Nexpa** Km 85+300 | 425 m
3	**Puente Agua Hedionda** Km 106+760 | 21 m
4	**Puente Copala** Km 116+000 | 120 m
5	**Puente Marquelia I** Km 135+500 | 220 m
6	**Puente Talapilla** Km 171+857 | 41 m
7	**Puente Río Quetzala** Km 173+711 | 190 m
8	**Puente Santa Catarina** Km 184+744 | 101 m
9	**Tramo 9** IG=km 209+500 AT – km 209+240 AD al km 219+540 | 10.30 km
10	**Tramo 10** km 219+540 al km 229+600 |10.06 km
11	**Tramo 11** km 229+600 al km 234+843.77 | 5.24 km

Inversión total 2025-2030: 24,722 mdp
- Guerrero: 6,641 mdp
- Oaxaca: 18,081 mdp

Meta total 2025-2030: 422 km
- Guerrero: 103 km
- Oaxaca: 319 km

Inversión 2025: 1,616 mdp
- Guerrero: 725 mdp
- Oaxaca: 891 mdp

Meta 2025: 27 km
- Guerrero: 1 km
- Oaxaca: 26 km

Inversión 2026: 2,754 mdp
- Oaxaca: 2,754 mdp

Meta 2026: 37 km

Inicio : 1 de abril de 2025
Termino: 31 de diciembre 2029
Término meta 2025: 20 de abril de 2026

74,166 empleos generados

1,947,399 habitantes beneficiados

Beneficios: Reducción en tiempos de traslados de la Costa Chica de Gro. hacia Puerto Escondido Oax., reduciendo costos operativos e impulsando el turismo local y nacional de los municipios de Acapulco, San Marcos, Florencio Villareal, Cuajinicuilapa, Pinotepa Nacional, Villa de Tututepec, San Pedro Mixtepec, Pochutla y Huatulco.

Oaxaca/Guerrero

Salina Cruz-Zihuatanejo (MEX-200)

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Meta	Ejecutado Acumulable	Faltante	06-03-26 al 12-03-26	
				Programado	Ejecutado
Troncal	*13.58 km	*13.26 km	*0.32 km	0.0%	0.7%
8 puentes	8 pts	94.62% de 8 pts	5.38% de 8 pts	0.0%	0.6%

OBSERVACIONES

Oaxaca

Tramo 1 (0 frentes de trabajo)
Concluido.
Tramo 2 (7 frentes de trabajo)
Producción de mezcla asfáltica para carpeta en banco de materiales ubicado en el km 224+250 desviación izquierda 50 m., extracción y triturado de material pétreo en banco de materiales ubicado en carretera a Cuatunalco en el km 225+700 desviación derecha 1,300 m., construcción de cunetas del km 228+020 al km 228+240 lado derecho, tendido y compactación de carpeta asfáltica del km 227+900 al km 228+270 franja derecha, colocación de defensa metálica de 3 crestas del km 228+600 al km 228+920 lado derecho, colocación de defensa metálica de 3 crestas del km 229+060 al km 229+140 lado derecho, construcción de bordillos del km 229+080 al km 229+150 lado derecho
Tramo 3 (3 frentes de trabajo)
Colocación de señalamiento definitivo del km 229+600 al km 231+380 y del km 233+300 al km 234+843, tendido de carpeta asfáltica del km 233+300 al km 234+843, trabajos de obras complementaria del km 233+300 al km 234+843.

Guerrero

Puente Las Vigas km 81+200: Concluido.
Puente Agua Hedionda Km 106+760: Concluido.
Puente Copala Km 116+000: Concluido.
Puente Marquelia I km 135+500: Concluido.
Puente Nexpa km 85+300: Cimbra en Muros de contención, terracerías (movimiento de tierras para la conformación de rampa de acceso, colocación de parapeto).
Puente Talapilla km 171+857: Concluido
Puente Rio Quetzala Km 173+711: Perforación, izado y colado de pilotes de 1.80 m de diámetro lado derecho 2da etapa, cimbrado y armado de acero de refuerzo para columnas lado derecho 2da etapa, habilitado y armado de acero de refuerzo para cabezales lado derecho 2da etapa.
Puente Santa Catarina km 183+740: Cimbrado y armado de acero de refuerzo para guarnicion y banqueta, capa subrasante compactada al 100%, lado izquierdo 2da etapa.

Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Salina Cruz - Zihuatanejo

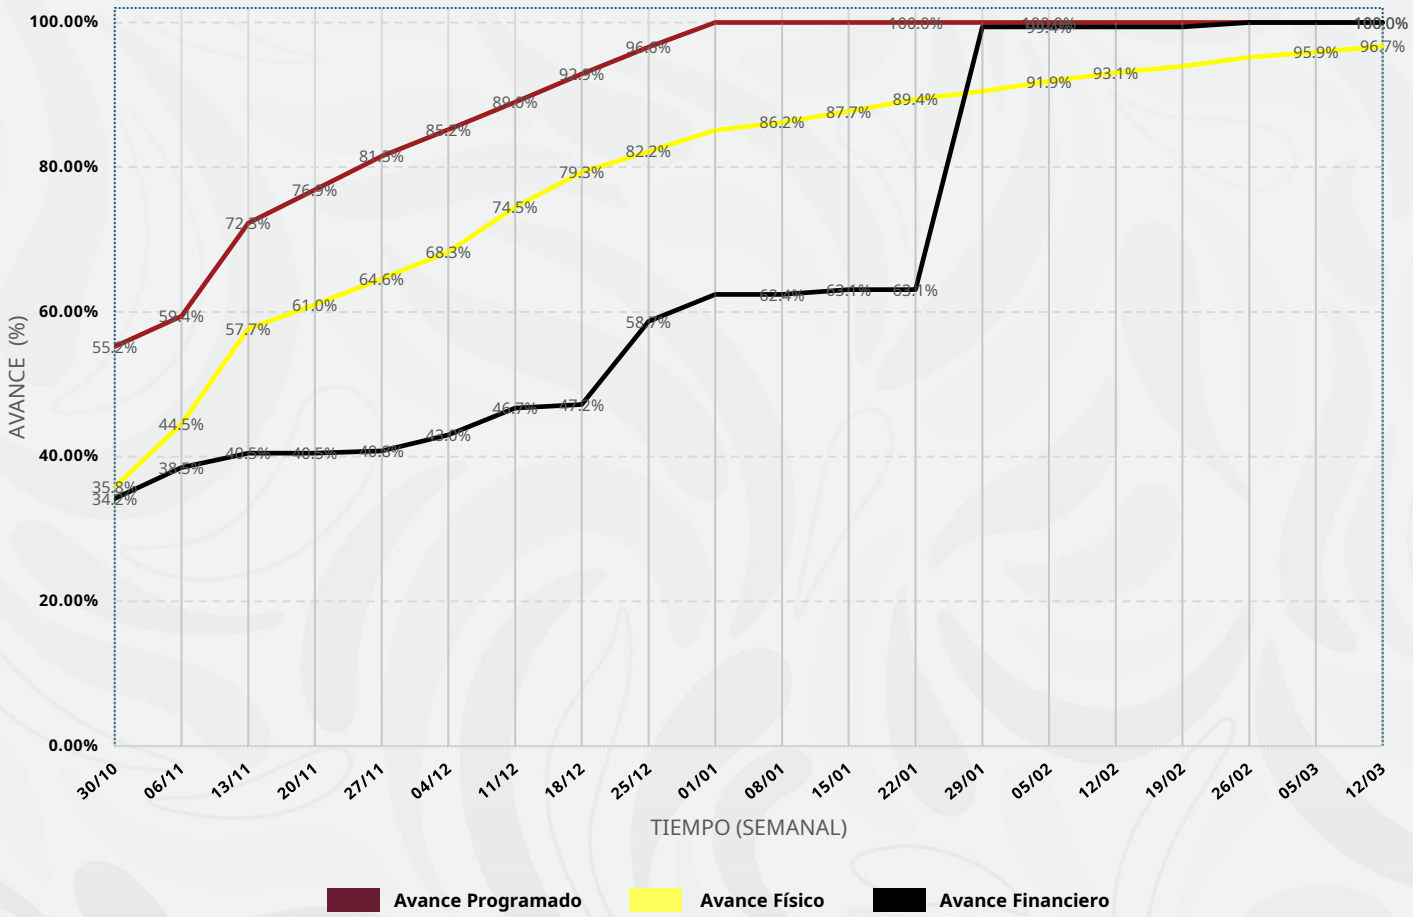

	27 de febrero al 05 de marzo 2026	06 de marzo al 12 de marzo 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	288	245
Maquinaria	174	174
Frentes	24	20

*** 13.58 km se realizó un convenio en reducción de volúmenes del tramo I**
