# Guaymas – Esperanza – Yécora - Chihuahua

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

## Avance 2025

Avance Programado: 100.0 %
Avance Real: 91.20 %
Avance Financiero: 50.80 %

**Inversión total:** 10,228 mdp
- Sonora: 5,935 mdp
- Chihuahua: 4,293 mdp

**Meta total:** 450 km
- Sonora: 252 km, 4 puentes
- Chihuahua: 198 km

**Inversión 2025:** 450 mdp
- Sonora:450 mdp

**Meta 2025:** 10 km.
- Sonora: 10 km y 4 puentes

**Inversión 2026:** 2,000 mdp
- Sonora: 2,000 mdp

**Meta 2026:** 47 km.
- Sonora: 47 km y 8 puentes

**Inicio :** 20 de octubre de 2025
**Termino**: diciembre de 2029
**Término meta 2025:** 30 de abril de 2026

**30,684** empleos generados

**669,912** habitantes beneficiados

**Beneficios:**
- Derrama económica regional.
- Fortalecimiento de exportaciones.
- Impulso al crecimiento turístico.
- Mejora en los puntos de salida para la producción agropecuaria, manufacturera e industrial.

# Guaymas – Esperanza – Yécora - Chihuahua

## Km 17+300 al Km 32+300

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

| Elemento | Meta | Ejecutado acumulable | Faltante | 13-03-26 al 19-03-26 | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | Ejecutado | |
| Trabajos preliminares (km) | 9.97 | 9.97 | - | - | - | - |
| Terracerías (km) | 9.97 | 9.97 | - | - | - | - |
| Obras de drenaje (Pza) | 23 | 23 | - | - | - | - |
| Pavimento (km) | 9.97 | 8.17 | 1.80 | 0.0 | 0.0 | - |
| Señalamiento (km) | 9.97 | - | 9.97 | - | - | - |
| Construcción Puente I (Canal alto) | 100% | 61.00% | 39.00% | 1.58% | 1.58% | - |
| Construcción Puente II (Agua Caliente) | 100% | 94.00% | 6.00% | 2.20% | 2.20% | - |
| Construcción Puente III (Chinitos I) | 100% | 93.00% | 7.00% | 3.00% | 3.00% | - |
| Construcción Puente IV (Chinitos II) | 100% | 93.00% | 7.00% | 1.50% | 1.50% | - |

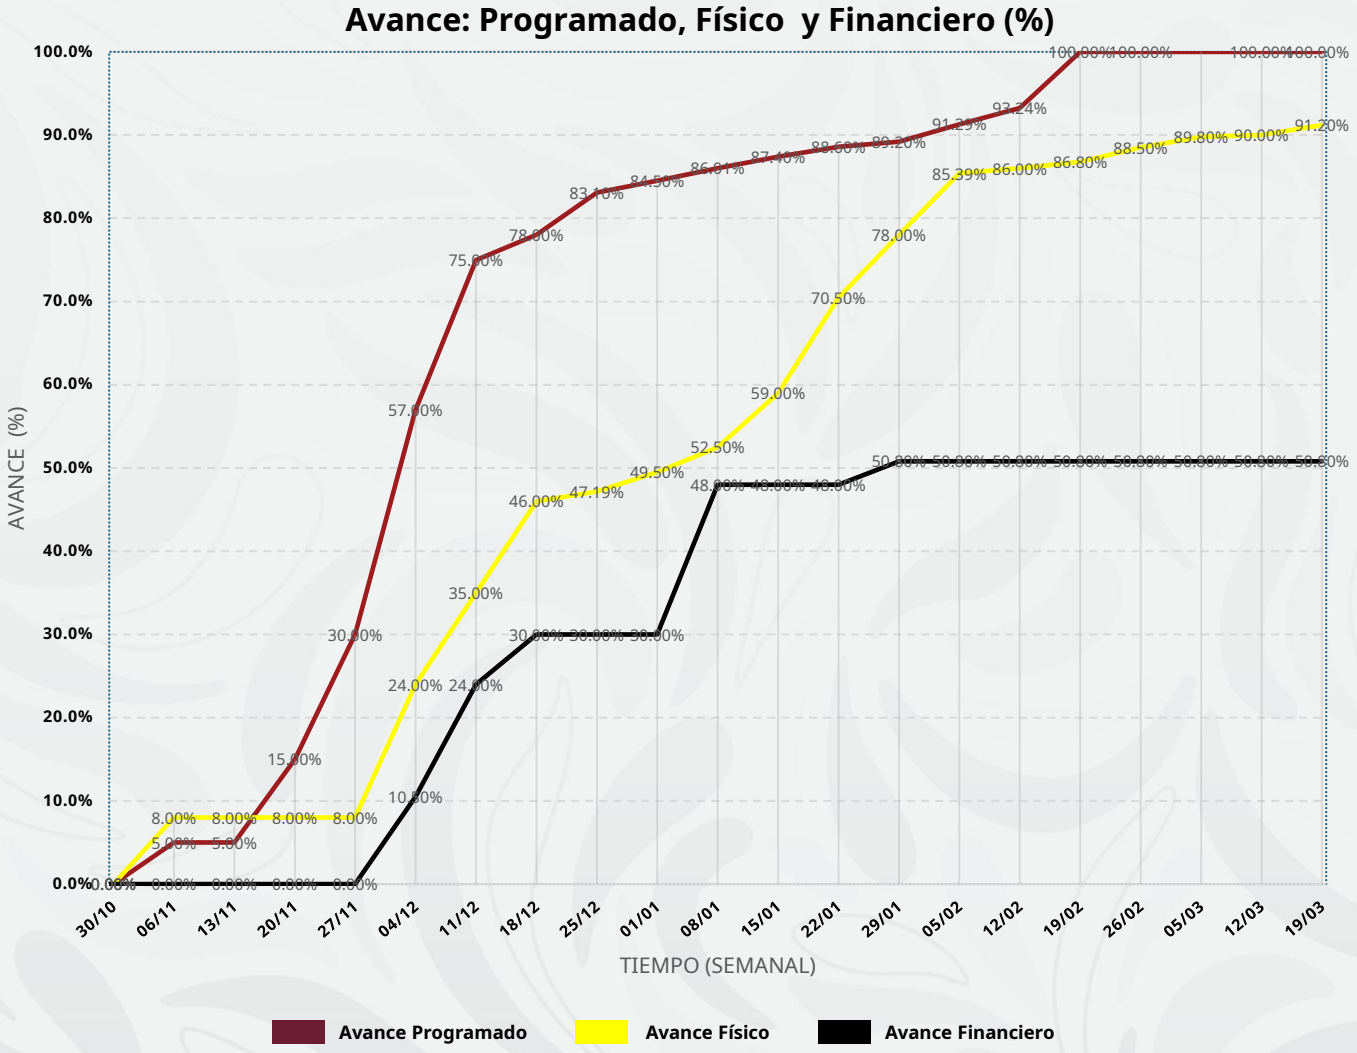


| | 06 de marzo al 12 de marzo 2026 | 13 de marzo al 19 de marzo 2026 |
|---|---|---|
| Fuerza de Trabajo (personas) | 280 | 280 |
| Maquinaria | 40 | 40 |
| Frentes de trabajo | 14 | 12 |
