Sonora/Chihuahua

Camino Límite Estados Chihuahua/Sonora-Pancho Villa-E.C. (Janos-Monte Verde)

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

CONCLUIDA

Avance físico
- Programado: 100%
- Real: 100% (obras complementarias)
- Financiero: 81.0%

1.- Constructora URBATRAC, S.A. de C.V.

Meta: Km 0+000-km 11+000, incluye entronque km 0+000
Inversión: 324.6 MDP C/IVA

2.- ESMA Instalaciones, S.A. de C.V.

Meta: Km 11+000-km 18+093 km
Inversión: 306.2 MDP C/IVA

3.- INNOVACIONES INTELIGENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN,S.A DE C.V Y CMCO,S.A DE C.V

F. Km 6+900 Puente I, 122.0 m
G. Km 14+700 Puente II, 61.5 m

4.- CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PROYECTOS INTERESTATALES,S.A DE C.V

Por modernizar a nivel de pavimento a 7.0 m
Meta: Km 18+093 – km 29+093

5.- La CIMA Terraceros, S.A. de C.V. y Estructuras y Excavaciones JM, S.A. de C.V.

Meta: Km 29+093-KM 47+233
Inversión: 193.9 MDP C/IVA

6.- MERP Edificaciones y Terracerías, S.A. de C.V.

Meta: Km 47+233-Km 59+823 y Km 66+422-Km 66+829, incluye Boulevard y entronque a nivel.
Inversión: 179.4 MDP C/IVA

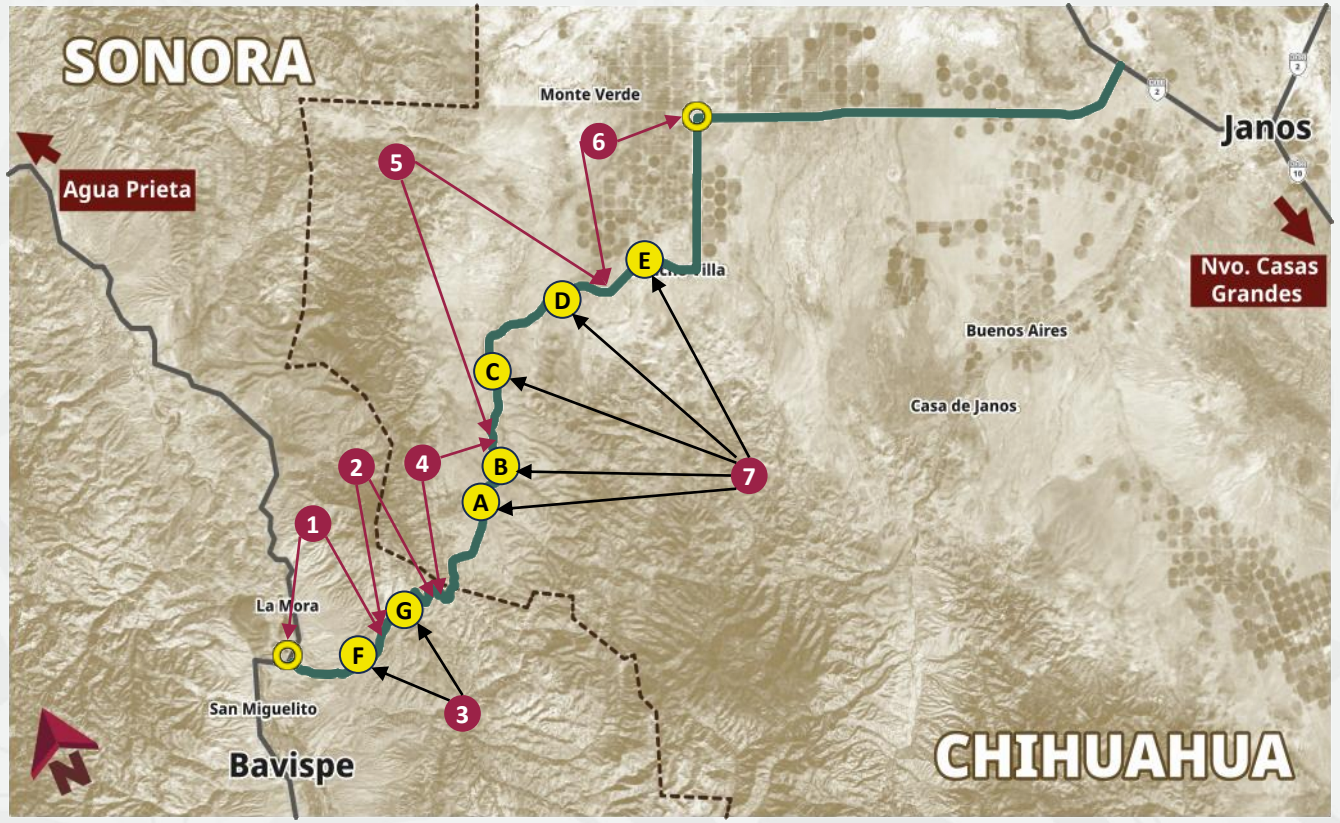

Inversión total: 1,710 mdp
Sonora: 769 mdp
Chihuahua: 941 mdp

Meta total: 67 km y 7 puentes
- 6.6 km modernizados C, Chihuahua (se requiere trabajos complementarios)

Inversión 2025: 1650 mdp
Inversión 2026: 60 mdp

Inicio: marzo, 2025
Término: 30 Enero de 2026

5,130 empleos generados

4,145 habitantes beneficiados

90 minutos de ahorro en tiempo

7.- Asfaltos y Triturados EL PUJAL, S.A. de C.V.

En proceso de construcción de 5 puentes:
A. Km 22+758 El Papalote, 30.0 m
B. Km 25+758 Los Pilares, 40.0 m
C. Km 33+832 Las Profesoras, 40.0 m
D. Km 36+682 La Enramada, 30.0 m
E. Km 38+362 La Pila, 120.0 m
Inversión: 122.5 MDP C/IVA

S1.- CLAMI INGENIEROS, S.C

Tramo: del km 0+000 al km 11+000, puente Sonora I en el km 6+900
Inversión: 6.1 MDP C/IVA

S2.- NEDOX, S.A DE C.V

Tramo: del km 11+000 al km 18+093, puente Sonora II en el km 14+700
Inversión: 6.8 MDP C/IVA

S3.- JIDASA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V

Tramo: tramo del km 18+093 al km 29+093, 5 puentes Chihuahua
Inversión: 7.5 MDP C/IVA

S4.- GSM SUPERVISIÓN, PROYECTO E IMPACTO AMBIENTAL, S.A DE C.V

Tramo: tramo del km 29+093 al km 59+822, del km 66+422 al km 66+828
Inversión: 7.5 MDP C/IVA

S5.- GRUPO SELOME, S.A. DE C.V

Tramo: Manifestación de Impacto Ambiental y de Cambio de Uso de Suelo Forestal, Chihuahua
Inversión: 6.7 MDP C/IVA

S6.- PROVEEDORA DE INGENIERIA, INSTALACION E INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V

Tramo: implementación y ejecución de medidas de mitigación de la Manifestación de Impacto Ambiental, Sonora
Inversión: 14.0 MDP C/IVA

S7.- GRUPO CORPOSIIA, S.A. DE C.V.

Tramo: implementación y ejecución de medidas de mitigación de la Manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad regional, Sonora
Inversión: 10.5 MDP C/IVA
