# Tabasco-Campeche

## Macuspana-Escárcega (Carretera Federal 186)
## Tramo Tabasco

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

**Avance global**
- Programado: 6.90%
- Real: 6.90%
- Semanal: 0.00%
- Financiero: 6.90%

**Avance 2026**
- Programado: 0.76%
- Real: 1.0%
- Semanal: 0.04%
- Financiero: 0.80%

**Inversión total 2025-2028:** 21,047 mdp
- **Tabasco:** 8,335 mdp
- **Campeche:** 11,483 mdp
- **Chiapas:** 1,229 mdp

**Meta total 2025-2028: |249 km |**
**Ampliación a 22 m (A4)**
Tabasco • 92 km | Chiapas • 14 km | Campeche • 143 km

**Inversión 2025:** 1,429 MDP
- **Tabasco:** 1,145 mdp
- **Campeche:** 284 mdp

**Meta 2025:**
- **Tabasco:** 12 km y 2 puentes
- **Campeche:** 4 km y 2 entronques

**Inversión 2026:** 3,749 MDP
- **Tabasco:** 3,109 mdp
- **Campeche:** 640 mdp

**Meta 2026:**
- **Tabasco:** 32 km
- **Campeche:** **8** km

**Inicio:** 16 de marzo de 2025
**Término:** Diciembre 2029
**Término meta 2025:** 28 de febrero de 2026

**63,141** empleos generados

**760 mil** habitantes beneficiados

**40 minutos** de ahorro en tiempo

**Beneficios** Incrementaría la capacidad de la vía, mejora el nivel de servicio, reduce los costos de operación vehicular y los tiempos de recorrido de los usuarios, así como el riesgo de accidentes.

# Tabasco-Campeche

## Macuspana-Escárcega (Carretera Federal 186)
## Tramo Tabasco

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

| Elemento | Unidad | Intervención total | Ejecutado acumulado | Faltante | 02/04/2026 al 09/04/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Programado | Ejecutado |
| Desmonte | ha | 27.92 | 25.66 | 2.26 | 2.18 | 2.18 |
| Despalme | $m^3$ | 115,589.04 | 101,425.60 | 14,163.44 | 11,076.10 | 692.12 |
| Escalones de Liga | $m^3$ | 20,122.39 | 15,355.81 | 4,766.58 | 2,137.10 | 96.95 |
| Cortes | $m^3$ | 114,909.49 | 64,901.37 | 50,008.12 | 7,941.05 | 4,700.00 |
| Pedraplén | $m^3$ | 151,364.26 | 104,810.65 | 46,553.61 | 13,128.09 | 5,671.15 |
| Geotextil | $m^2$ | 159,125.66 | 73,801.39 | 85,324.27 | 10,279.43 | 2,560.53 |
| Geomalla | $m^2$ | 173,510.17 | 86,481.80 | 87,028.37 | 7,404.66 | 2,699.88 |
| Terraplén | $m^3$ | 320,776.23 | 112,873.69 | 207,902.54 | 6,251.87 | 11,439.16 |
| Subyacente | $m^3$ | 132,720.47 | 40,685.32 | 92,035.15 | 638.73 | 3,789.66 |
| Subrasante | $m^3$ | 67,539.93 | 5,119.91 | 62,420.02 | 0.00 | 1,023.98 |
| Obras de drenaje | pza | 95.00 | 17.00 | 78.00 | 17.00 | 1.00 |
| Cabezal | pza | 7.00 | 2.00 | 5.00 | 0.90 | 2.00 |
| Trabes Aashto IV de 1.35 m x 30.60 m (fabricación) | pza | 60.00 | 16.00 | 44.00 | 3.50 | 12.00 |
| Demolicion de pilotes (Descabece) | pza | 160.00 | 30.00 | 130.00 | 0.00 | 4.00 |

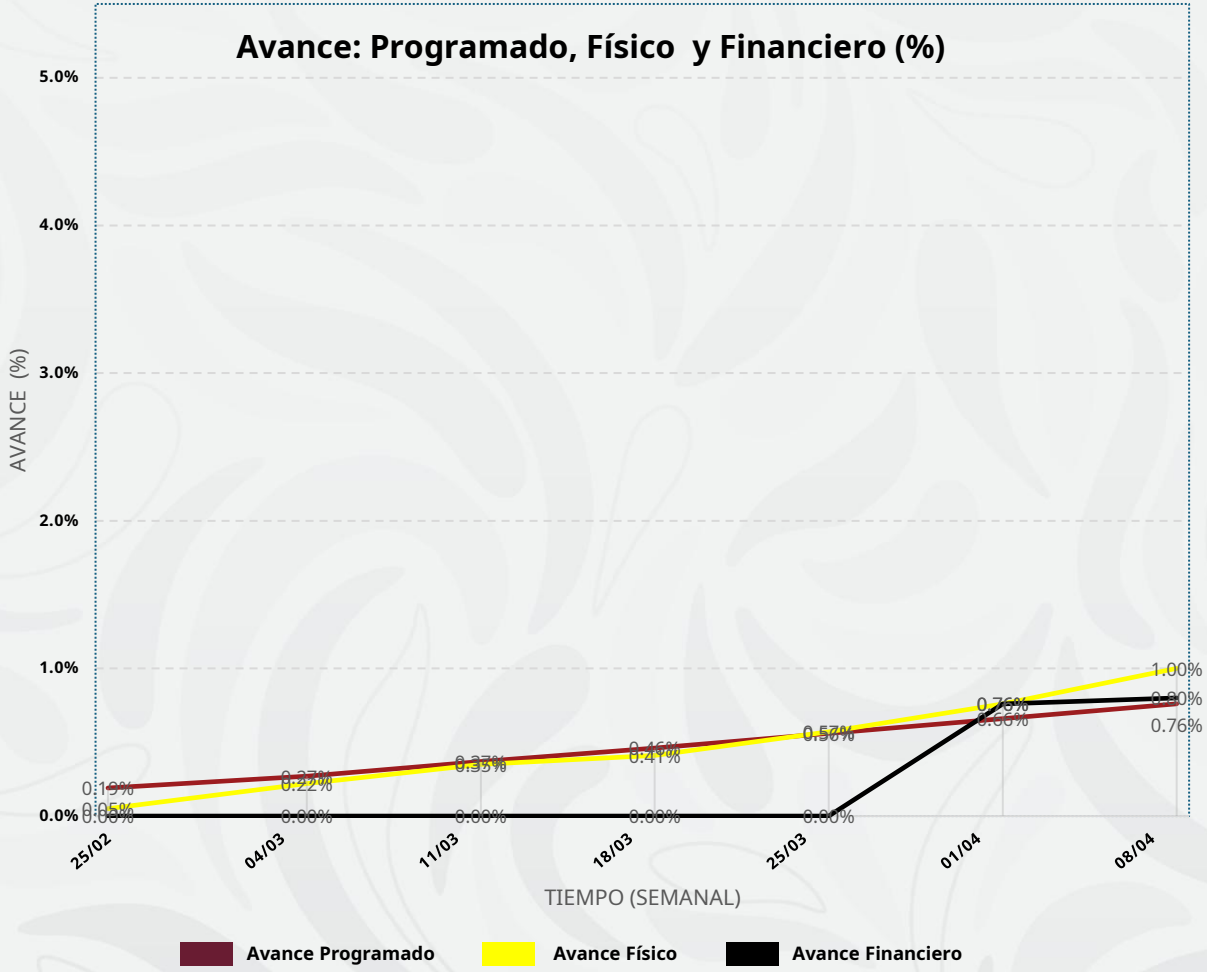


| | 26 de marzo al 02 de abril | 03 de abril al 09 de abril |
|---|---|---|
| Fuerza de Trabajo (personas) | 435 | 435 |
| Maquinaria | 126 | 126 |
| Frentes de trabajo | 26 | 24 |
