Salina Cruz-Zihuatanejo (MEX-200)

Tramo Guerrero

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance global
- Programado: 8.10%
- Real: 7.15%
- Semanal: 0.32%
- Financiero: 6.54%

Avance 2025
- Programado: 100.0%
- Real: 97.50%
- Semanal: 0.23%
- Financiero: 100.0%

Avance 2026
- Programado: 14.00%
- Real: 7.00%
- Semanal: 2.0%
- Financiero: 0.0%

Descripción	
1	**Puente Las Vigas** Km 81+200 | 123 m
2	**Puente Río Nexpa** Km 85+300 | 425 m
3	**Puente Agua Hedionda** Km 106+760 | 21 m
4	**Puente Copala** Km 116+000 | 120 m
5	**Puente Marquelia I** Km 135+500 | 220 m
6	**Puente Talapilla** Km 171+857 | 41 m
7	**Puente Río Quetzala** Km 173+711 | 190 m
8	**Puente Santa Catarina** Km 184+744 | 101 m
9	**Tramo 9** IG=km 209+500 AT – km 209+240 AD al km 219+540 | 10.30 km
10	**Tramo 10** km 219+540 al km 229+600 |10.06 km
11	**Tramo 11** km 229+600 al km 234+843.77 | 5.24 km

Inversión total 2025-2030: 24,722 mdp
- Guerrero: 6,641 mdp
- Oaxaca: 18,081 mdp

Meta total 2025-2030: 423 km *
- Guerrero: 103 km
- Oaxaca: 319 km

Inversión 2025: 1,606 mdp
- Guerrero: 724 mdp
- Oaxaca: 882 mdp

Meta 2025: 27 km
- Guerrero: 1 km
- Oaxaca: 26 km

Inversión 2026: 2,757 mdp
- Oaxaca: 2,757 mdp

Meta 2026: 37 km

Inicio : 1 de abril de 2025
Termino: 31 de diciembre 2029
Término meta 2025: 20 de abril de 2026

74,166 empleos generados

1,947,399 habitantes beneficiados

Beneficios: Reducción en tiempos de traslados de la Costa Chica de Gro. hacia Puerto Escondido Oax., reduciendo costos operativos e impulsando el turismo local y nacional de los municipios de Acapulco, San Marcos, Florencio Villareal, Cuajinicuilapa, Pinotepa Nacional, Villa de Tututepec, San Pedro Mixtepec, Pochutla y Huatulco.

Oaxaca/Guerrero

Salina Cruz-Zihuatanejo (MEX-200)

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Meta	Ejecutado Acumulable	Faltante	03-04-26 al 09-04-26	
				Programado	Ejecutado
Troncal	*13.58 km	*13.35 km	*0.23 km	0.0%	0.0%
8 puentes	8 pts	95.61% de 8 pts	4.39% de 8 pts	0.0%	0.2%

OBSERVACIONES

Oaxaca

Tramo 1 (0 frentes de trabajo)
Concluido.
Tramo 2 (0 frentes de trabajo)
Sin actividad
Tramo 3 (0 frentes de trabajo)
Concluido

Guerrero

Puente Las Vigas km 81+200:
Concluido.
Puente Agua Hedionda Km 106+760:
Concluido.
Puente Copala Km 116+000:
Concluido.
Puente Marquelia I km 135+500:
Concluido.
Puente Nexpa km 85+300:
Trabajos de terracerías (aproche de muro de contención), Conformación de cono de derrame y Colocación de parapeto metálico.
Puente Talapilla km 171+857:
Concluido
Puente Rio Quetzala Km 173+711:
Montaje de trabes en los primeros claros donde se cuenta con cabezales, Cimbrado y colado para columnas, cabezales lado derecho 2da etapa y Habilitado de acero para losas y diafragmas de los primero claros.
Puente Santa Catarina km 183+740:
Cimbrado y armado de acero de refuerzo para guarnicion y banqueta.

Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Salina Cruz - Zihuatanejo

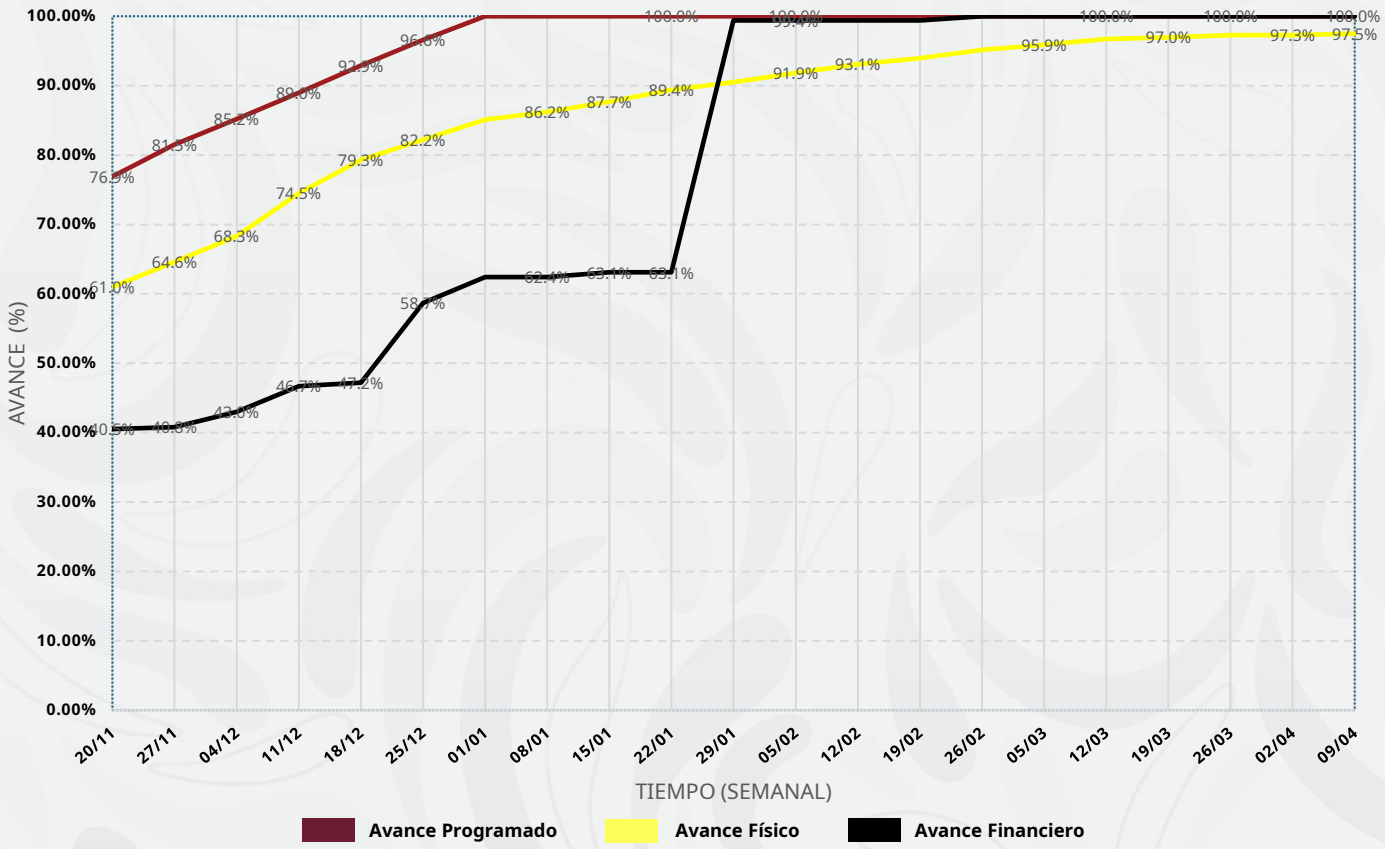

	27 de marzo al 02 de abril 2026	03 de abril al 09 de abril 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	90	74
Maquinaria	58	19
Frentes	11	10

*** 13.58 km se realizó un convenio en reducción de volúmenes del tramo I**
