# Toluca- Zihuatanejo

## Toluca- Zihuatanejo (Carretera Federal 134)

## Tramo Estado de México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

**Avance global**
- Programado: 3.80%
- Real: 3.74%
- Semanal: 0.00%
- Financiero: 3.50%

**Avance 2025**
- Programado: 99.49%
- Real: 97.91%
- Semanal: 0.01%
- Financiero: 91.52%

**Avance 2026**
- Programado: --
- Real: --
- Semanal: --
- Financiero: --

**Inversión total: 26,969 mdp**
- Edo. Méx.:7,220 mdp *
- Gro.: 19,750 mdp *

**Meta total: 372 km**
- Edo. Méx.: 87 km *
- Gro.: 286 km*

**Inversión 2025: 945 mdp**
- **Edo. Méx.:** 945 mdp

**Meta 2025:** 12 km, 1 paso a desnivel, 1 puente y 3 entronques (Edo. Méx.)

**Inversión 2026: 2,668 mdp**
- **Edo. Méx.:** 2,668 mdp

**Meta 2026:** 38 km (Edo.Méx.)

**Nota:** De la asignación 2026 se consideran 87.57 mdp para el pago del Séptimo y Octavo Convenio Modificatorio correspondientes del km 13 al km 25, con fecha de conclusión el 15/abr/26

**Inicio:** 09 de mayo de 2025
**Término meta-2025:** 15-abril-2026
**Término meta-2026:** Diciembre 2026
**Término total:** Diciembre 2029

*Redondeado

**80,907** empleos generados

**1 millón 480 mil** habitantes beneficiados

**2 horas 35 minutos** de ahorro en tiempo

**Beneficios** Mejorar las condiciones de tránsito, reduciendo el riesgo de accidentes, así mismo se reducen los tiempos traslados, garantizando una mejor conectividad que contribuye al desarrollo económico y turístico del Centro – Poniente del país.

# Toluca- Cd. Altamirano

## Toluca- Zihuatanejo (Carretera Federal 134)

### Km 13+000 – km 25+000

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

| Elemento | Intervención | Unidad | Ejecutado acumulado | Faltante | 03/abr/26 al 09/abr/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Programado | Ejecutado |
| Despalme y cortes | 352,510.36 | m³ | 352,510.36 | 0 | - | 0 |
| Alcantarillas tubulares | 787.28 | m | 787.28 | 0 | - | 0 |
| Cpo. Terraplén, Subyacente y Subrasante | 278,677.81 | m³ | 278,677.81 | 0 | - | 0 |
| Base hidráulica | 47,257.62 | m³ | 47,257.62 | 0 | - | 0 |
| Base asfáltica | 27,971.34 | m³ | 27,971.34 | 0 | - | 0 |
| Carpeta asfáltica | 17,063.24 | m³ | 14,552.54 | 2,510.7 | - | 0 |
| Señalamiento Horizontal | 52.75 | Km | 15.83 | 36.92 | - | 0 |
| Señalamiento Vertical | 699 | Pzs | 190 | 509 | - | 0 |
| Excavación para zapatas y muros | 9,738 | m³ | 9,738 | 0 | - | 0 |
| Acero de refuerzo en zapatas y muros | 184,094.8 | Kg | 184,094.8 | 0 | - | 0 |
| Concreto f'c=250 km/cm² en zapatas y muros | 2,186 | m³ | 2,186 | 0 | - | 0 |
| Relleno para zapatas y muros | 5,566.9 | m³ | 5,566.9 | 0 | - | 0 |
| Pilotes ⌀=1.2 m, f'c=250 kg/cm² | 530 | Pzs | 530 | 0 | - | 0 |
| Columnas ⌀=1.2 m, f'c=250 kg/cm² | 530 | Pzs | 530 | 0 | - | 0 |
| Cabezales f'c=250 kg/cm² | 11 | Pzs | 11 | 0 | - | 0 |
| Fabricación AASHTO tipo "V", f'c=400 kg/cm² | 88 | Pzs | 88 | 0 | - | 0 |
| Transporte y montaje de Trabes AASHTO "V" | 88 | Pzs | 88 | 0 | | 0 |
| Fabricación de trabes tipo Tabletas, f'c=350 kg/cm² | 51 | Pzs | 51 | 0 | - | 0 |
| Transporte y montaje de trabes tipo Tabletas | 51 | Pzs | 51 | 0 | - | 0 |
| Losas f'c=250 kg/cm² | 9 | Pzs | 9 | 0 | - | 0 |
| Guarnición f'c=250 kg/cm² | 1,886.61 | m | 1,886.61 | 0 | - | 0 |
| Parapeto metálico | 2,570.02 | m | 2,570.02 | 0 | - | 0 |
| Carpeta asfáltica | 225.8 | m³ | 225.8 | 0 | - | 0 |
| Junta de dilatación | 270.9 | m | 270.9 | 0 | - | 0 |
| Muro Mecánicamente Estabilizado | 4,316.5 | m² | 4,316.5 | 0 | - | 0 |
| Relleno para MME | 39,148.8 | m³ | 39,148.8 | 0 | - | 0 |
| Losas de acceso | 2 | Pzs | 2 | 0 | - | 0 |

### Avance Programado - Físico - Financiero (%)

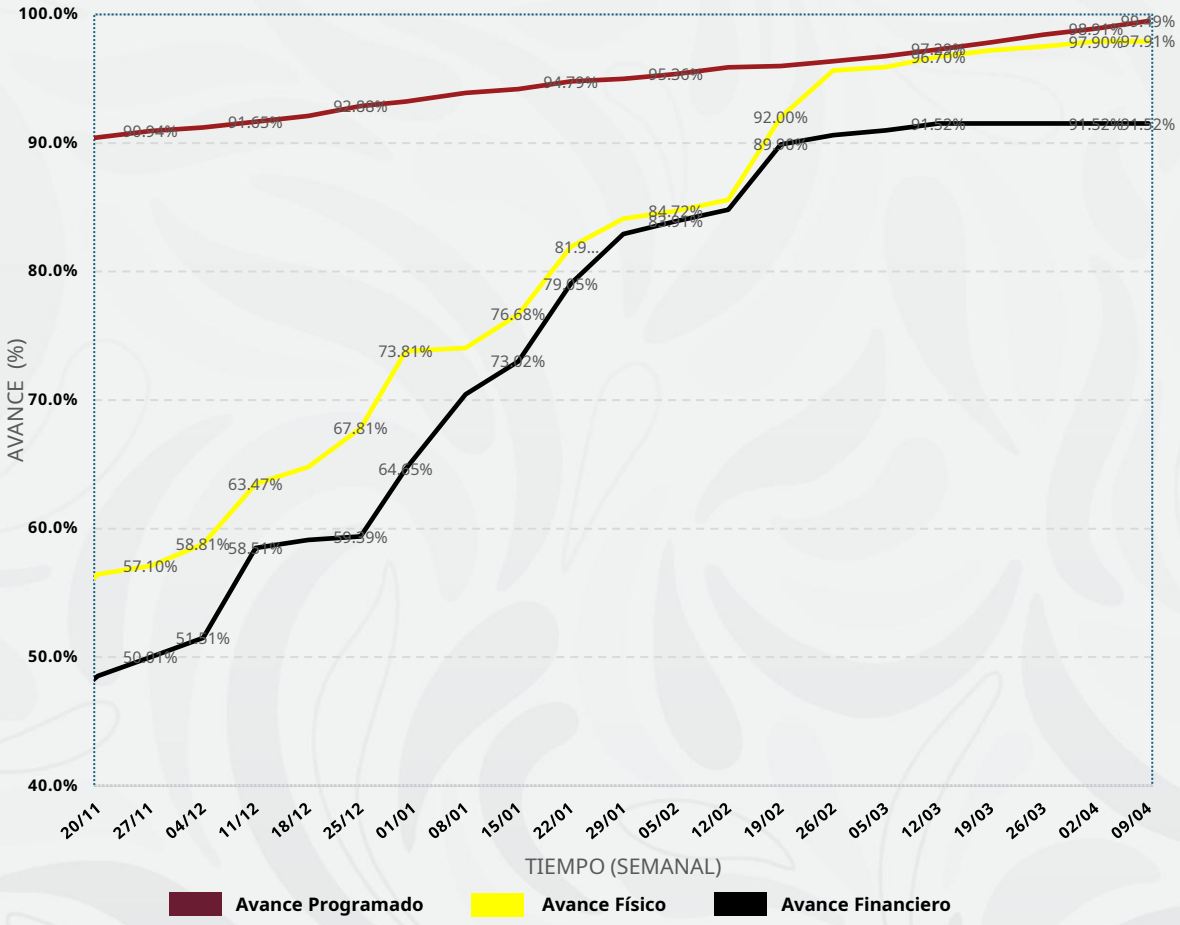


| | Del 27 de marzo al 02 de abril de 2026 | Del 03 al 09 de abril de 2026 |
|---|---|---|
| Fuerza de Trabajo (personas) | 283 | 68 |
| Maquinaria | 165 | 165 |
| Frentes de Trabajo | 10 | 3 |
