Tabasco-Campeche

Macuspana-Escárcega (Carretera Federal 186)
Tramo Tabasco

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance global
- Programado: 6.91%
- Real: 6.92%
- Semanal: 0.02%
- Financiero: 6.92%

Avance 2026
- Programado: 0.84%
- Real: 0.90% (1.0%)
- Semanal: 0.10%
- Financiero: 0.90%

Inversión total 2025-2028: 21,047 mdp
- **Tabasco:** 8,335 mdp
- **Campeche:** 11,483 mdp
- **Chiapas:** 1,229 mdp

Meta total 2025-2028: |249 km |
Ampliación a 22 m (A4)
Tabasco • 92 km | Chiapas • 14 km | Campeche • 143 km

Inversión 2025: 1,429 MDP
- **Tabasco:** 1,145 mdp
- **Campeche:** 284 mdp

Meta 2025:
- **Tabasco:** 12 km y 2 puentes
- **Campeche:** 4 km y 2 entronques

Inversión 2026: 3,749 MDP
- **Tabasco:** 3,109 mdp
- **Campeche:** 640 mdp

Meta 2026: Tabasco 32 km (1 puente) y Campeche 8 km
- **Tabasco:** 26 km. 1 PSV y 2 puentes
- **Campeche:** 6 km

Inicio: 16 de marzo de 2025
Término: Diciembre 2029
Término meta 2025: 28 de febrero de 2026

63,141 empleos generados

760 mil habitantes beneficiados

40 minutos de ahorro en tiempo

Beneficios Incrementaría la capacidad de la vía, mejora el nivel de servicio, reduce los costos de operación vehicular y los tiempos de recorrido de los usuarios, así como el riesgo de accidentes.

Tabasco-Campeche

Macuspana-Escárcega (Carretera Federal 186)
Tramo Tabasco

Elemento	Unidad	Intervención total	Ejecutado acumulado	Faltante	10/04/2026 al 16/04/2026	
					Programado	Ejecutado
Despalme	m^3	115,589.04	102,393.10	13,195.94	11,076.10	967.50
Escalones de Liga	m^3	20,122.39	15,490.76	4,631.63	2,137.10	134.95
Cortes	m^3	114,909.49	66,914.09	47,995.40	7,941.05	2,012.72
Pedraplén	m^3	151,364.26	108,842.75	42,521.51	13,128.09	4,032.10
Geotextil	m^2	159,125.66	75,472.46	83,653.20	10,279.43	1,671.07
Geomalla	m^2	173,510.17	88,431.55	85,078.62	7,404.66	1,949.75
Terraplén	m^3	320,776.23	123,943.26	196,832.97	6,251.87	11,069.57
Subyacente	m^3	132,720.47	45,203.26	87,517.21	638.73	4,517.94
Subrasante	m^3	67,539.93	6,143.90	61,396.03	0.00	1,023.99
Obras de drenaje	pza	95.00	21.00	74.00	17.00	4.00
Columnas de 1.20 m de diámetro	pza	66.00	22.00	44.00	3.80	6.00
Escamas de concreto en muros	m^2	6,948.35	90.00	6,858.35	0.00	90.00

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

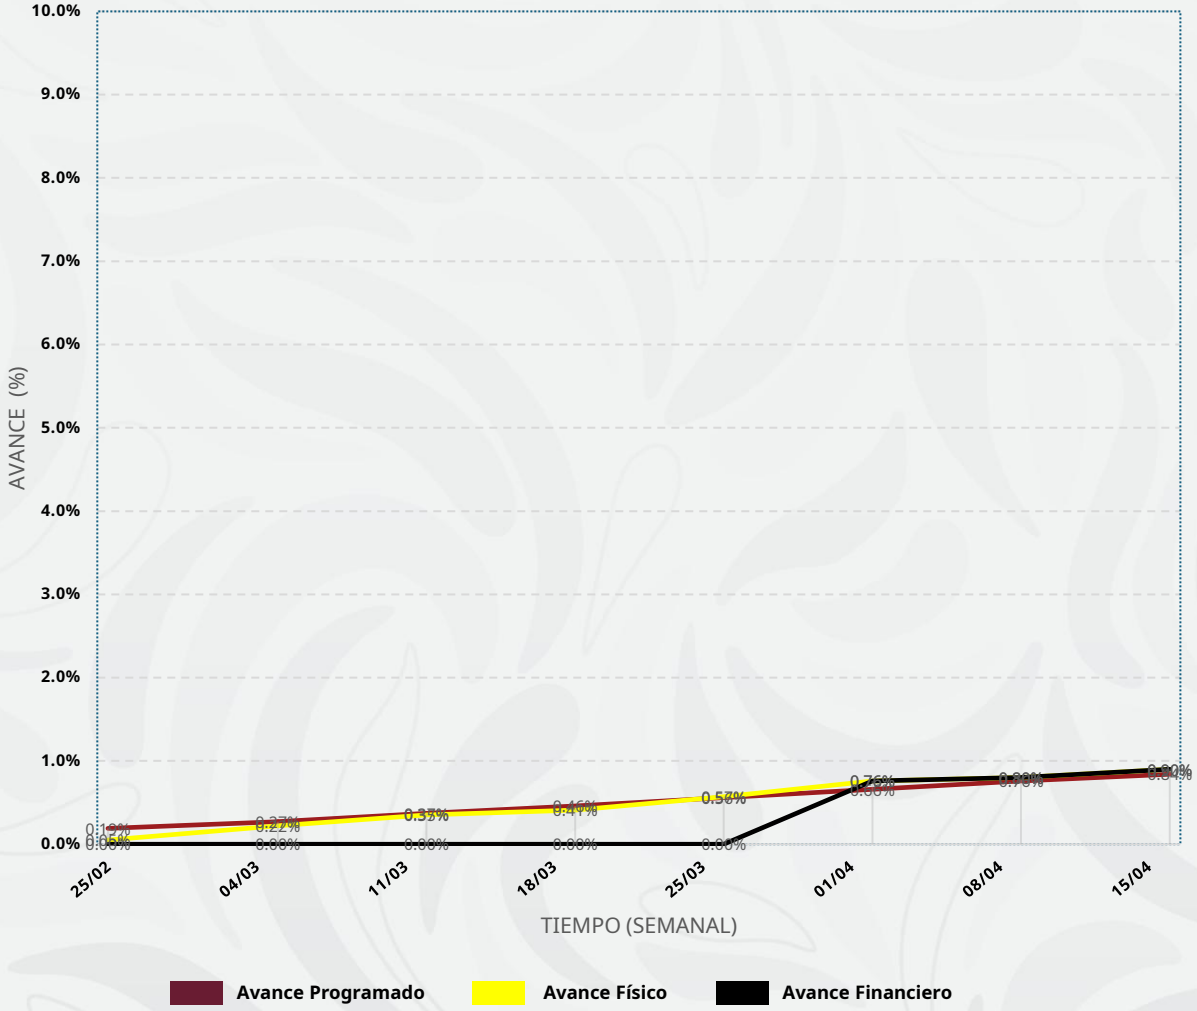

	03 de abril al 09 de abril	10 de abril al 16 de abril
Fuerza de Trabajo (personas)	435	460
Maquinaria	126	128
Frentes de trabajo	24	37
