Toluca- Zihuatanejo

Toluca- Zihuatanejo (Carretera Federal 134)

Tramo Estado de México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance global
- Programado: 3.82%
- Real: 3.74%
- Semanal: 0.00%
- Financiero: 3.74%

Avance 2025
- Programado: 100%
- Real: 97.92%
- Semanal: 0.01%
- Financiero: 97.63%

Avance 2026
- Programado: --
- Real: --
- Semanal: --
- Financiero: --

Inversión total: 26,969 mdp
- Edo. Méx.:7,220 mdp *
- Gro.: 19,750 mdp *

Meta total: 372 km
- Edo. Méx.: 87 km *
- Gro.: 286 km*

Inversión 2025: 945 mdp
- **Edo. Méx.:** 945 mdp

Meta 2025: 12 km, 1 paso a desnivel, 1 puente y 3 entronques (Edo. Méx.)

Inversión 2026: 2,668 mdp
- **Edo. Méx.:** 2,668 mdp

Meta 2026: 38 km (Edo.Méx.)

Nota: De la asignación 2026 se consideran 87.57 mdp para el pago del Séptimo y Octavo Convenio Modificatorio correspondientes del km 13 al km 25, con fecha de conclusión el 15/abr/26

Inicio: 09 de mayo de 2025
Término meta-2025: 15-abril-2026
Término meta-2026: Diciembre 2026
Término total: Diciembre 2029

*Redondeado

80,907 empleos generados

1 millón 480 mil habitantes beneficiados

2 horas 35 minutos de ahorro en tiempo

Beneficios Mejorar las condiciones de tránsito, reduciendo el riesgo de accidentes, así mismo se reducen los tiempos traslados, garantizando una mejor conectividad que contribuye al desarrollo económico y turístico del Centro – Poniente del país.

Toluca- Cd. Altamirano

Toluca- Zihuatanejo (Carretera Federal 134)

Km 13+000 – km 25+000

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Intervención	Unidad	Ejecutado acumulado	Faltante	10/abr/26 al 16/abr/26	
					Programado	Ejecutado
Despalme y cortes	352,510.36	m³	352,510.36	0	-	0
Alcantarillas tubulares	787.28	m	787.28	0	-	0
Cpo. Terraplén, Subyacente y Subrasante	278,677.81	m³	278,677.81	0	-	0
Base hidráulica	47,257.62	m³	47,257.62	0	-	0
Base asfáltica	27,971.34	m³	27,971.34	0	-	0
Carpeta asfáltica	17,063.24	m³	15,453.81	1,609.43	-	901.27
Señalamiento Horizontal	52.75	Km	23.29	29.46	-	7.46
Señalamiento Vertical	699	Pzs	219	480	-	29
Excavación para zapatas y muros	9,738	m³	9,738	0	-	0
Acero de refuerzo en zapatas y muros	184,094.8	Kg	184,094.8	0	-	0
Concreto f'c=250 km/cm² en zapatas y muros	2,186	m³	2,186	0	-	0
Relleno para zapatas y muros	5,566.9	m³	5,566.9	0	-	0
Pilotes ⌀=1.2 m, f'c=250 kg/cm²	530	Pzs	530	0	-	0
Columnas ⌀=1.2 m, f'c=250 kg/cm²	530	Pzs	530	0	-	0
Cabezales f'c=250 kg/cm²	11	Pzs	11	0	-	0
Fabricación AASHTO tipo "V", f'c=400 kg/cm²	88	Pzs	88	0	-	0
Transporte y montaje de Trabes AASHTO "V"	88	Pzs	88	0		0
Fabricación de trabes tipo Tabletas, f'c=350 kg/cm²	51	Pzs	51	0	-	0
Transporte y montaje de trabes tipo Tabletas	51	Pzs	51	0	-	0
Losas f'c=250 kg/cm²	9	Pzs	9	0	-	0
Guarnición f'c=250 kg/cm²	1,886.61	m	1,886.61	0	-	0
Parapeto metálico	2,570.02	m	2,570.02	0	-	0
Carpeta asfáltica	225.8	m³	225.8	0	-	0
Junta de dilatación	270.9	m	270.9	0	-	0
Muro Mecánicamente Estabilizado	4,316.5	m²	4,316.5	0	-	0
Relleno para MME	39,148.8	m³	39,148.8	0	-	0
Losas de acceso	2	Pzs	2	0	-	0

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

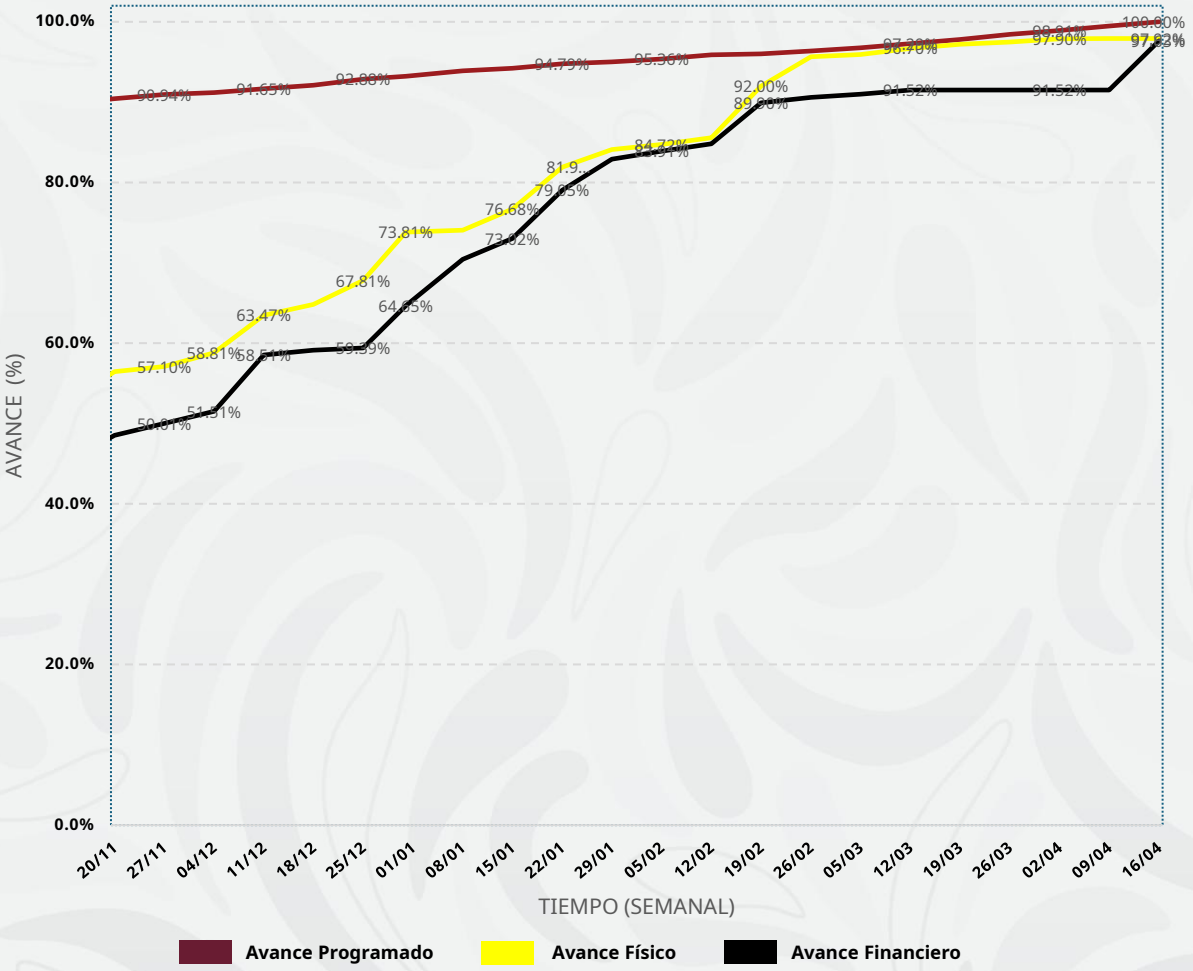

	Del 03 al 09 de abril de 2026	Del 10 al 16 de abril de 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	68	114
Maquinaria	165	170
Frentes de Trabajo	3	10
